


野洲栗東バイパス事業 工事進捗レポート

令和5年12月

TOPICS 野洲栗東バイパス七間場高架橋P32橋脚他工事
アスベストの撤去状況 R5.12月撮影

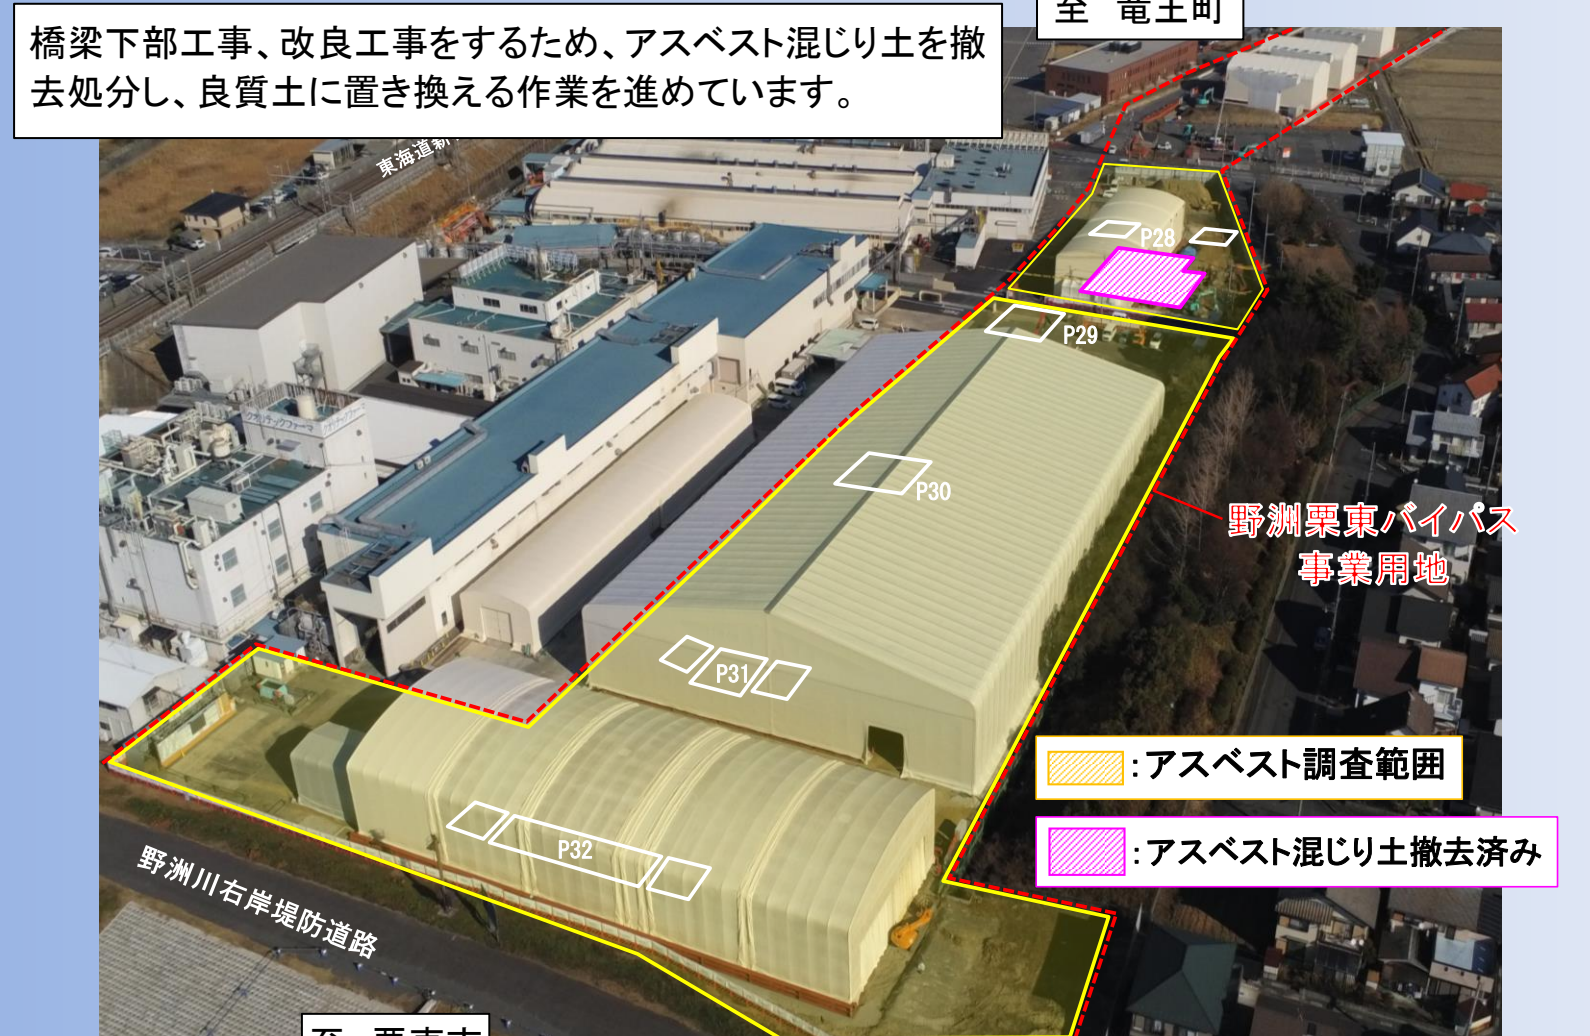



TOPICS 1 野洲栗東バイパス出度地区横断函渠他設置工事、野洲栗東バイパス出度西地区函渠他設置工事、野洲栗東バイパス出度東地区函渠他設置工事、野洲栗東バイパス出度東地区函渠他設置工事 R5.12月撮影



TOPICS 2 野洲栗東バイパス出度3号高架橋鋼工上部工事
野洲栗東バイパス中ノ井川橋上部工事 R5.12月撮影




TOPICS 3 野洲栗東バイパス手原高架橋下部他工事、野洲栗東バイパス手原地区道路改良他工事、野洲栗東バイパス手原地区排水構造物他工事 R5.12月撮影

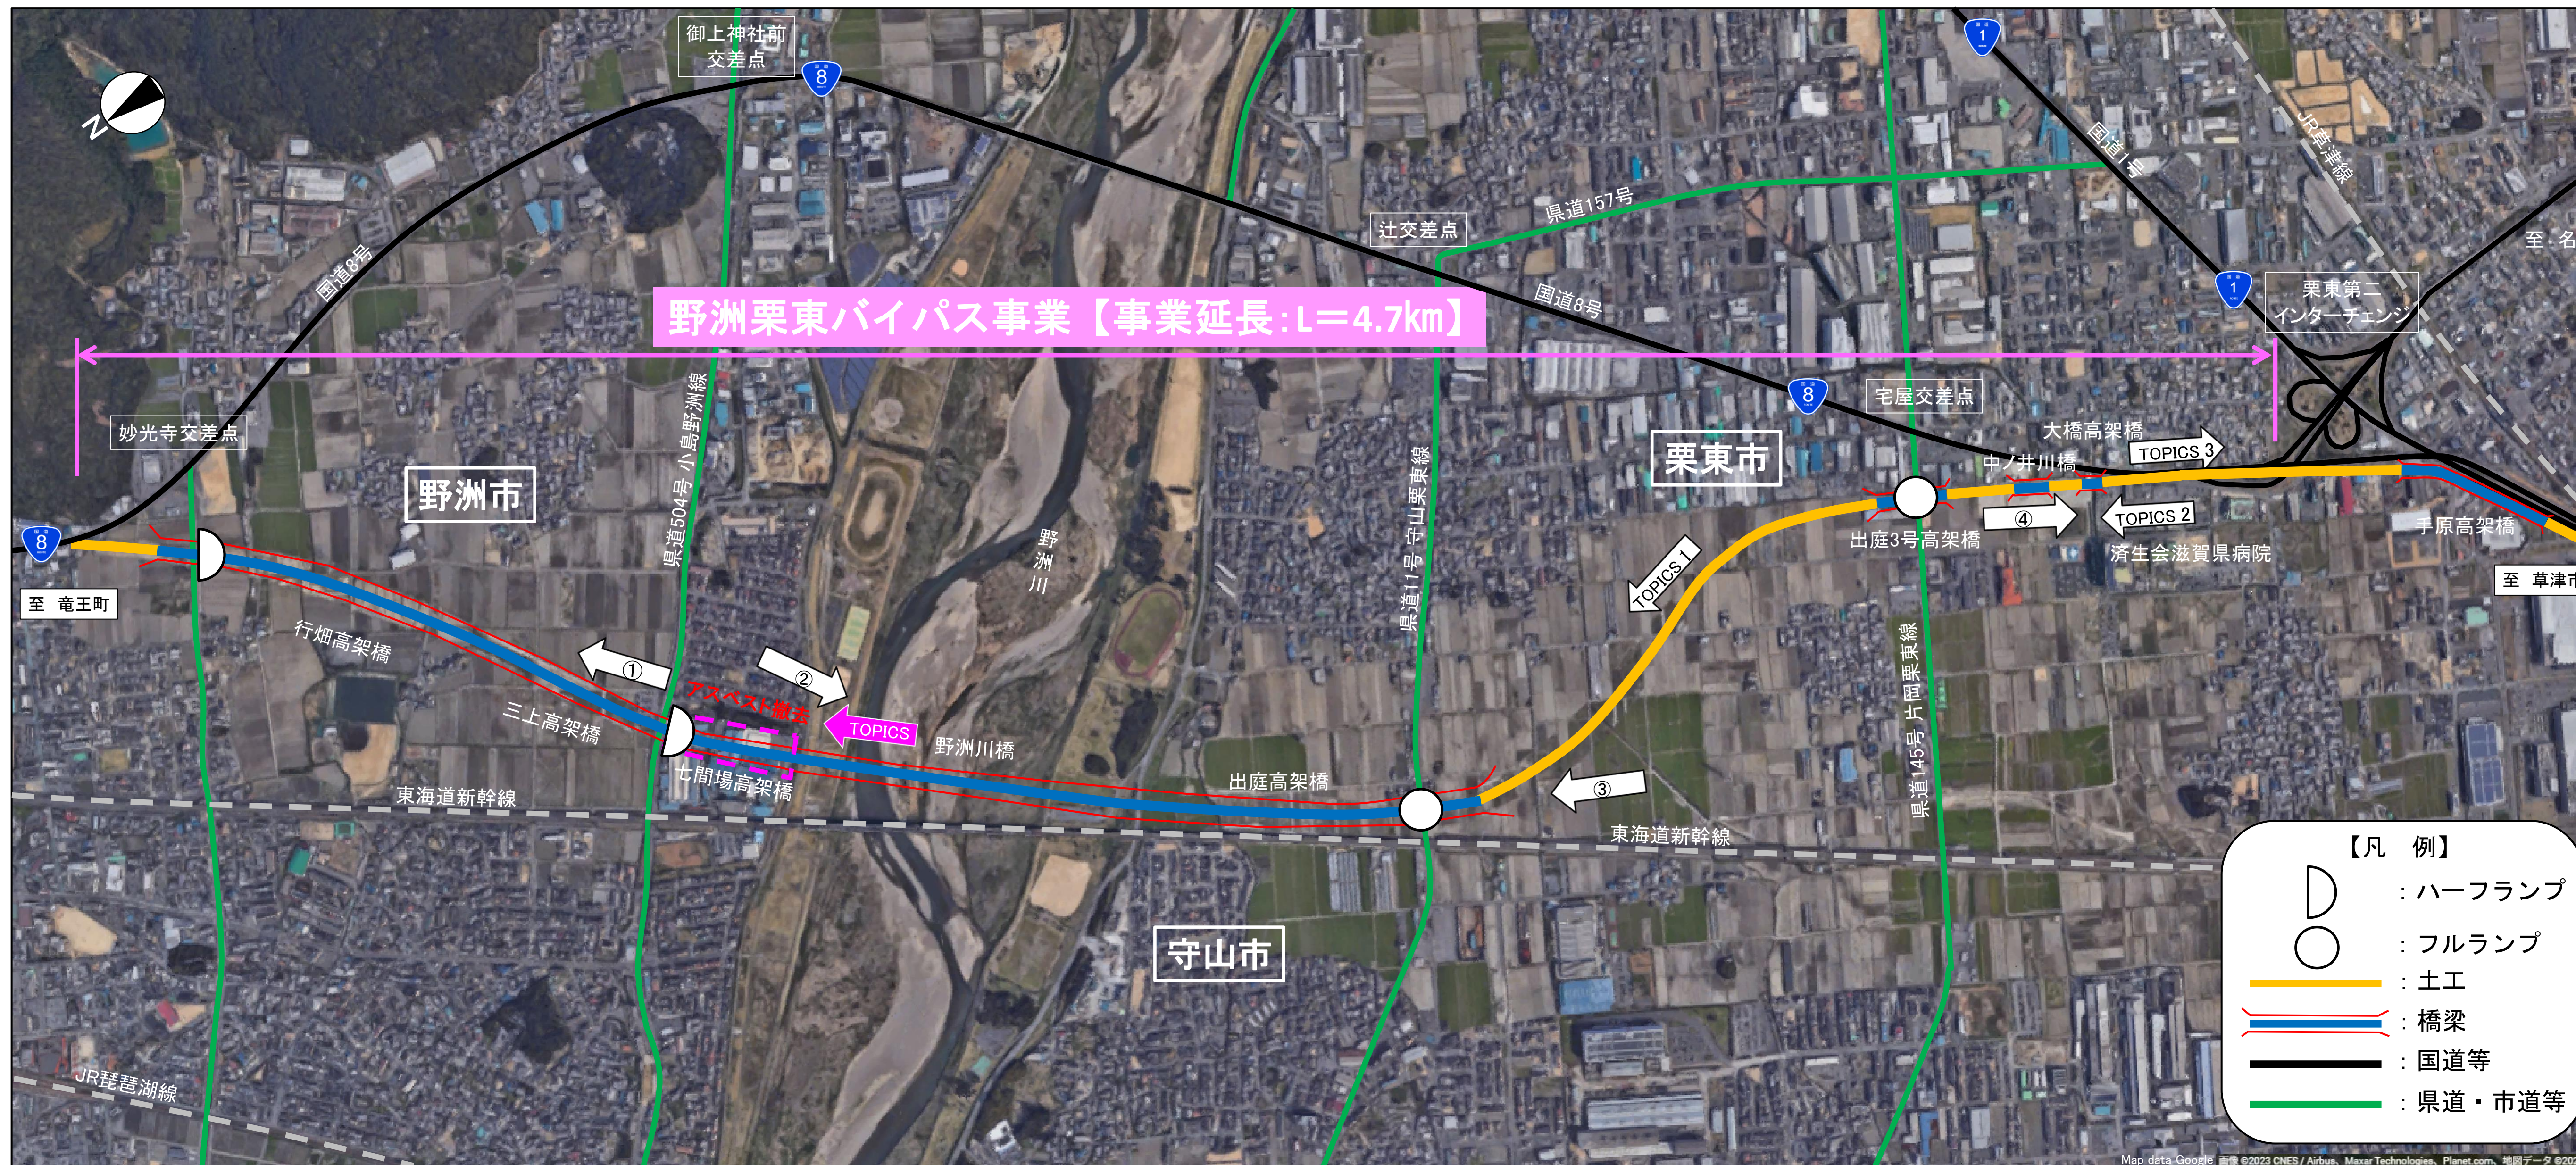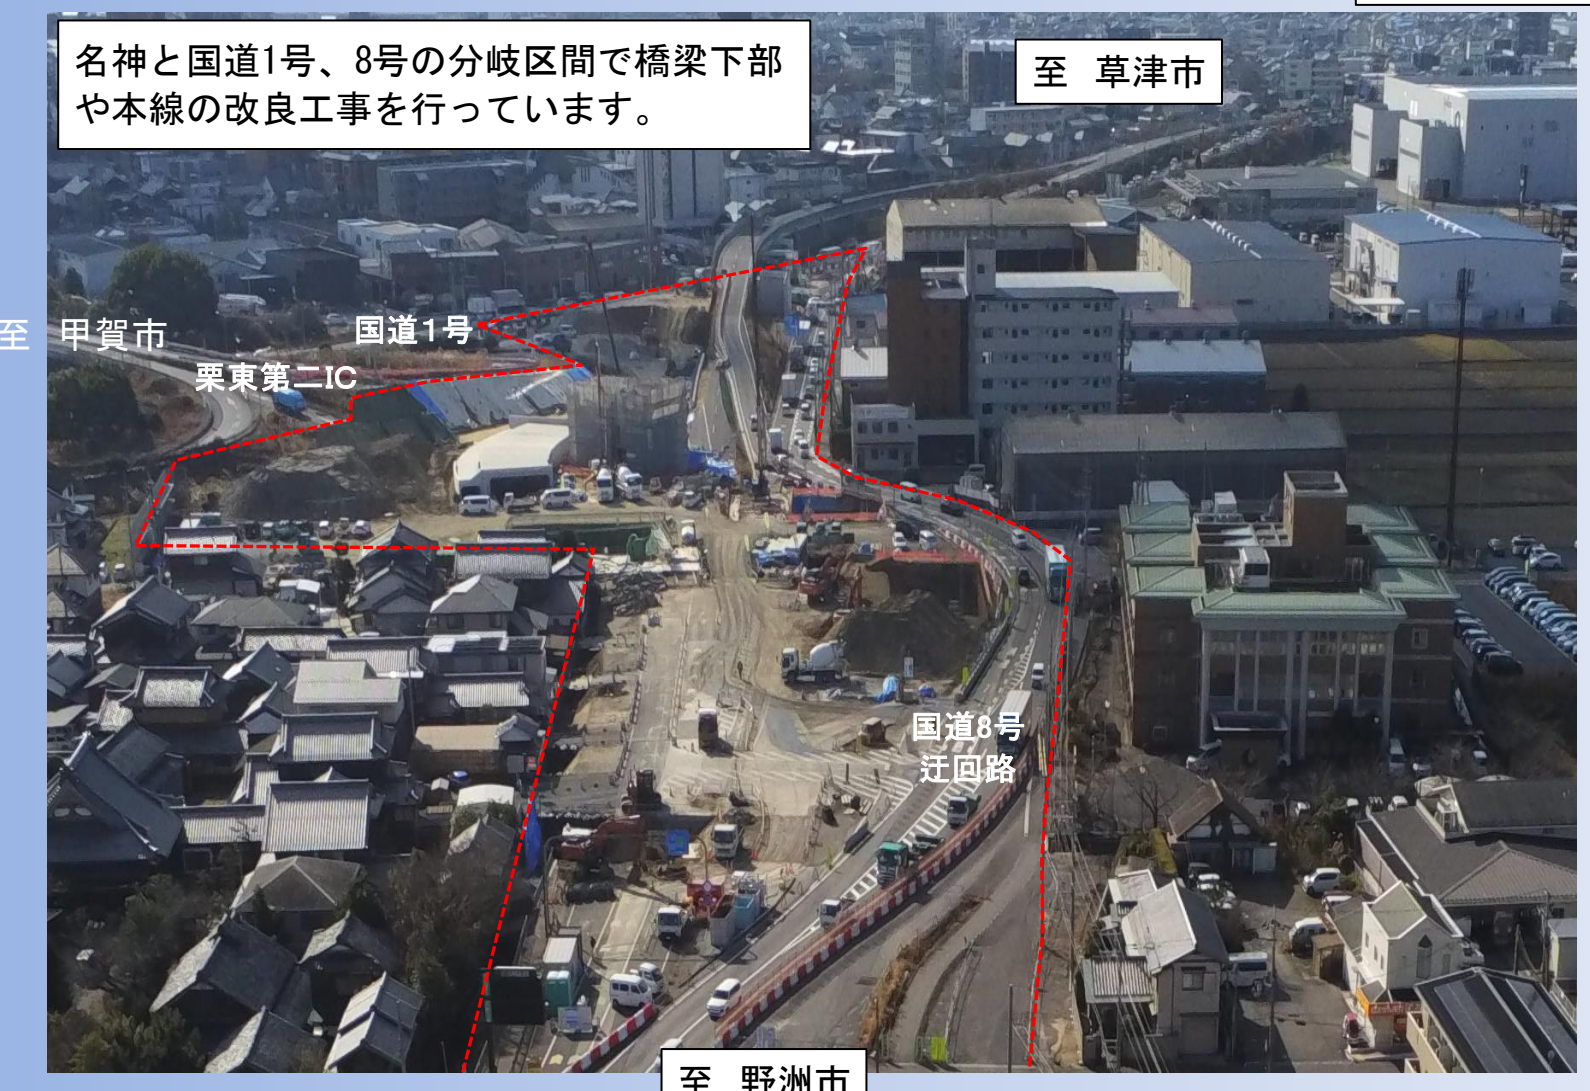

地区名	野洲市										守山市	栗東市																																												
	小瀬原地区	妙光寺地区	行畑地区	三上地区				野洲川橋		立入地区	出度地区				中地区		宅屋地区		大橋地区	手原地区																																				
延長				1.90 km				0.60 km			2.20 km				0.36km		0.20km		0.12km																																					
道路構造	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	鋼橋	鋼橋	鋼橋	土工	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	PC橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工	鋼橋	土工																																
至:竜王町	行畑高架橋										三上高架橋		七間場高架橋		野洲川橋		出度高架橋				中ノ井川橋		大橋高架橋		手原高架橋		至:草津市																													
	A1	P2	P7	P12	P17	P22	P23	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P1	P2	P3	P4	P7	P8	P9	P10	A2	A1	P1	P2-P3	P4	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	A2	4号	5号	6号	8号	9号	1号	2号	3号	4号	5号	(県)片岡	中ノ井川	(市)大橋	U型擁壁	(市)出度線	済生会 滋賀県病院	A1	P1	P2	P3	A2
	アスベスト撤去																																																							

凡例 〇 : 未着手 〇 : 発注手続中 〇 : 施工中 〇 : 完成

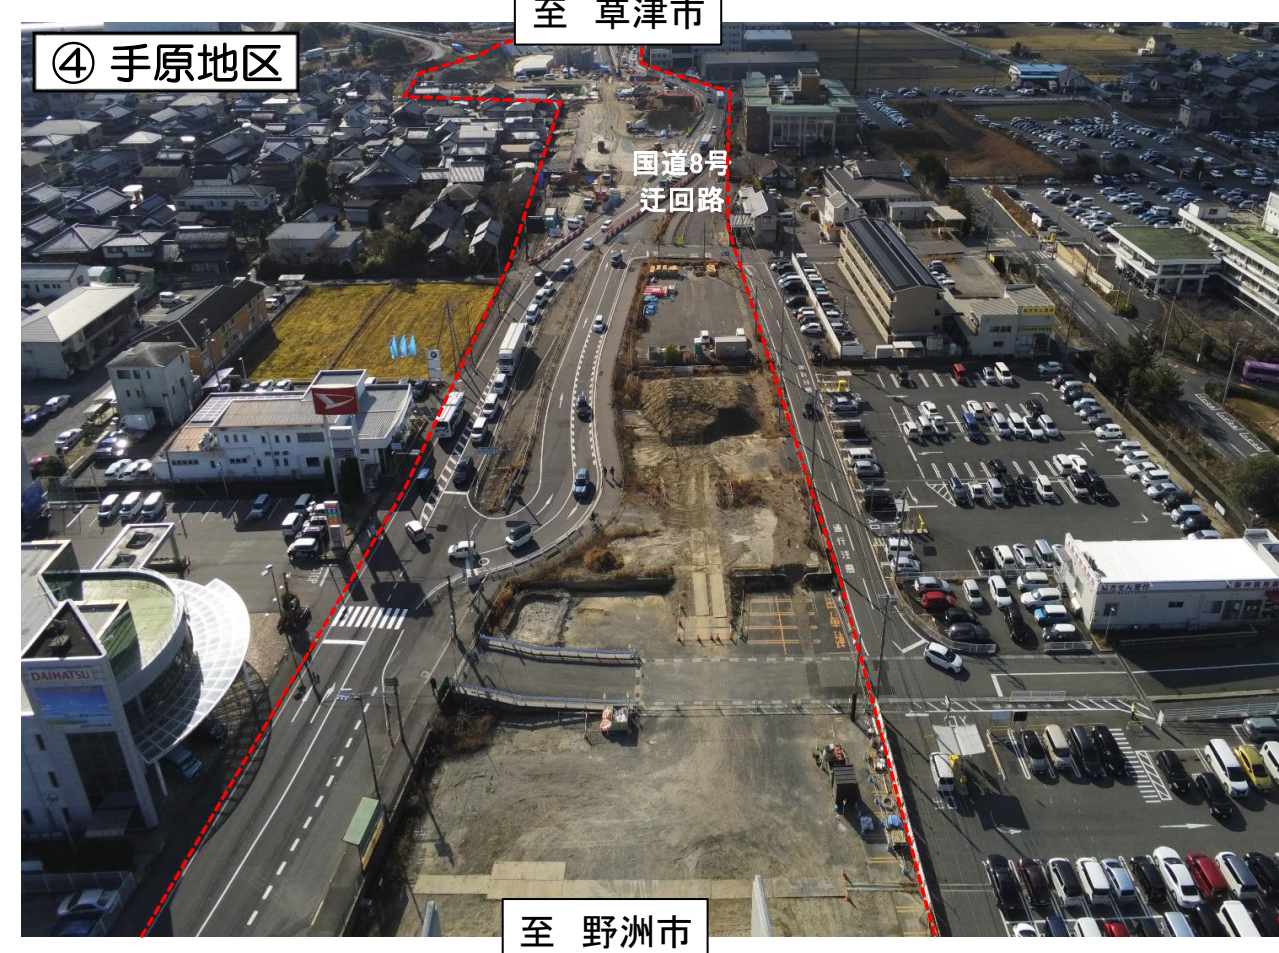

※アスベスト処分量の増加により、令和7年秋全線開通は遅延するものの、工事工程を精査し、できる限り早期に開通できるよう検討してまいります。
