




パツパツは
QRコードを讀込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事
 工期：令和元年9月19日～令和2年11月30日
 【付替県道 新2号橋の橋台を1基と、補強土壁を施工します。】

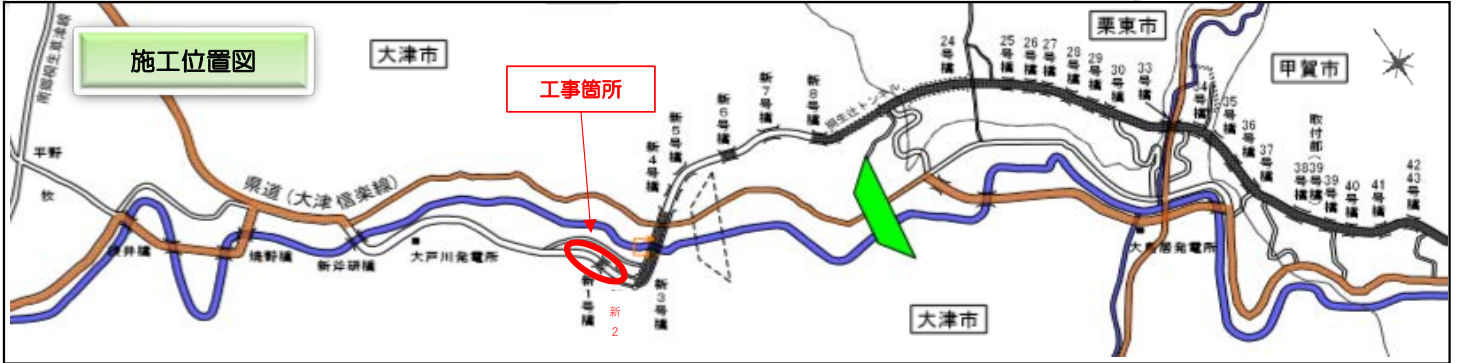

補強土壁とは？

盛土内に帯状の鋼製補強材を層状に敷設し土と補強材の摩擦効果によって強固な補強土壁を構築する擁壁です。

工事進捗

新2号橋 A1橋台

新2号橋のA1橋台が完成しました。

今後の予定

完成した橋台～1号補強土壁間の補強土壁・坑口壁工（3号～6号）・盛土工の施工を行います。今後は県道16号を土砂運搬車両が多く通行しますが、安全第一で工事を進めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

安全第一
交通事故に注意してお！

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年10月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事
当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日
(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

10月

工事箇所位置図



擁壁掘削状況



擁壁掘削完了




コンクリート打設状況



夏から一転急に秋めいてきました。変わりやすい天候にも負けず作業しています。
着々と完成に向けて工事を進めてまいりたいと思います。


重力式基礎コンクリート打設完了

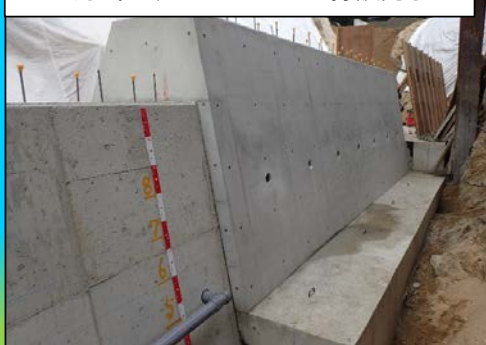

現場代理人コメント

真夏日から朝晩肌寒くなってきましたが、体調管理に注意しながら、引き続き安全作業で頑張ります。

現場代理人
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地先

【電話】 077-549-0075

【FAX】 077-549-0075

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年10月15日




バックパ-はQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事
工期：令和2年2月18日～令和3年3月10日
【付替県道 新4号橋の橋梁上部工本体を施工します。】

10月

工事箇所位置図

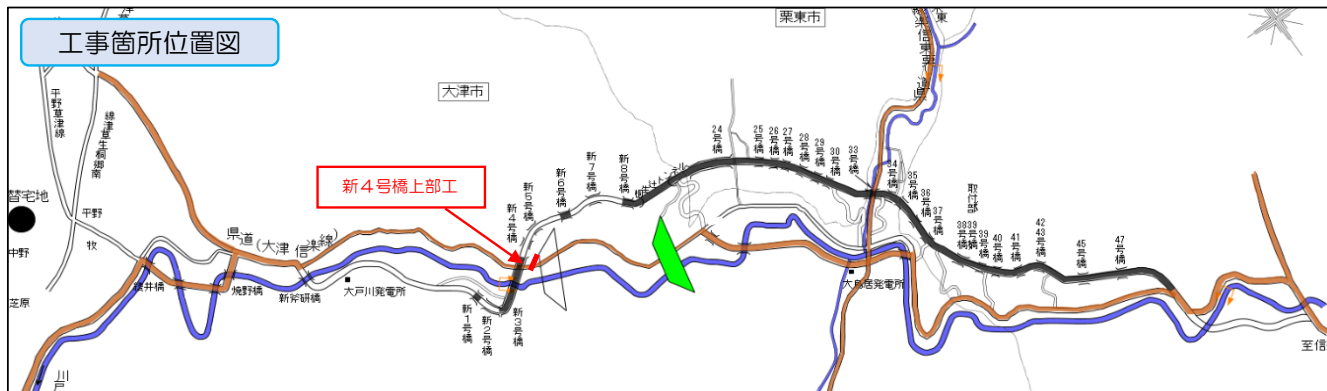

現場位置図



現場の進捗状況

支保工を支える支保工基礎杭の施工が終わり、これから支保工の組立が始まります。段々と高所での作業が増えるので、墜落事故を起こさないように、十分安全に気を付けて施工を行います。



現場代理人のコメント

厳しい暑さも終わり、過ごし易い季節となりました。現場では、支保工の基礎杭工事が終わり支保工の組み立て作業へ移ります。大型トラックやトレーラーでの材料搬入が多くなります。一般車両最優先で運行管理を行ってまいります。安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。



請負者：昭和コンクリート工業(株)
現場代理人：渡邊泰全
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-2370

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年10月15日





パツパツは
QRコードを読み
込み大戸川の工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事

工期：令和元年11月26日～令和2年12月31日

10月

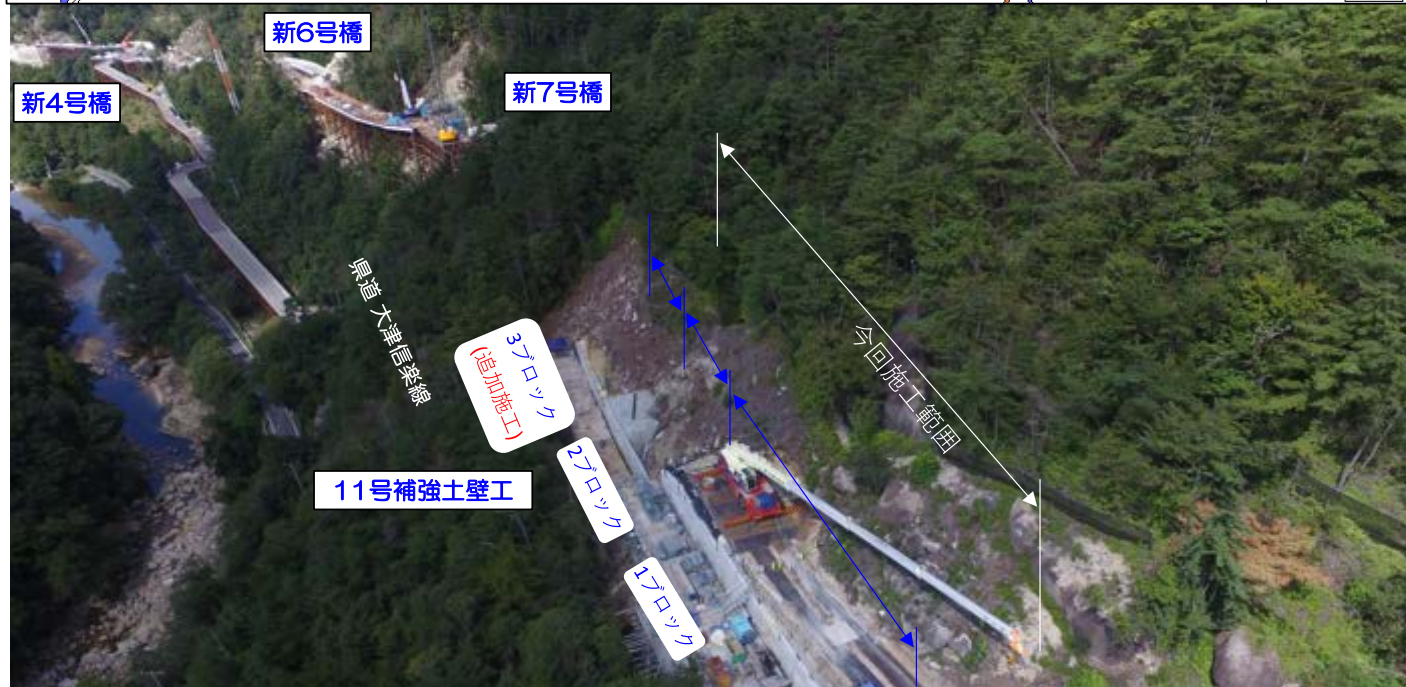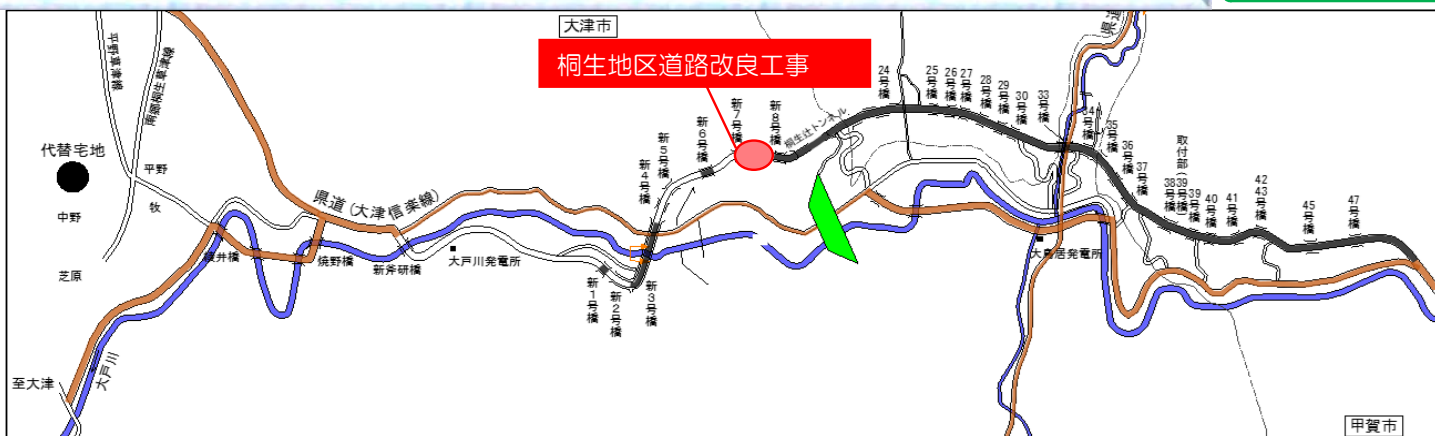

現在の状況

全体施工状況



現在の作業：8月よりパネル設置及び削孔作業を順次施工中です。
今後の予定：11号補強土壁工の2ブロックのパネルの施工を順次行って参ります。

パネル設置状況



現場代理人コメント

現在、11号補強土壁工を順次施工しております。

パネルの施工になりますので、搬入材料の車両の出入りが多くなります。工期末まであと3か月ですが事故の無いよう十分に安全に注意し施工しますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

現場代理人
伊藤 雅記



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-3200
077-549-3206

大津信楽線付替工事ニュース



令和2年10月15日



パツパツは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事
工期：令和2年1月16日～令和3年2月28日

10月

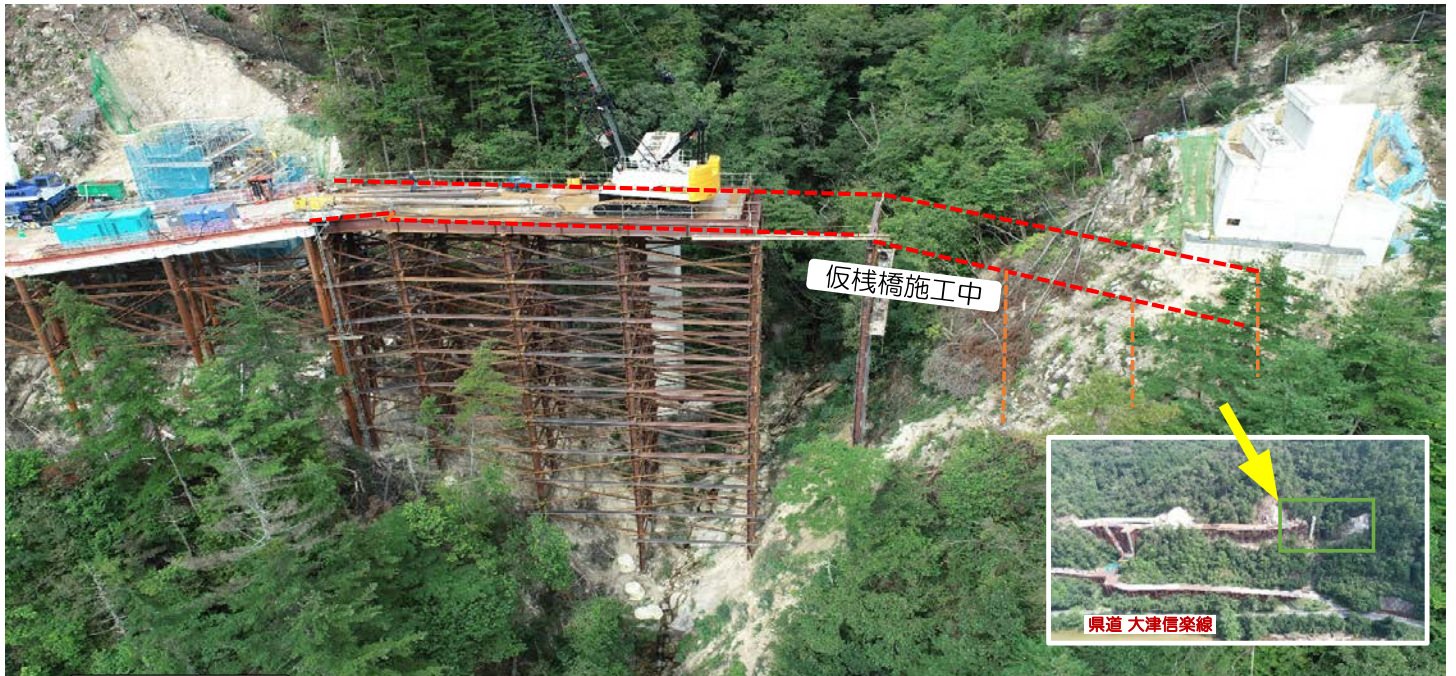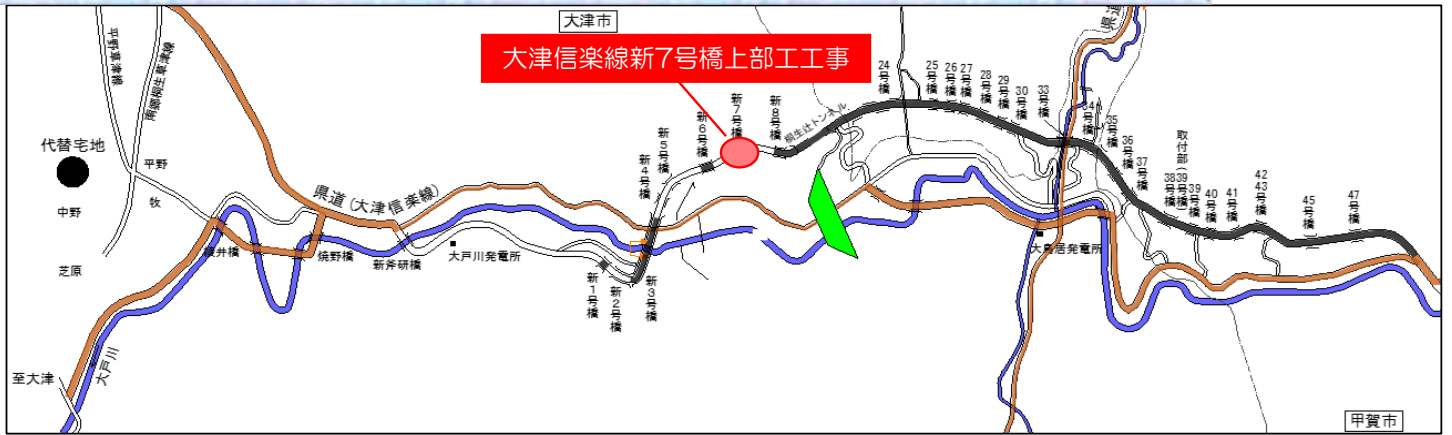

現在の状況

現場代理人コメント



工場では橋げたの製作が完了し、仮組立後、11月の出荷に向け塗装作業を行います。

現場では仮橋の施工が続いています。10月に入り朝夕と寒暖の差が大きくなってきましたが、コロナ対策と健康管理に留意し安全第一に進めています。

現場代理人 鶴田 政宏

現在の作業：橋げたの製作および仮橋の施工を進めています。
今後の予定：工場は仮組立した部材を解体し、塗装作業となります。
現地では引き続き仮橋の工事を進めます。

工場での仮組立状況



KH 株式会社 駒井ハルテック
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-2546
077-549-2547

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年10月15日



バックバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流道路改良工事
工期：令和2年7月7日～令和3年2月26日

10月

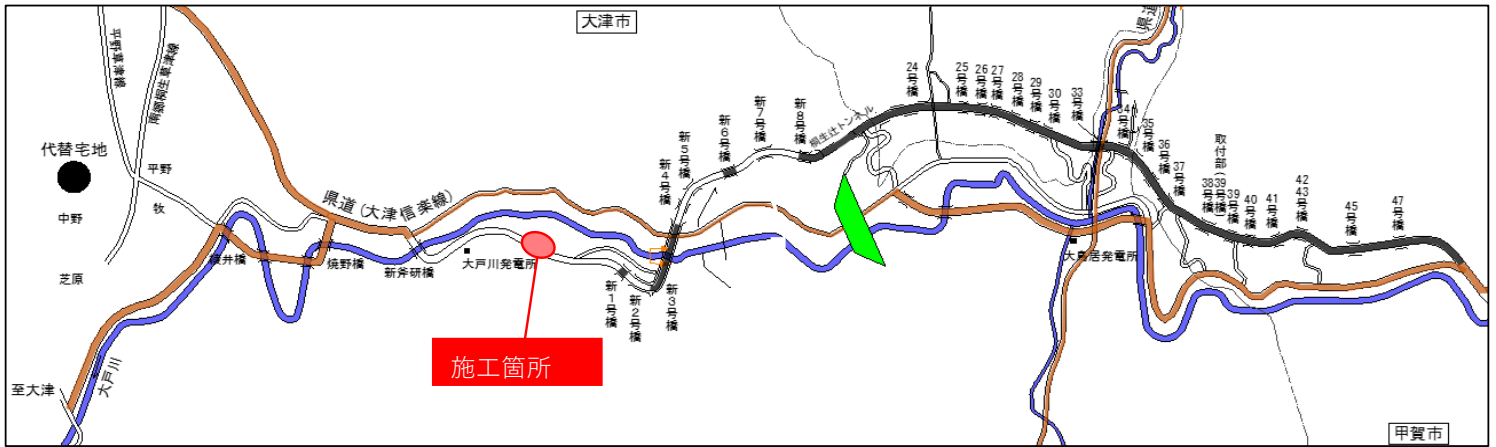

1号補強土壁の掘削と3号ブロック積工の準備をしています。



1号補強土壁掘削、岩盤破碎状況



3号ブロック積施工のための丁張状況

現場代理人のコメント

1号補強土壁の掘削箇所では硬岩が出現し掘削に時間を要していますが、安全作業を心掛け施工を行っています。

10月に入り、朝と日中の温度差が激しくなってきました。インフルエンザが流行る時期なので、これからも体調管理に注意し、安全作業で現場を進めてまいります。

現場代理人



OhyAMA

株式会社 大山建設

【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上田上牧町1131
077-549-0583
077-549-0583


大津信楽線付替工事ニュース

令和2年10月15日



バックパ-は
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

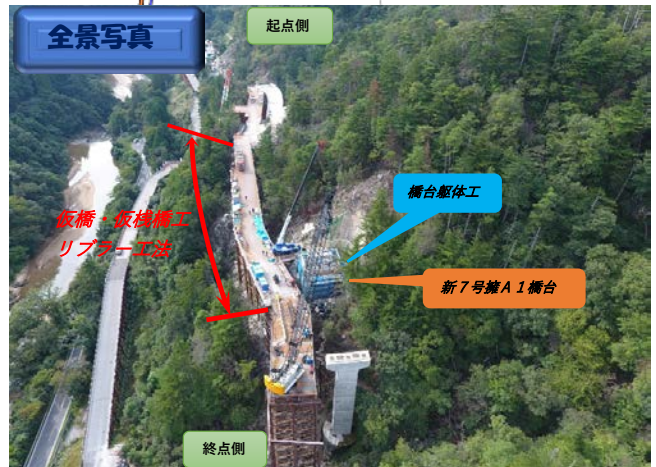

起点側からと終点側からの現場状況をドローンで撮影しました。9号補強土壁、新7号橋A1橋台施工中です。

工事写真

新7号橋A1橋台は胸壁・翼壁施工中、9号補強土壁工はEPルートパイル～キャッピングビーム施工中。



ローリーバー・カッショントリルでの削孔。



スライムで地層の確認。



EPルートパイル芯棒挿入。



EPルートパイルの性能を確認。



フーチングコンクリートの打設。



レイタンスを洗い出し。




胸壁・翼壁施工中。

9月初めに最強の台風10号が通過して猛暑が続きましたが、9月下旬からは急に涼しくなり過ぎやすくなりました。まだ、台風シーズンは続きますが一丸で頑張っています。

監理技術者
より一言



松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-1070
【FAX】 077-549-1075
監理技術者 秋村 智詩
