

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年7月15日




バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事

工期：令和元年9月19日～令和2年11月30日

【付替県道 新2号橋の橋台を1基と、補強土壁を施工します。】

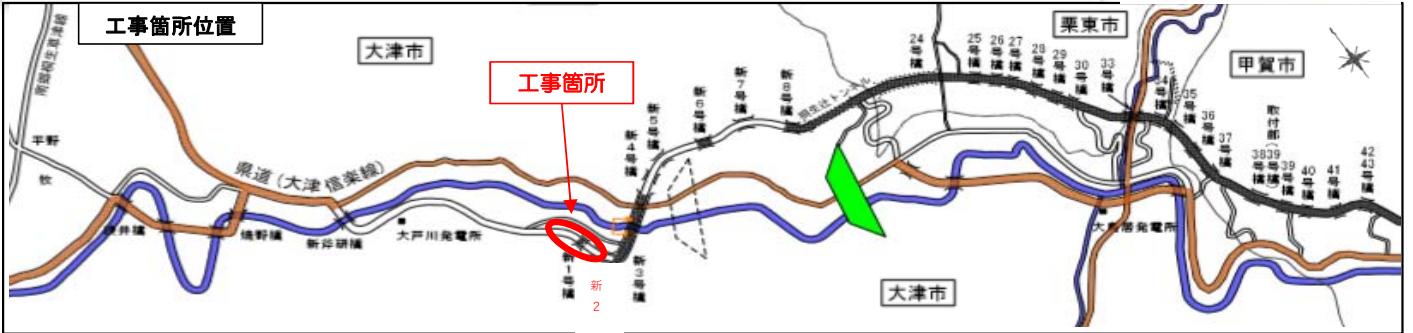


補強土壁とは？
盛土内に帯状の鋼製補強材を層状に敷設し土と補強材の摩擦効果によって強固な補強土壁を構築する擁壁です。

工事進捗

深礎杭工

下段杭の施工中です
現在は順調に掘れて
いますが、転石の出現
は予想不可能です。
下段2本=7月中旬
完成予定です。

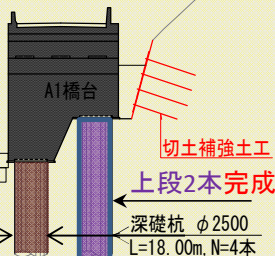

補強土壁工施工中(写真A)



施工状況



来月は補強土壁について
施工写真で紹介します。

今後の予定

深礎杭を7月中旬の完成を目指しています。

引き続き橋台の工事で生コン車等の資材運搬で工事関係車両が増加します。**熱中症に注意してお！**
安全第一を心掛け進めてまいりますので皆様のご理解ご協力をお願い致します。

安全第一



株式会社 内田組

【現場事務所】 大津市上田上桐生町地先

【電話】 077-549-3356

【FAX】 077-549-3356

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年7月15日




バックナンバーはQRコードを眺込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

当初工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日（変更：令和2年8月31日）

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁、補強土壁（追加工事）を施工しま

7月

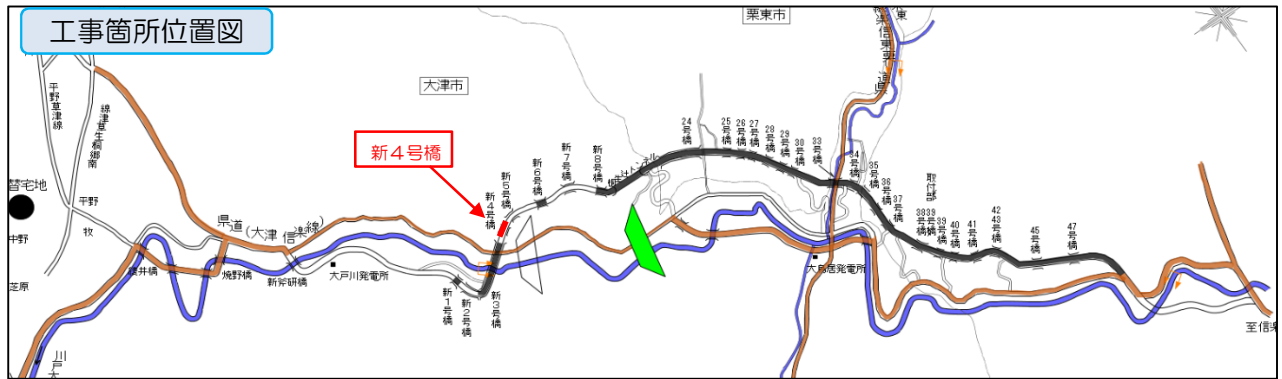

【工事の進捗】 補強土壁（追加工事）の施工を開始しています。

6号補強土壁（CAB-WALL工法）進捗状況

6号補強土壁工は地山補強土壁（CAB-C）と盛土補強土壁（CAB-B）の切土・盛土複合補強土壁です。

6号補強土壁工 展開図

CAB-B (盛土部) CAB-C (切土部) 施工完了箇所

CAB-B施工状況

パネル据付 バックフィル 排水ブランケット敷設 補強材設置

CAB-C施工状況

パネル据付(順巻) バックフィル(逆巻) 背面コンクリート打設 補強材削孔 補強材挿入

現場代理人のコメント

世間では新型コロナウイルス感染第二波や、熱中症、梅雨時期の降雨が問題となってきましたが、現場においても気を抜かず感染、熱中症、降雨対策を講じて、施工や第三者への影響が無いよう進めてまいります。引き続き、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。



請負者：西村建設(株)
現場代理人：森本 順
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0100

西村建設株式会社
NISHIMURA CONSTRUCTION CO., LTD.

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年7月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

7月

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事
当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日
(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

工事箇所位置図



掘削状況



梅雨のぐずついた天候にも負けず、作業しています。
相変わらず転石がたくさんできてますが頑張って工事を進めたいと思います。

均しコンクリート打設



現場代理人コメン

熱中症対策及びコロナウイルス対策をしながらの施工となり、苦勞しているところもありますが、暑さとコロナに負けないよう頑張って工事を進めてまいります。

現場代理人
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

【FAX】 077-549-0075

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年7月15日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事
工期：令和元年11月26日～令和2年10月31日

7月

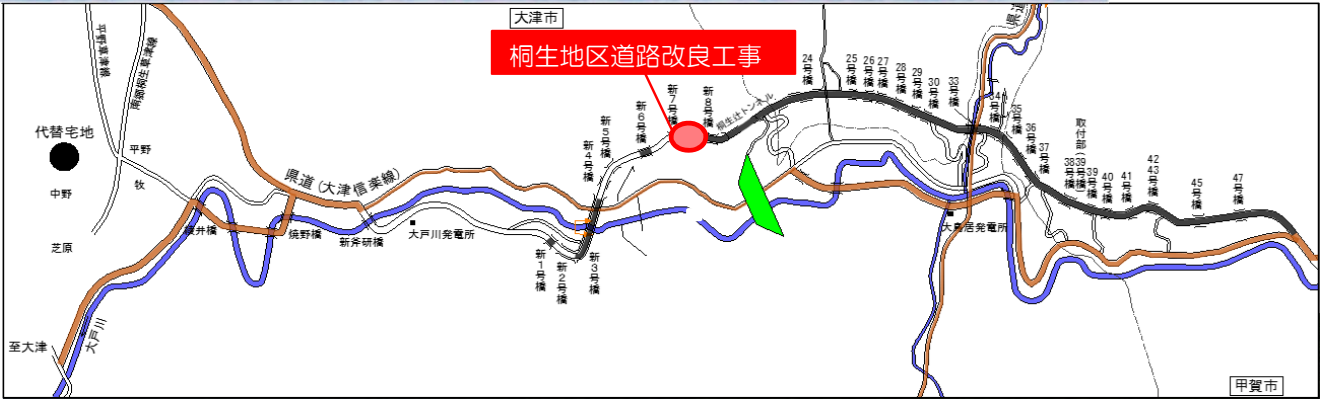

現在の状況

伐木集積状況



床掘状況




現在の作業：6月中旬より伐採木搬出、7月より床掘作業中です。
今後の予定：床掘作業を7月中旬まで行います。その後、事前引抜試験を行い、7月末頃から11号補強土壁工の2ブロックの施工へ移ります。

現場代理人コメント

現在、床掘作業を順次行っております。熱中症の危険が高まっている為、水分補給を十分に行い作業致します。また、パネル施工に向けて、材料の搬入車両が多くなります。一般車両優先を徹底致します

現場代理人

伊藤 雅記



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-3200
077-549-3206


大津信楽線付替工事ニュース 令和2年7月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

7月

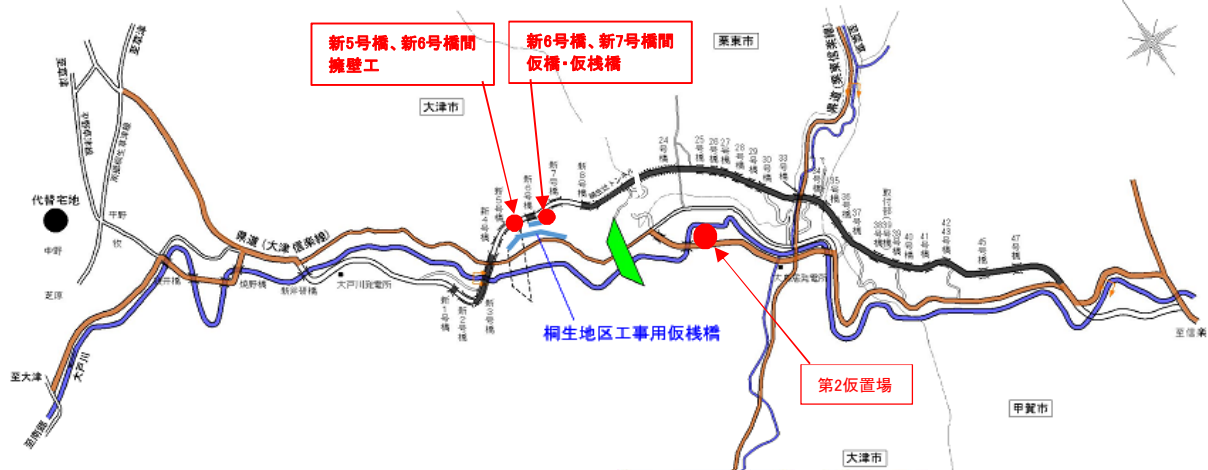

起点側からと終点側からの現場状況をドローンで撮影しました。新7号橋下部工の掘削完了しました。

工事写真

新7号橋下部工掘削は狭い場所での作業。岩を下に落とさないよう慎重な作業で完了。



地山が岩で0.2BHのブレイカーで破碎。



場所が狭いので0.2BHで集積



0.8BHで4tキャリアダンプに積込



掘削完了で0.8BHを降しました。




火災防止のため4tユニックに載せられる消火設備(防火水槽、エンジンポンプ、消防ホース)を整え、消火訓練をしました。

監理技術者より



地元九州は豪雨災害で大変なことになっています。昨年自分も河川の氾濫で現場事務所が水没大変でした。コロナに豪雨に熱中症対策と気が休まりませんが現場一丸となって頑

松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-1070
【FAX】 077-549-1075
監理技術者 秋村 智詩

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年7月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事
工期：令和2年1月16日～令和3年2月28日

7月

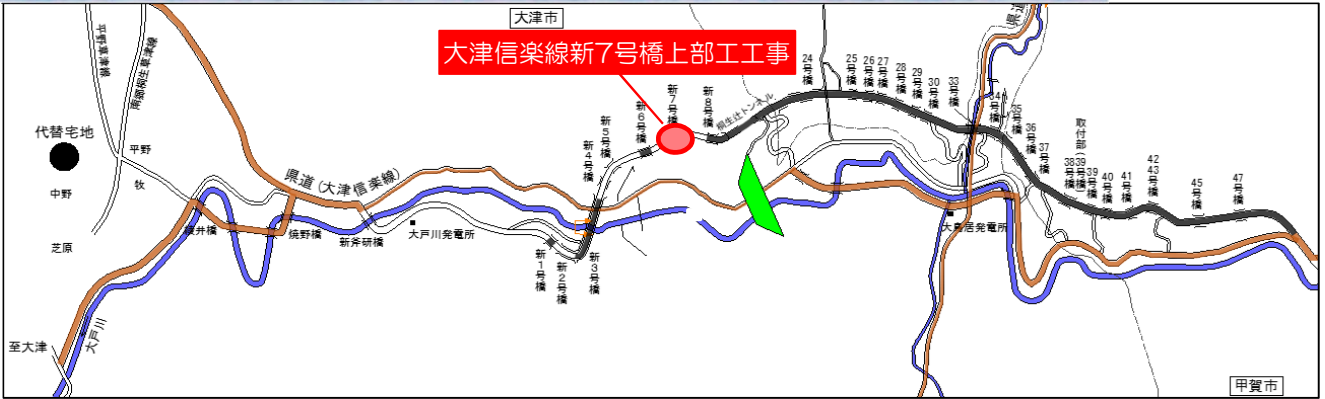

仮栈橋の施工は
非常に高い場所での
作業が多いため
安全対策には特に
気を遣っています。

下から見た
仮栈橋

工場での製作状況

現場代理人コメント



工場では部材の完成が近づ
いており、予めすべての部材
を工場で組立てる「仮組立」が
始まります。

現場では仮栈橋の施工が続
いています。今年は梅雨らし
い天気で、現場作業も慎重に

現場代理人 鶴田 政宏



全長数kmの溶接を
人間が行います

数値を入力することで
機械が自動で孔をあけます



現在の作業：橋けたを製作および仮栈橋の施工を進めています。
今後の予定：工場は8月に仮組立完了し、その後塗装作業となります。
現地では引き続き仮栈橋の工事を進めます。

KH 株式会社 駒井ハルテック
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-2546
077-549-2547
