

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和2年9月15日



バックナンバーはQRコードを眺込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事  
工期：令和2年2月18日～令和3年3月10日  
【付替県道 新4号橋の橋梁上部工本体を施工します。】

9月

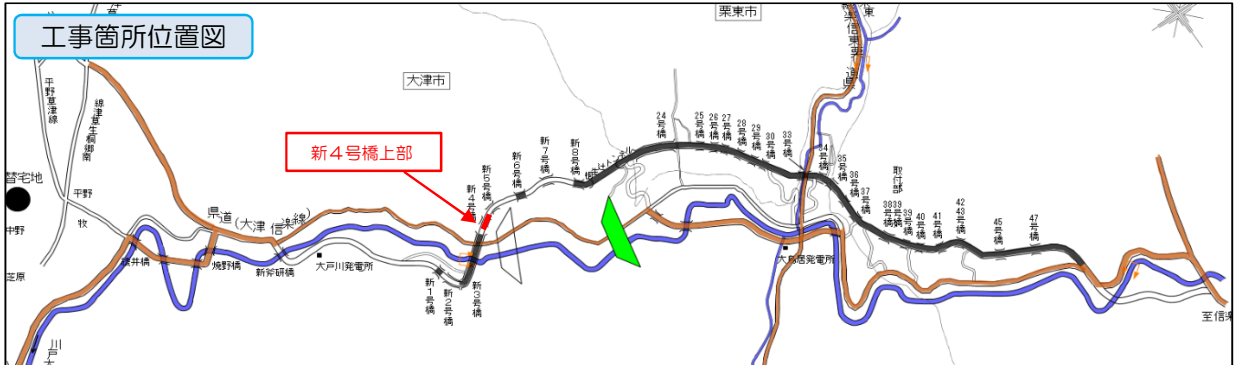

## 現場位置図



【工事の進捗】 仮橋・仮栈橋撤去工（追加工事）の施工を開始しています。

## 現場の進捗状況

橋梁下部工事が完成し、工事の一時中止期間も解除され、現場着手しました。現在は本体工事に支障となるA1橋台とA2橋台の間にある、仮橋・仮栈橋撤去作業を行っています。撤去が済んだら、支保工の基礎支持杭の施工を行います。



仮橋・仮栈橋撤去 着工前



仮橋・仮栈橋撤去 施工中

## 現場代理人のコメント

新型コロナウイルス感染、熱中症が問題となってきました。現場においても気を抜かず感染、熱中症対策を講じて、施工や第三者への影響が無いよう進めてまいります。

当現場は今月より工事を着手します。工事期間中は、安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。



請負者：昭和コンクリート工業(株)  
現場代理人：渡邊泰全  
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先  
事務所TEL：077-549-2370

# 大津信楽線付替工事ニュース

令和2年9月15日




バックナンバーは  
QRコードを眺込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ



工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事

工期：令和元年9月19日～令和2年11月30日


【付替県道 新2号橋の橋台を1基と、補強土壁を施工します。】

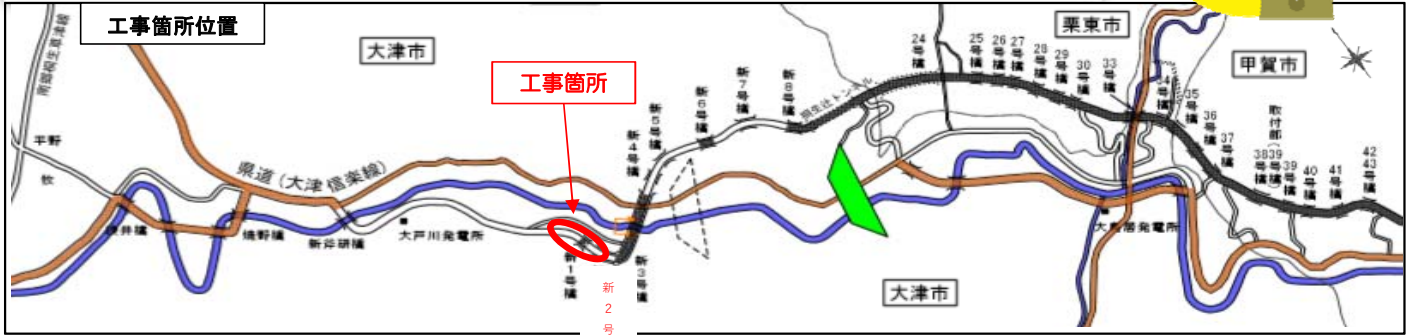

**補強土壁とは？**  
盛土内に帯状の鋼製補強材を層状に敷設し土と補強材の摩擦効果によって強固な補強土壁を構築する擁壁です。

## 工事進捗


### 橋台工



フォーチングと呼ばれる基礎部まで完成しました。9月末に橋台工は完成となります。



### 1号補強土壁工



1号補強土壁部は、盛土が完成し上部の道路側溝等の排水構造物と、ガードレール基礎を施工しています。  
1号補強土壁部は9月末の完成予定です。



## 今後の予定

橋台の完成に伴い橋台接続部の3・4号補強土壁工、5・6号坑口壁工と工事を進めていきます。今後は県道16号を使用して土砂の運搬が多くなりますが、安全第一を心掛け工事を進めてまいりますので皆様のご理解ご協力をお願い致します。

**安全第一**  
施工中に注意して下さい！



株式会社 内田組

【現場事務所】 大津市上田上桐生町地先  
【電話】 077-549-3356  
【FAX】 077-549-3356

# 大津信楽線付替工事ニュース

令和2年9月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

9月

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事  
当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日  
(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

## 工事箇所位置図



新4号・新5号橋間改良その他工事



新4号橋

新5号橋

## 擁壁掘削状況



## 転石破碎状況




## 大型ブロック設置完了



梅雨から急に真夏日が続いてますが、暑さに負けず作業しています。  
相変わらず転石がたくさんできてますが頑張って工事を進めたいと思います。

## アンカー削孔状況

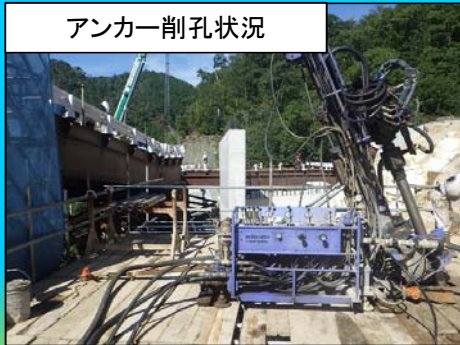

## 現場代理人コメント

真夏日が続く中作業を進めています。急なゲリラ豪雨に見舞われることもあり、法面崩壊にも注意しながら、安全作業で頑張ります。

現場代理人  
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

【FAX】 077-549-0075

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和2年9月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事  
工期：令和元年11月26日～令和2年10月31日

9月

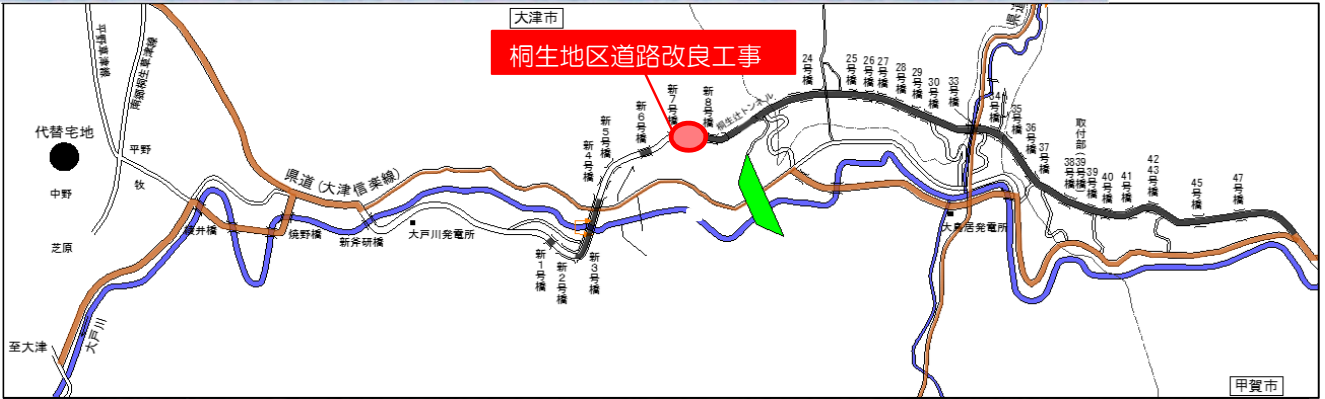

## 現在の状況

### 全体施工状況



現在の作業：8月よりパネル設置及び削孔作業を施工中です。  
今後の予定：11号補強土壁工の2ブロック及び3ブロックのパネルの施工を順次行って参ります。

### パネル設置状況



## 現場代理人コメント

現在、11号補強土壁工を順次施工しております。熱中症の危険が高まっている為、水分補給を十分に行い作業行っています。  
パネルの施工になりますので、搬入材料の車輛の出入りが多くなります。十分安全に注意し出入りしますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。

現場代理人  
伊藤 雅記




# 大津信楽線付替工事ニュース 令和2年9月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事  
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

9月

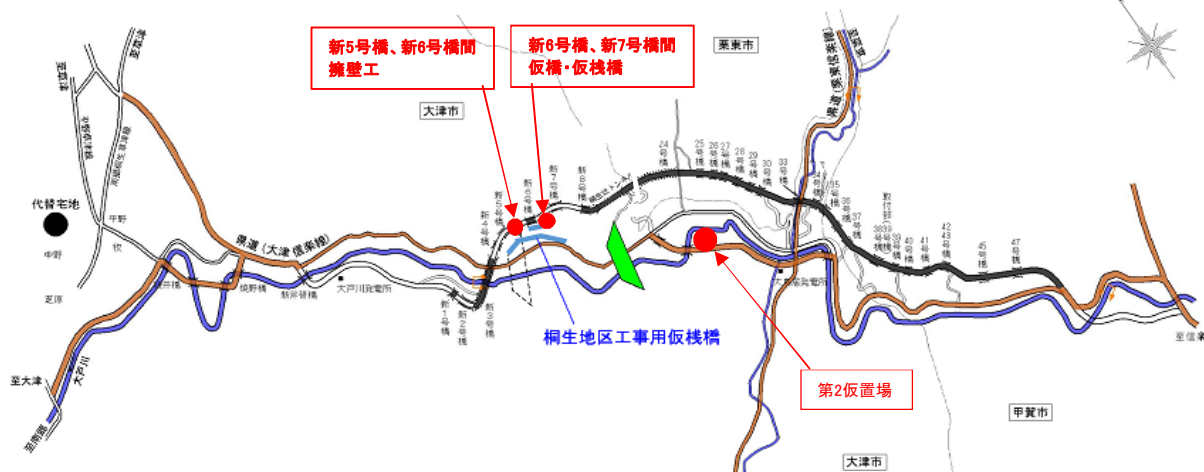

起点側からと終点側からの現場状況をドローンで撮影しました。9号補強土壁、新7号橋A1橋台施工中です。

## 工事写真

新7号橋A1橋台は深礎工完了後フーチング施工、9号補強土壁工はEPルートパイル施工。



深礎工の生コン打設。



深礎工完了。



フーチング鉄筋組立



フーチング型枠組立。



EPルートパイル足場組立。



ロータリーパーカッションドリルでの削孔。




EPルートパイル設置。

8月の猛暑は例年以上に厳しかったです。熱中症が出なかったのは幸いでした。9月は台風シーズンですが工期を守って一丸で頑張っています。

監理技術者より一言

松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先  
【電話】 077-549-1070  
【FAX】 077-549-1075  
監理技術者 秋村 智詩

# 大津信楽線付替工事ニュース

令和2年9月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事  
工期：令和2年1月16日～令和3年2月28日

9月



## 現在の状況

### 現場代理人コメント



工場では橋げたの製作が完了し、仮組立後、塗装作業を行っています。

現場では仮橋の施工が続いています。9月に入り残暑厳しい中、熱中症対策、新型コロナ対策と健康管理に留意し安全第一に進めています。

現場代理人 鶴田 政宏

### 工場での仮組立状況



現在の作業：橋げたの製作および仮橋の施工を進めています。  
今後の予定：工場は仮組立した部材を解体し、塗装作業となります。  
現地では引き続き仮橋の工事を進めます。

**KH** 株式会社 駒井ハルテック  
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-2546  
077-549-2547

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和2年09月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み  
込み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流道路改良工事  
工期：令和2年7月7日～令和3年2月26日

9月

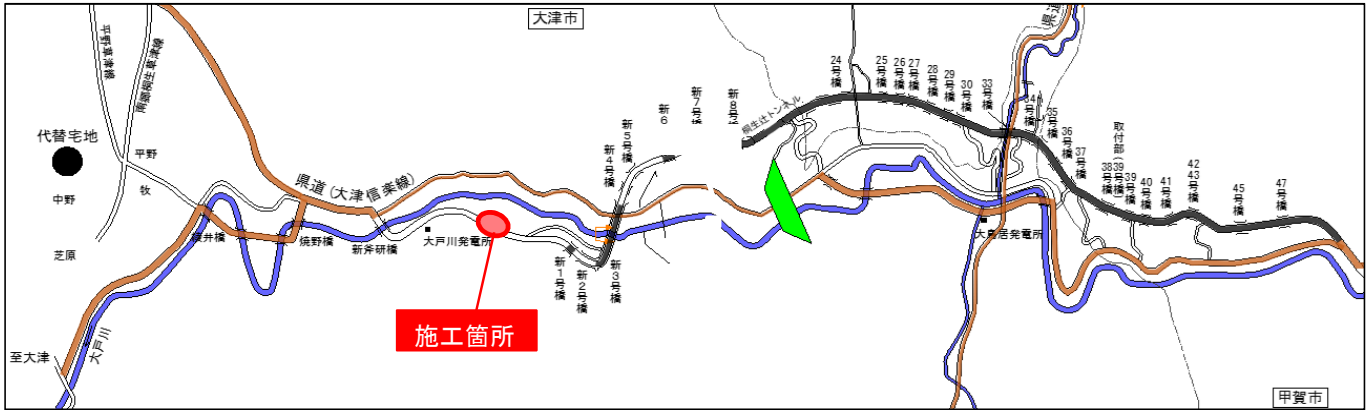

1号補強土壁の掘削と3号ブロック積工の準備をしています。



1号補強土壁掘削状況



3号ブロック積施工のための仮設ヤード

現場代理人のコメント

本工事を受注しました  
(株)大山建設です。

今回の工事は、擁壁工  
(1号補強土壁、3号ブ  
ロック積、他)、排水工、  
舗装工と多岐にわたります  
が、安全第一で早期完  
工を目指し努力致します  
ので、何卒ご理解ご協  
力を頂きますようお願い致  
します。

**OhyAMA** 株式会社 大山建設

【現場事務所】  
【電話】  
【FAX】

滋賀県大津市上田上牧町1131  
077-549-0583  
077-549-0583
