

加古川中流部緊急治水対策(加東市滝野地区)


更新箇所: 赤文字

～度重なる浸水被害に対して、重点的な治水対策を実施～


【R3年7月末時点】

○度重なる浸水被害に対して、平成29年度から、加古川中流部の加東市滝野地区(河高・下滝野・上滝野地区)を緊急対策特定区間に設定し、重点的に築堤や川の掘削を実施し、概ね10年間で平成16年洪水(台風第23号)と同規模の洪水に対する浸水被害の早期軽減を図ります。

○このうち、特に近年浸水頻度が高い河高・下滝野地区については、平成29年度から概ね5年間(令和3年度)で整備するとともに、滝野地区全体の用地取得の完了を目指しています。

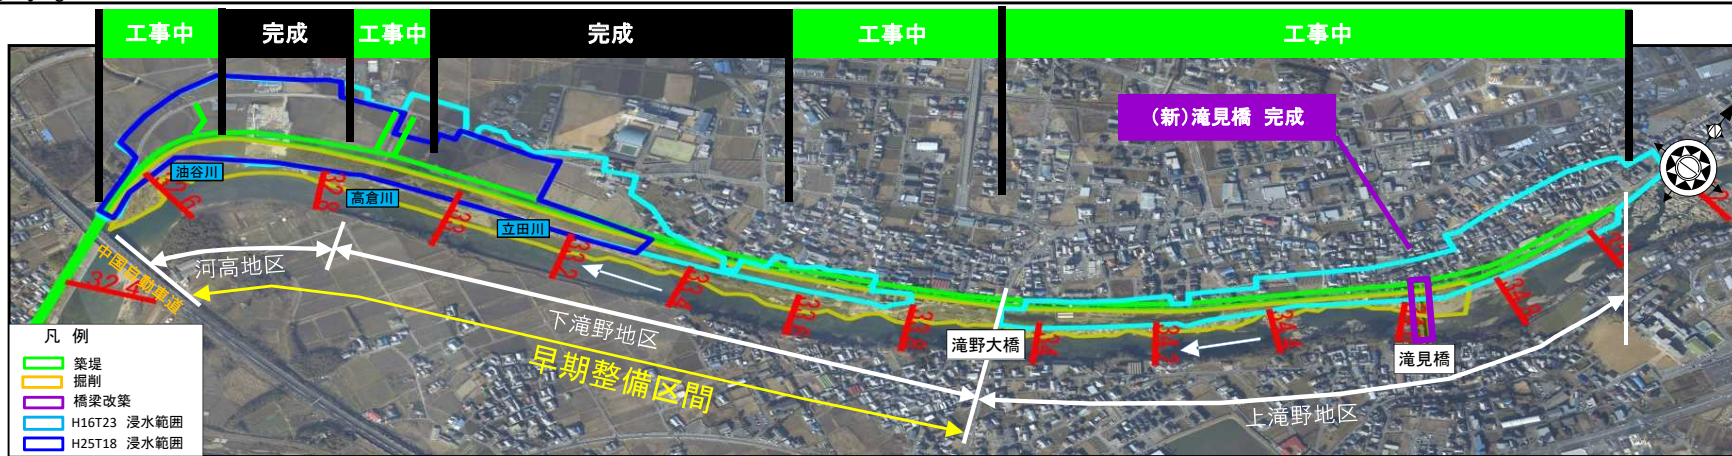

計画断面図

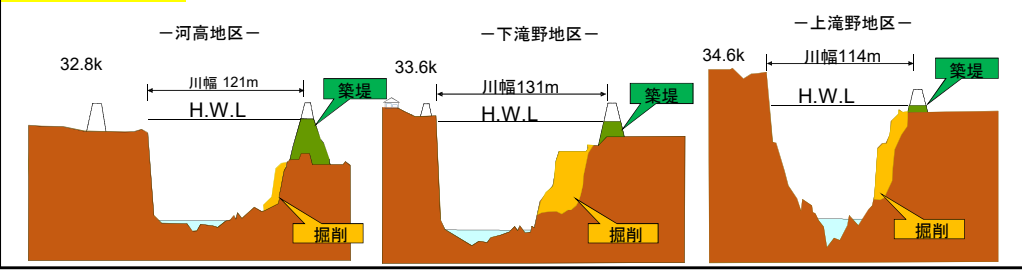

工事概略工程

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
河高	築堤					R3完成予定				
下滝野	掘削					R3完成予定				
上滝野	掘削					築堤				
	橋梁改築									

※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

事業進捗

河高・下滝野地区(早期整備区間)

河高・下滝野	進捗率
用地取得	99%
築堤	46%
掘削	100%

R2年度に掘削完了。現在、下滝野地区の築堤工事の準備工を実施。河高地区は、6月に工事契約完了。



上滝野地区


上滝野	進捗率
用地取得	79%
築堤	0%
掘削	22%
橋梁改築(新橋)	100%
旧橋撤去	旧橋撤去中

R2.7.19新橋開通。現在、R3年度発注の旧橋撤去工事の発注手続き準備中。




【R3.6月撮影】

整備前

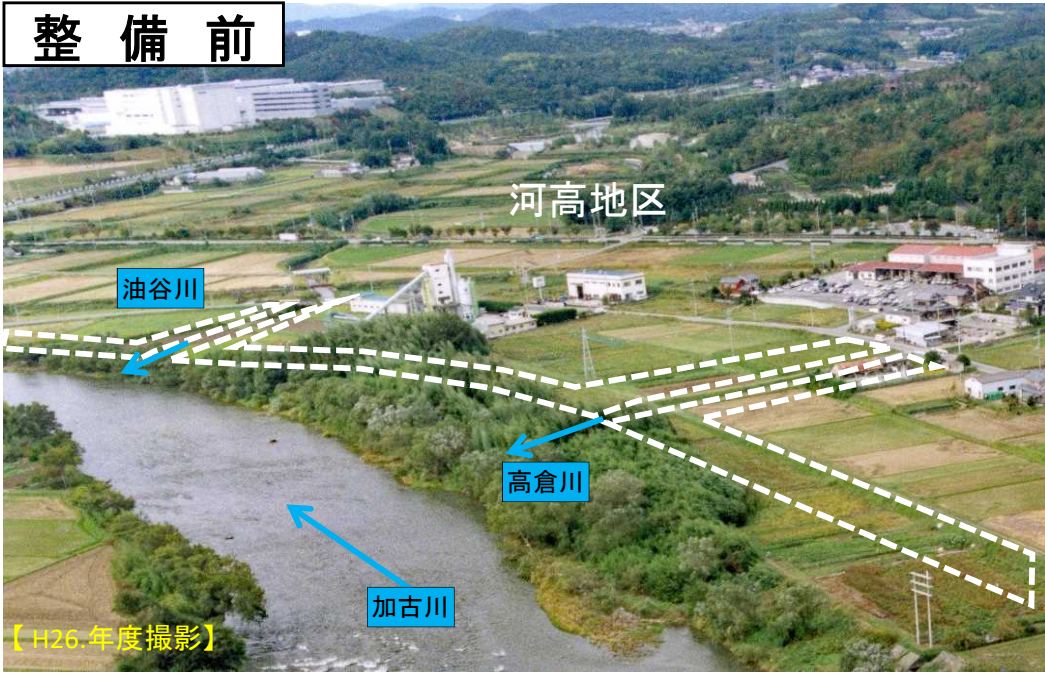

河高地区 工事实施状況

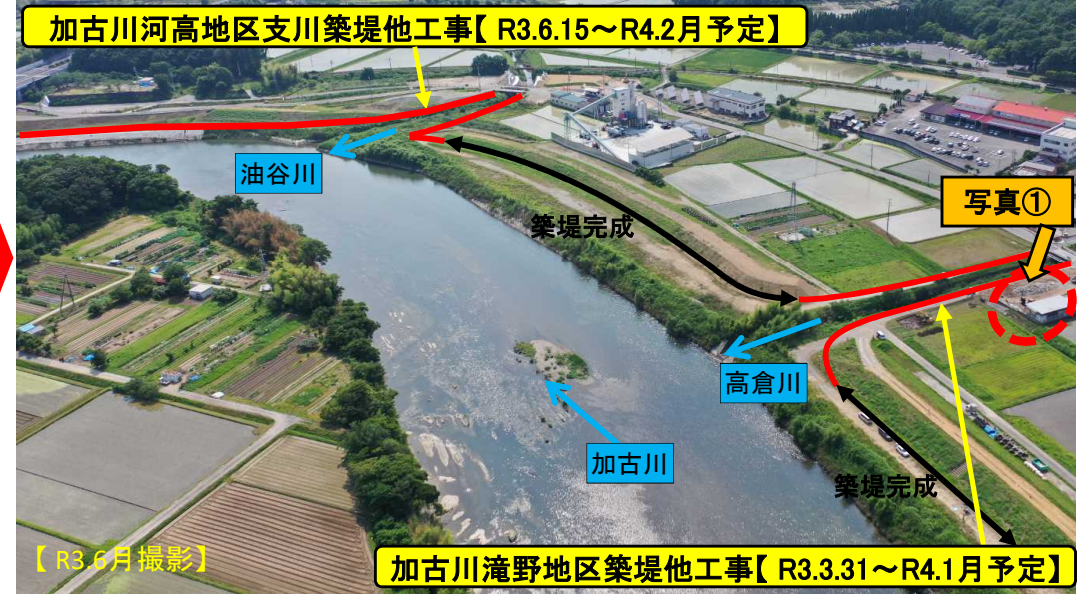

河高地区 合同施工調整会議



写真①(河高地区 工事实施状況)



下滝野地区(早期整備区間)の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字 【令和3年7月末時点】

整備前



下滝野地区 工事实施状況



下滝野地区 支障物現地立会

・河川改修に伴う電柱等の支障物の移設について関係者と現地立会を実施



写真②(下滝野地区 工事实施状況)

・築堤を行うため、既設構造物の撤去を実施中



上滝野地区の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字 【令和3年7月末時点】

(旧)滝見橋撤去前



(旧)滝見橋撤去中



上滝野地区(滝野大橋～鬪竜橋下流)

・築堤に必要な用地取得の手続きを進めています。(進捗率:79%)

