


# 加古川中流部緊急治水対策(加東市滝野地区)

更新箇所:赤文字


【R4年11月末時点】

～度重なる浸水被害に対して、重点的な治水対策を実施～

- 度重なる浸水被害に対して、平成29年度から、加古川中流部の加東市滝野地区(河高・下滝野・上滝野地区)を緊急対策特定区間に設定し、重点的に築堤や川の掘削を実施し、概ね10年間で平成16年洪水(台風第23号)と同規模の洪水に対する浸水被害の早期軽減を図ります。
- このうち、特に近年浸水頻度が高い河高・下滝野地区については、平成29年度から概ね5年間(令和3年度)で整備するとともに、5か年加速化予算を活用することで、滝野地区全体の完成を令和7年度を目標に事業を推進します。

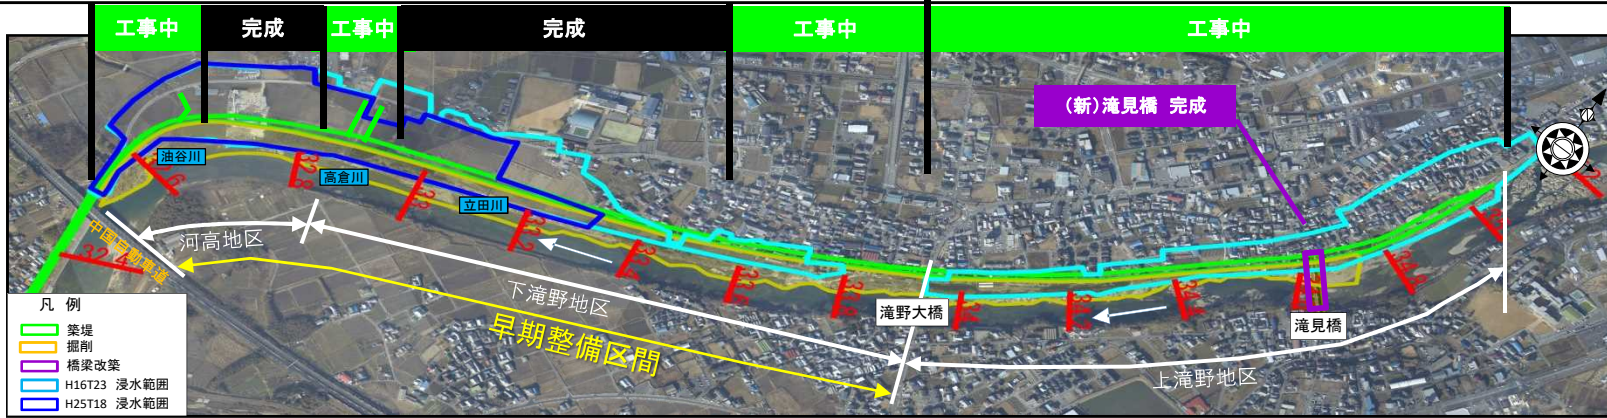

## 計画断面図




## 事業進捗

### 河高・下滝野地区(早期整備区間)

河高・下滝野	進捗率
用地取得	100%
築堤	62% (概成)
掘削	100%

令和4年3月末に油谷川、高倉川、滝野大橋下流の一部が概成箇所ですが、早期整備区間の治水安全度は確保しています。令和4年度は、概成箇所の整備を継続しています。



### 上滝野地区

上滝野	進捗率
用地取得	93%
築堤	0%
掘削	26%
橋梁改築(新橋) 旧橋撤去	100% 撤去完了

令和4年3月末に旧滝見橋撤去完了。同5月末に右岸橋台部の護岸完了。R4年度から滝野大橋上流で築堤護岸を施工中。



## 工事概略工程

地区	年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
	河高 下滝野	築堤	→					→	→	R6完成予定	
	掘削	→					R3概成				
上滝野	橋梁改築(旧橋撤去完了)		→								
	掘削										
	築堤										

目標に事業推進

R7年度完成を


※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

# 河高地区(早期整備区間)の工事進捗状況


更新箇所: 赤文字

【令和4年11月末時点】

## 整備前

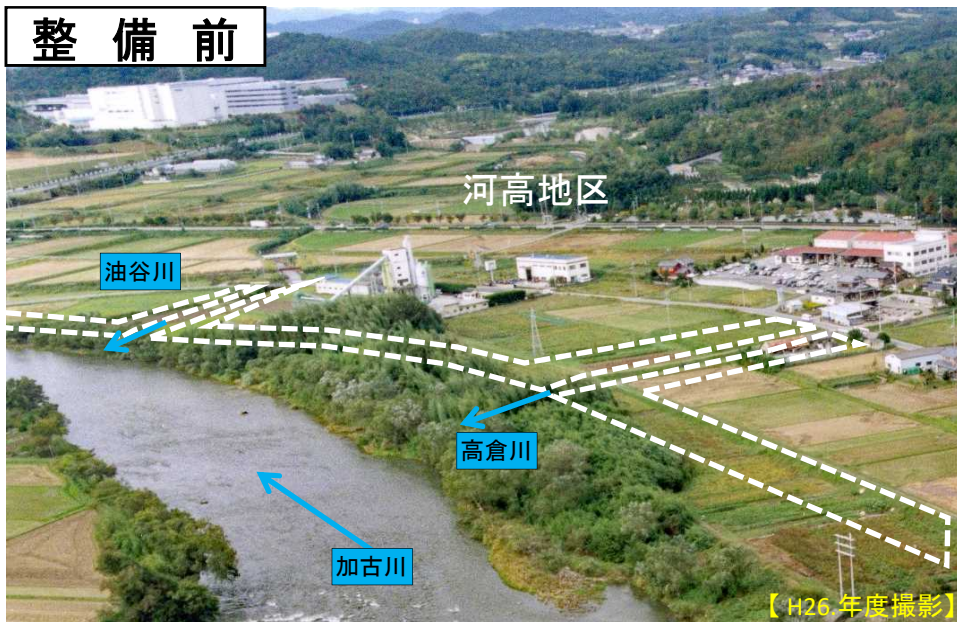


## 河高地区 工事実施状況

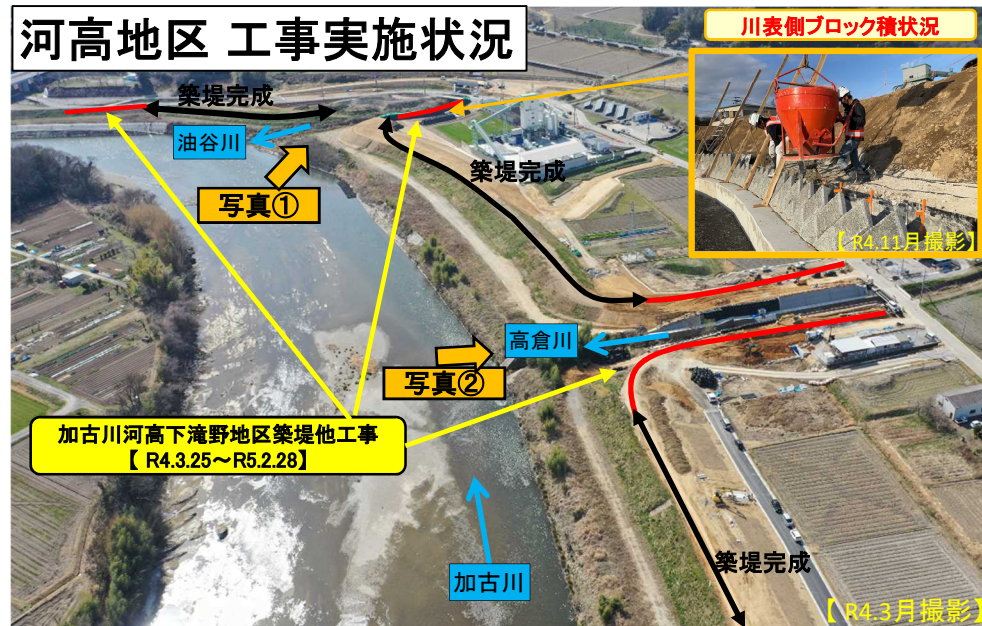

## 写真①(河高地区 工事実施状況)


・油谷川バック堤の盛土

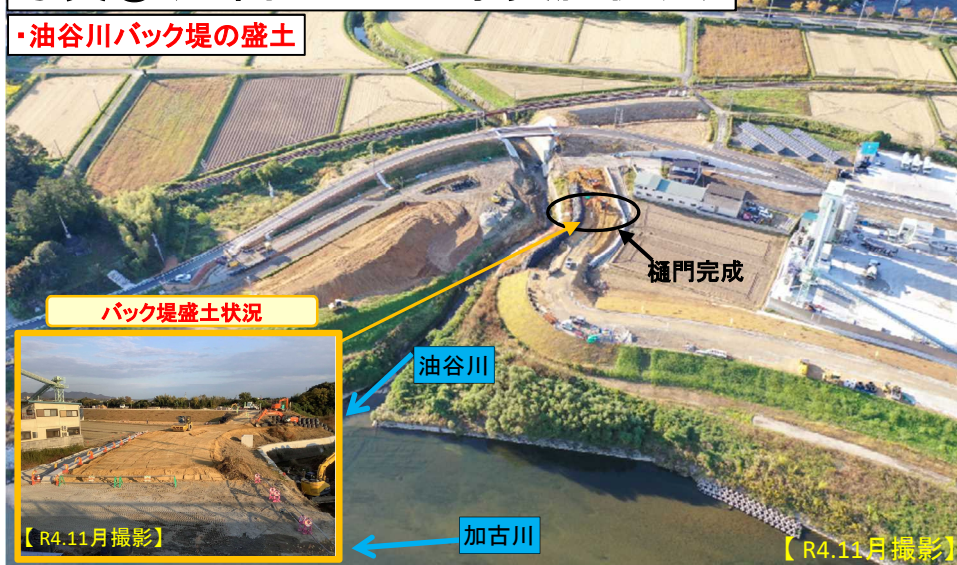

## 写真②(下滝野地区 工事実施状況)

・付替道路の復旧工事

側溝工事状況

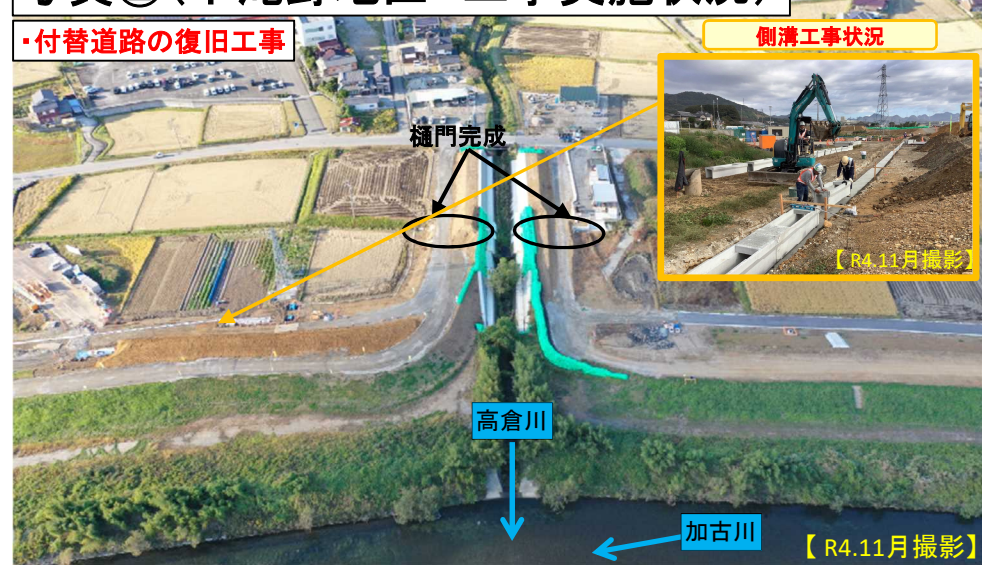


# 下滝野地区(早期整備区間)の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和4年11月末時点】


## 整備前

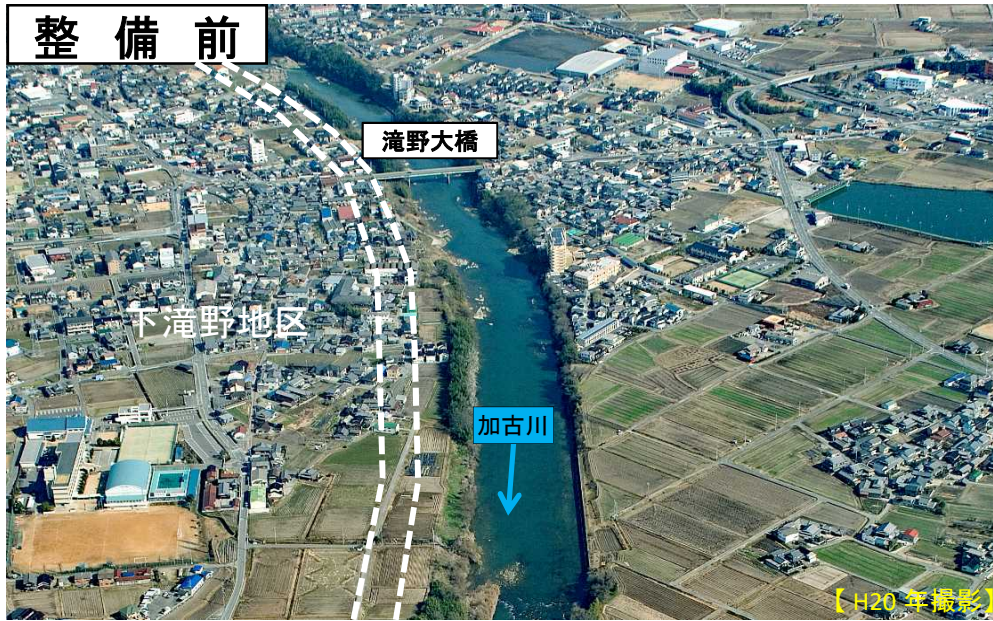

## 下滝野地区 工事実施状況



## 下滝野地区 工事実施状況

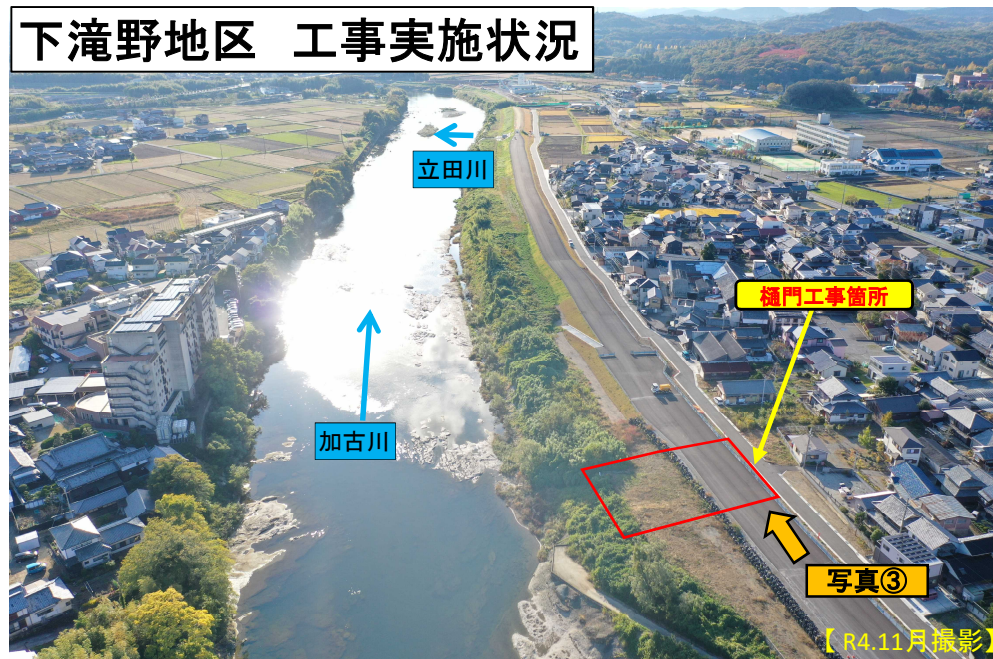

## 写真③樋門工事(下滝野地区)

・樋門工事 掘削状況



整備前



写真④加古川滝野地区掘削他工事

・河川土工 掘削状況(仮締切設置)



上滝野地区 工事实施状況



写真⑤加古川滝野地区整備他工事

・工事用道路設置状況(仮締切設置)

