

加古川中流部緊急治水対策(加東市滝野地区)


更新箇所: 赤文字

～度重なる浸水被害に対して、重点的な治水対策を実施～


【R4年1月末時点】

○度重なる浸水被害に対して、平成29年度から、加古川中流部の加東市滝野地区(河高・下滝野・上滝野地区)を緊急対策特定区間に設定し、重点的に築堤や川の掘削を実施し、概ね10年間で平成16年洪水(台風第23号)と同規模の洪水に対する浸水被害の早期軽減を図ります。

○このうち、特に近年浸水頻度が高い河高・下滝野地区については、平成29年度から概ね5年間(令和3年度)で整備するとともに、5か年加速化予算を活用することで、滝野地区全体の完成を令和7年度を目標に事業を推進します。

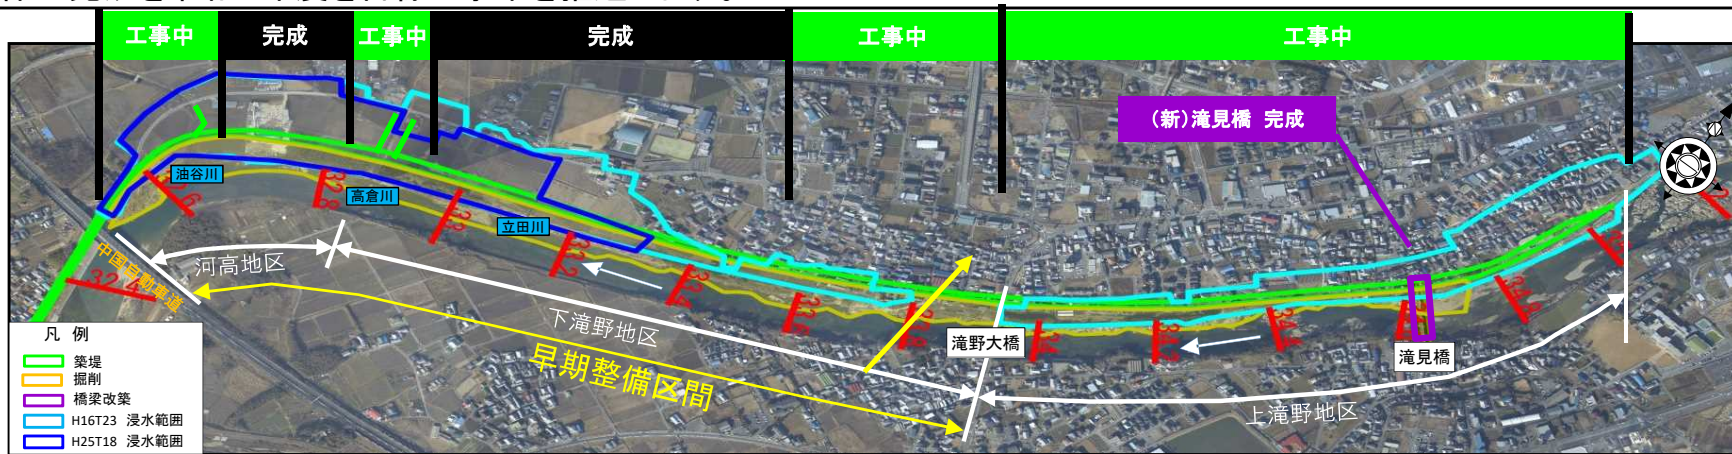

計画断面図

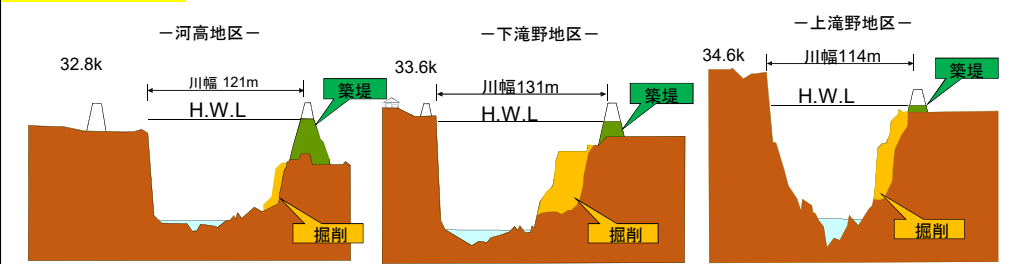

工事概略工程

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
河高	築堤					築堤	R4完成予定				
下滝野	掘削					R3概成					
上滝野	掘削					築堤					
	橋梁改築										

※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

事業進捗


河高・下滝野地区(早期整備区間)

河高・下滝野	進捗率
用地取得	99%
築堤	46%
掘削	100%

上滝野地区

上滝野	進捗率
用地取得	88%
築堤	0%
掘削	22%
橋梁改築(新橋)	100%
旧橋撤去	旧橋撤去中

現在、河高地区の樋門工事(油谷川)・下滝野地区の築堤に伴う付替市道工事及び樋門工事(高倉川)を実施中。

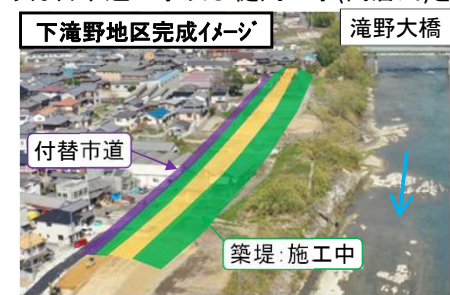


R2.7.19新橋開通。R3年度中の撤去完了に向けて残りの橋梁撤去工事を実施中。(桁材撤去完了)




【R3.11月撮影】

整備前

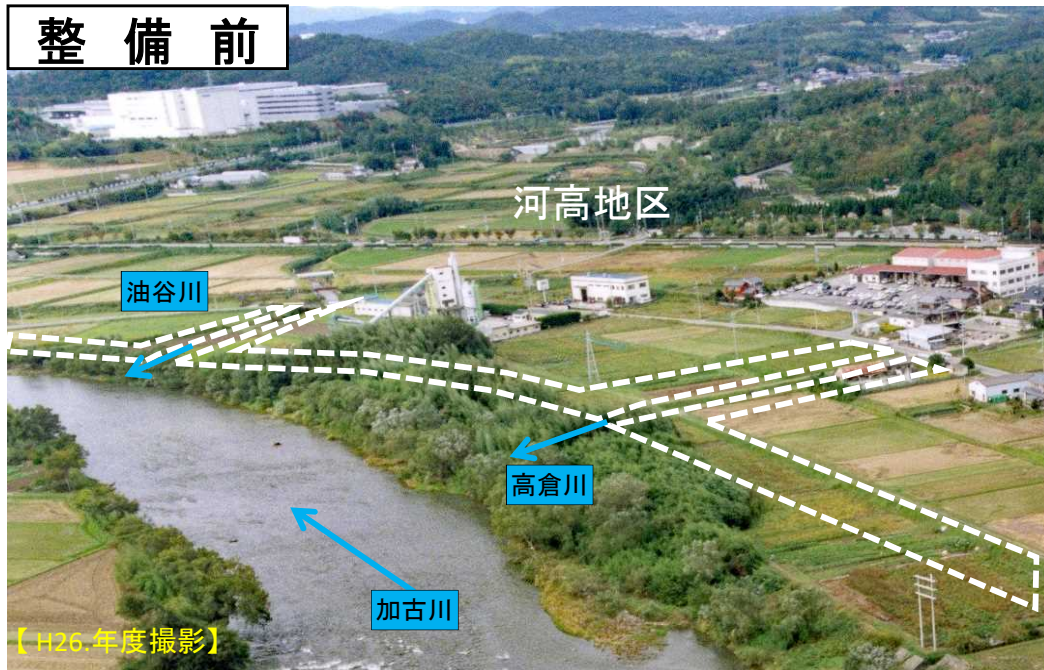

河高地区 工事实施状況

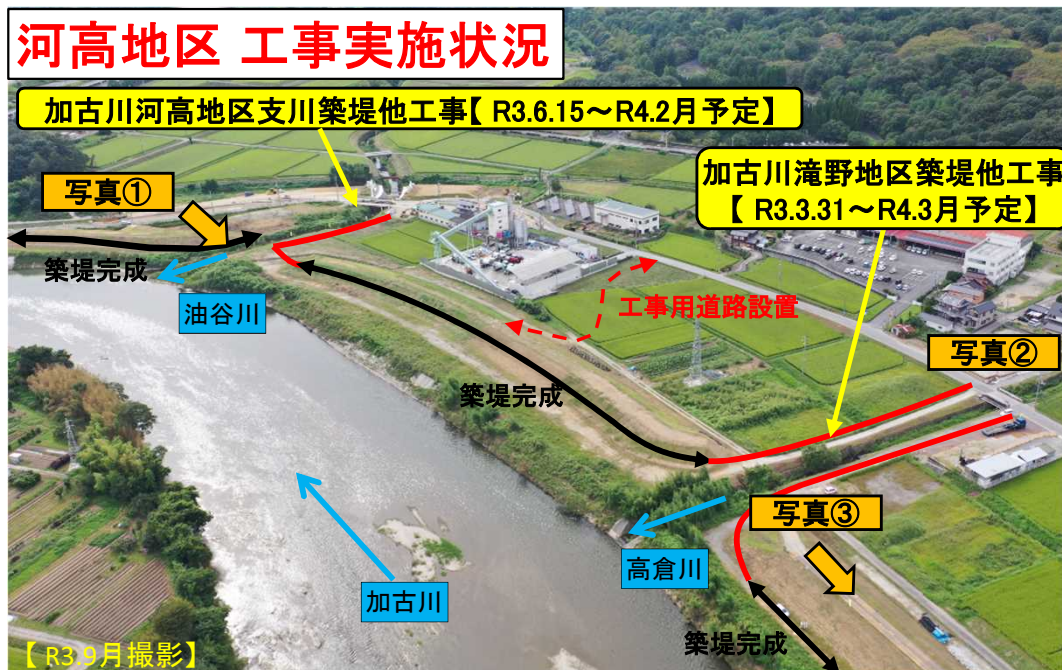

写真①(河高地区 工事实施状況)

・加古川と油谷川の合流の護岸工事を実施中



写真②(下滝野地区 工事实施状況)

・高倉川の樋門工事を実施中



下滝野地区(早期整備区間)の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和4年1月末時点】

整備前



下滝野地区 工事实施状況



写真③(下滝野地区 工事实施状況)

・付替市道・築堤盛土工事を実施中



写真④(下滝野地区 工事实施状況)

・付替市道(舗装工)工事を実施中



上滝野地区の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和4年1月末時点】

(旧)滝見橋撤去前



(旧)滝見橋撤去中(R3年度撤去工事開始)



写真⑤(上滝野地区工事实施状況)

・旧橋撤去作業中(橋梁上部撤去完了、橋脚撤去中)

☆橋脚撤去の作業状況(ワイヤーリング)



写真⑥(上滝野地区工事实施状況)

・築堤護岸作業中(掘削・法面整形状況)

