

加古川中流部緊急治水対策(加東市滝野地区)



更新箇所: 赤文字

～度重なる浸水被害に対して、重点的な治水対策を実施～

【R4年3月末時点】

○度重なる浸水被害に対して、平成29年度から、加古川中流部の加東市滝野地区(河高・下滝野・上滝野地区)を緊急対策特定区間に設定し、重点的に築堤や川の掘削を実施し、概ね10年間で平成16年洪水(台風第23号)と同規模の洪水に対する浸水被害の早期軽減を図ります。

○このうち、特に近年浸水頻度が高い河高・下滝野地区については、平成29年度から概ね5年間(令和3年度)で整備するとともに、5か年加速化予算を活用することで、滝野地区全体の完成を令和7年度を目標に事業を推進します。

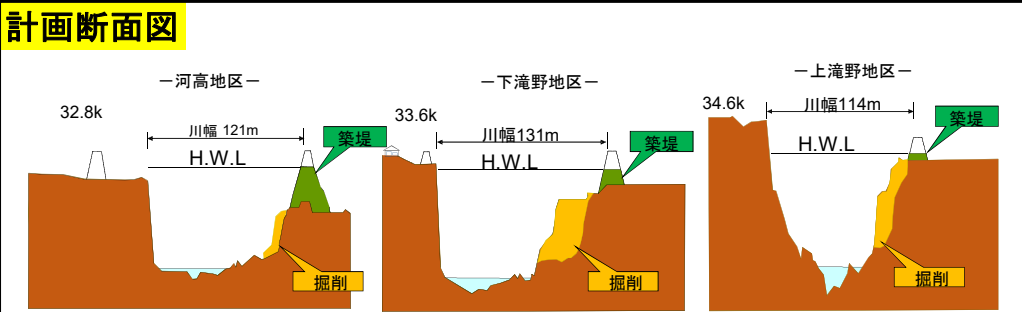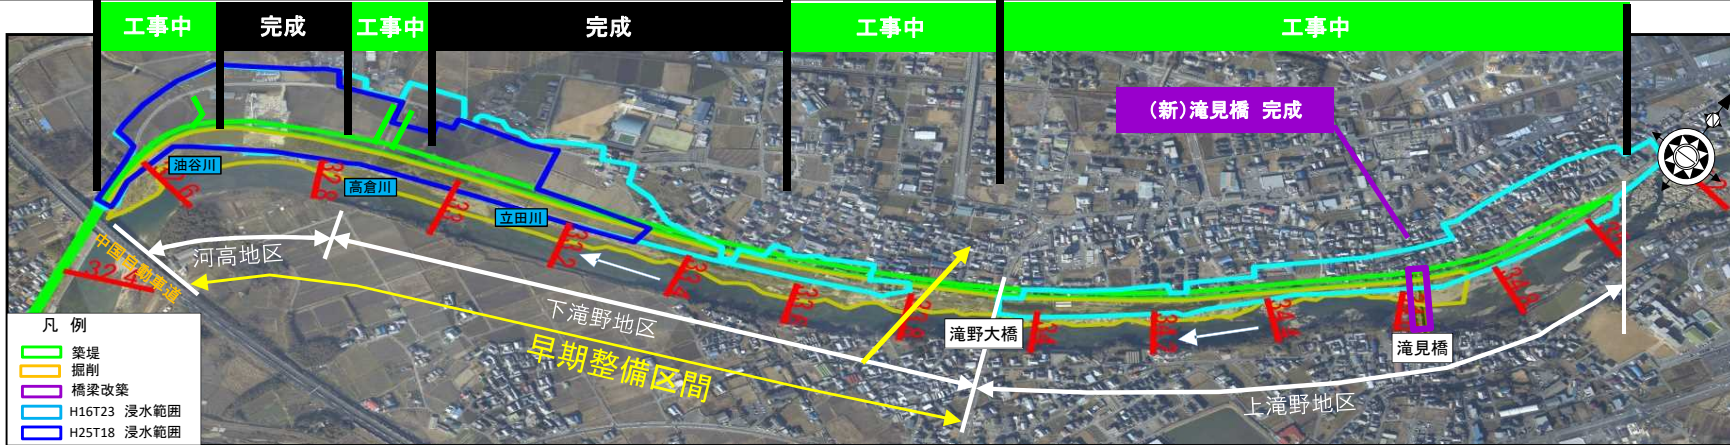


事業進捗

河高・下滝野地区(早期整備区間)

河高・下滝野	進捗率
用地取得	99%
築堤	62%
掘削	100%

現在、R3年度内、河高・下滝野地区(油谷川・高倉川)の樋門・築堤工事が概成、R4年度内に築堤護岸工事完了予定。

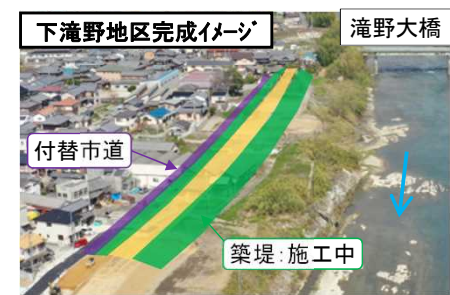

工事概略工程

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
河高	築堤					築堤	R4完成予定				
下滝野	掘削					R3概成					
上滝野	掘削					築堤					
	橋梁改築										

上滝野地区

上滝野	進捗率
用地取得	88%
築堤	0%
掘削	26%
橋梁改築(新橋)	100%
旧橋撤去	旧橋撤去中

R2.7.19新橋開通。R3年度内、旧橋撤去完了、R4年5月頃に右岸橋台部の護岸工事完了予定。



【R4.3月撮影】


※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

河高地区(早期整備区間)の工事進捗状況


更新箇所: 赤文字

【令和4年3月末時点】

整備前

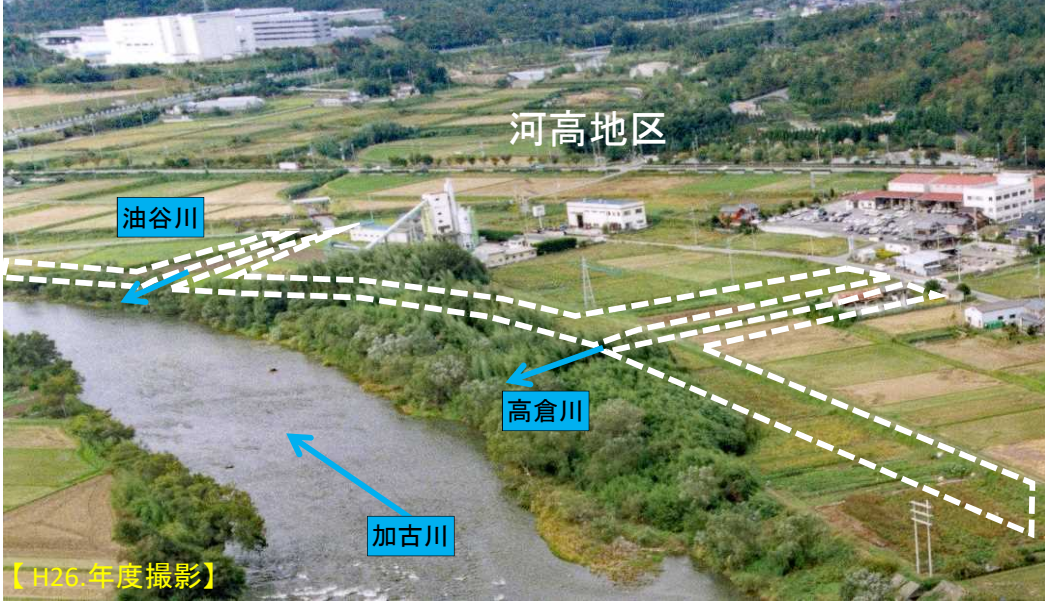

河高地区 工事实施状況

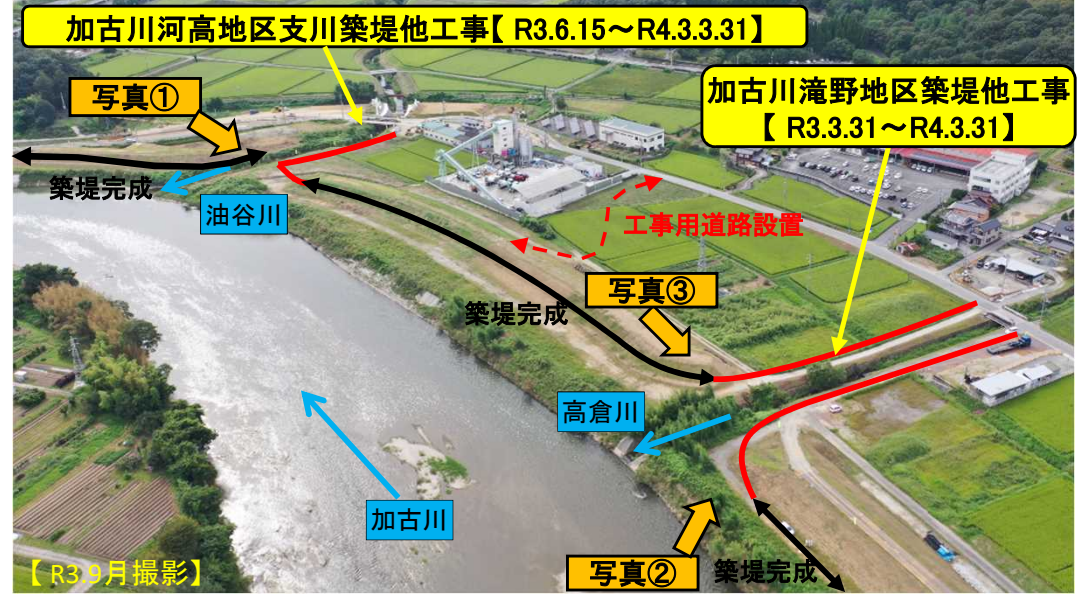

写真①(河高地区 工事实施状況)

・加古川と油谷川の合流部の築堤工事が概成



写真②(下滝野地区 工事实施状況)

・高倉川の築堤護岸工事が概成



下滝野地区(早期整備区間)の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和4年3月末時点】

整備前



下滝野地区 工事实施状況



写真③(下滝野地区 工事实施状況)



写真④(下滝野地区 工事实施状況)



上滝野地区の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和4年3月末時点】

(旧)滝見橋撤去前



(旧)滝見橋撤去中(R3年度撤去工事開始)



写真⑤(上滝野地区工事实施状況)

・仮締切撤去完了(旧橋撤去完了)



写真⑥(上滝野地区工事实施状況)

・右岸 橋台部の低水護岸工完了(掘削・法面整形完了)

