

# 加古川中流部緊急治水対策(加東市滝野地区)


更新箇所: 赤文字

～度重なる浸水被害に対して、重点的な治水対策を実施～


【R4年5月末時点】

○度重なる浸水被害に対して、平成29年度から、加古川中流部の加東市滝野地区(河高・下滝野・上滝野地区)を緊急対策特定区間に設定し、重点的に築堤や川の掘削を実施し、概ね10年間で平成16年洪水(台風第23号)と同規模の洪水に対する浸水被害の早期軽減を図ります。

○このうち、特に近年浸水頻度が高い河高・下滝野地区については、平成29年度から概ね5年間(令和3年度)で整備するとともに、5か年加速化予算を活用することで、滝野地区全体の完成を令和7年度を目標に事業を推進します。

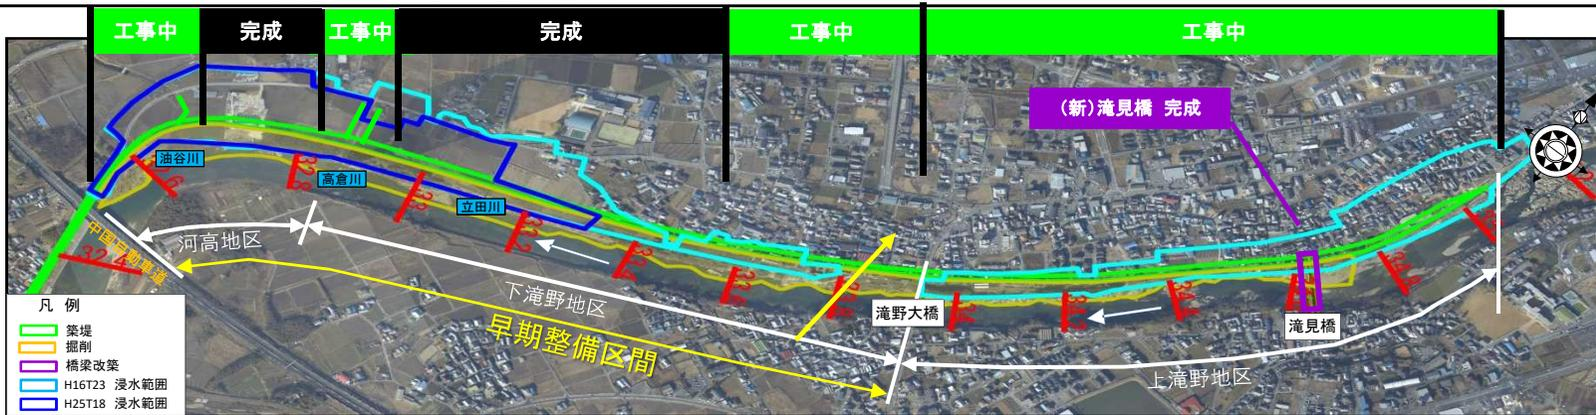

## 計画断面図




## 事業進捗

### 河高・下滝野地区(早期整備区間)

河高・下滝野	進捗率
用地取得	99%
築堤	62%
掘削	100%

現在、R3年度内、河高・下滝野地区(油谷川・高倉川)の樋門・築堤工事が概成、R4年度内に築堤護岸工事完了予定。

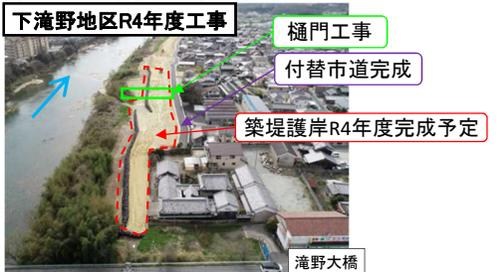

## 工事概略工程

年度	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
河高 下滝野		築堤	掘削			築堤	R4完成予定			
上滝野			掘削			築堤				
			橋梁改築							

### 上滝野地区

上滝野	進捗率
用地取得	89%
築堤	0%
掘削	26%
橋梁改築(新橋) 旧橋撤去	100% 撤去完了

R2.7.19新橋開通。R3年度内、旧橋撤去完了、R4年5月頃に右岸橋台部の護岸工事完了予定。




※現時点での予定であり、今後の状況により随時更新します。

# 河高地区(早期整備区間)の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和4年5月末時点】

## 整備前

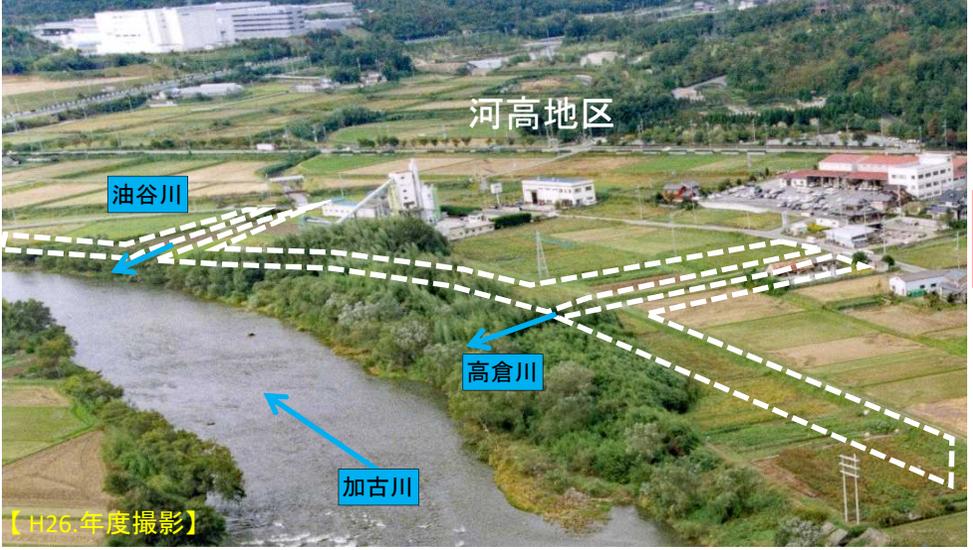

## 河高地区 工事実施状況



## 写真①(河高地区 工事実施状況)

・加古川と油谷川の合流部の築堤工事が概成



## 写真②(下滝野地区 工事実施状況)

・高倉川の築堤護岸工事が概成



# 下滝野地区(早期整備区間)の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和4年5月末時点】

## 整備前



## 下滝野地区 工事実施状況



## 写真③(下滝野地区 工事実施状況)



## 写真④(下滝野地区 工事実施状況)



# 上滝野地区の工事進捗状況

更新箇所: 赤文字

【令和4年5月末時点】

## (旧)滝見橋撤去前



## (旧)滝見橋撤去完了(護岸工事中)



## 整備前



## 写真⑤(上滝野地区工事実施状況)

