


水門ゲート機械設備工事 (扉体組立) が始まります

あいおさがわ

相長川水門ゲート設備新設工事

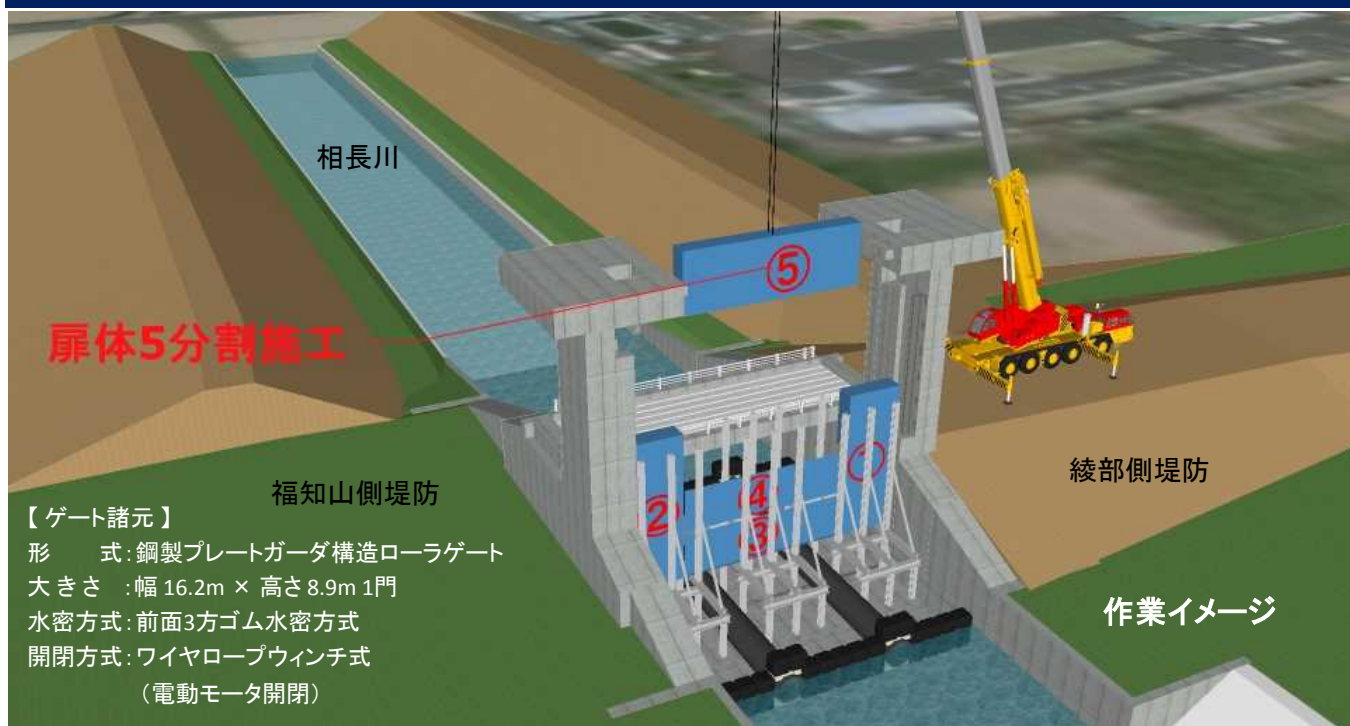

あいおさがわ

昨年度から施工している相長川水門工事も、水門本体については土木工事が終わり、ゲート設備が主体となっています。

12月12日からは、扉体の組立に入ります。***雨天、強風により工程変更となる場合があります。**

200tクレーンを使用して5分割した扉体を吊り込み組立・溶接を行います。

由良川では最大のゲート施工となります。

見学されたい方は、下記までお問い合わせ下さい。

【作業予定】

- 12月11日(日) 綾部側より堤防上へクレーン搬入・組立
- 12日(月) 綾部側より扉体側部吊り込み①
- 13日(火) 綾部側クレーン解体・移動
- 14日(水) 福知山側の堤防上でクレーン組立
- 15日(木) 福知山側より扉体側部吊り込み②
- 16日(金)～17日(土) 扉体中央部吊り込み③④⑤
- 18日(日) クレーン解体搬出
- 21日(水)～1月11日(水) 現場溶接(扉体接合)



問い合わせ先

福知山河川国道事務所 福知山出張所 犬塚・松宮

M735-6520 ☎ 0773-22-2861

*ヘルメット、長靴等は持参願います。
