

＜大津信楽線付替工事ニュース＞

作成：2015/4/16


工事名：大津信楽線左岸部道路整備工事

＜工事状況＞


- ・3号切補強部において、法面補強を施工しています。
- ・高盛土部において、掘削→運土→盛土作業と、排水工の施工をしています。
- ・4号切土補強部において、掘削準備をしています。

＜今後の予定＞

- ・4号切土の掘削及び法面整形後、法面補強を施工します。
- ・5月より、大鳥居信号付近の仮置場より、高盛土部への土砂搬入を始めます。

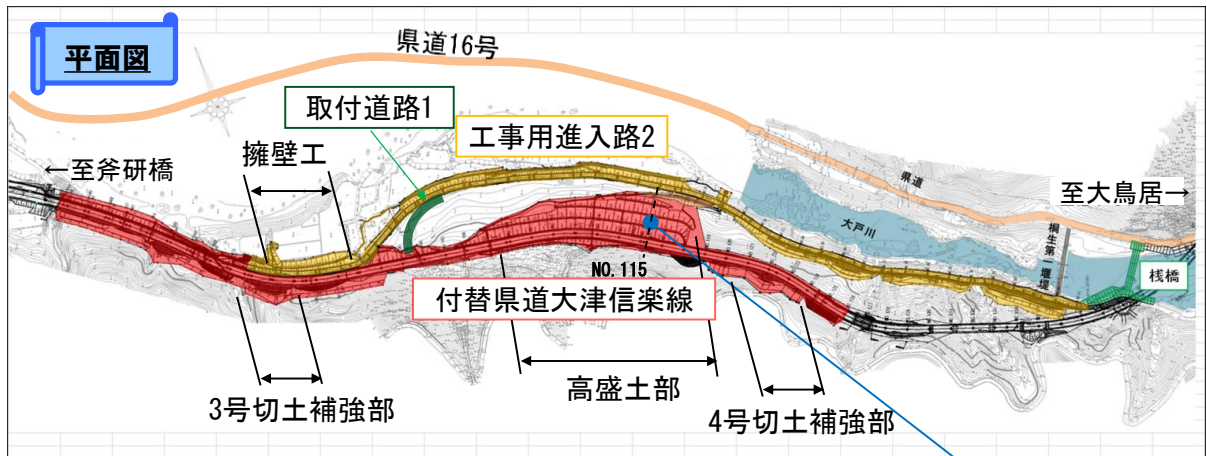

横断面図 (Cross-section Diagram)

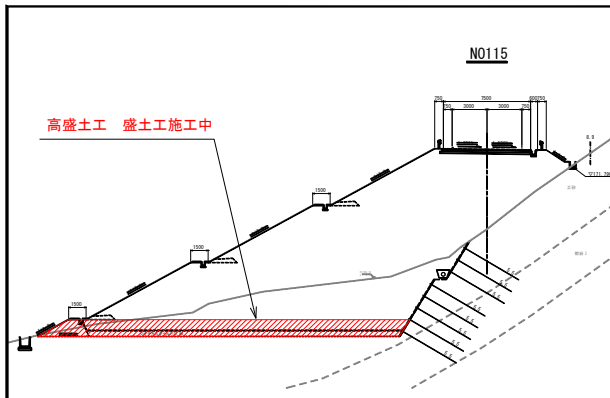

付替県道現況写真(4月14日)
(No.115付近)
掘削土により高盛土部の盛土を施工しています。



工程表 (Gantt Chart)

作業内容	4月			5月			6月			7月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
3号切土補強土工	██████████											
4号切土補強土工				██████████			██████████					
擁壁工							██████████			██████████		
高盛土工				██████████			██████████			██████████		



奥村組
大津信楽道路工事所
〒520-2161
滋賀県大津市上田上桐生町地先
TEL 077-549-2032
FAX 077-549-2052

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年4月16日

工事名: 大戸川ダム管内護岸補修工事

〈工事の進捗〉

- ・【7工区】: 4月13日(月)にガードレールの設置を行いました。
- ・【2工区】: 3月10日(火)より着手したモルタル吹付・アンカー挿入(最終段)の施工を行っています。

〈今後の予定〉

- ・【7工区】: 区画線を4月21日(火)(雨天の場合は順延)に予定しています。
- ・【2工区】: モルタル吹付・法面部のアンカー(鉄筋)挿入が完了後、法覆護岸工(コンクリート擁壁)の施工を予定しています。



【2工区(桐生地区)の作業状況】



(上の写真)


法面部にアンカー(鉄筋)挿入をしています。

【7工区(大鳥居地区)の進捗状況】



(左の写真)

ガードレールの設置が完成し、区画線を残すだけになりました。

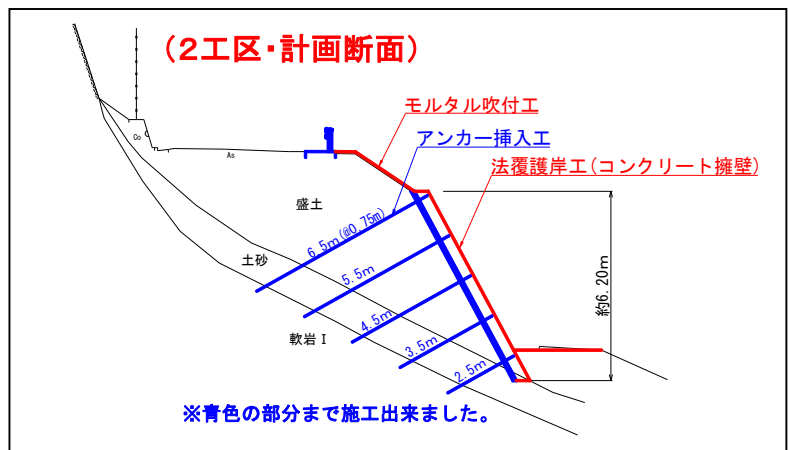

【工程表】

	4月	5月	6月	7月	備考
(2工区)					
準備工					
仮設工					
法覆護岸工					
後片付け					
(7工区)					
防護柵					
区画線					

請負者: (株) 大同
現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)
TEL: 090-8932-7433

現場事務所: 滋賀県大津市上田上大鳥居地先
TEL: 077-549-2703
FAX: 077-549-2703

工事名：大津信楽線新3号橋工事

【工事概要】

○橋梁上部工


- PC片持箱桁橋工 : 1式
- 橋梁付属物工 : 1式
- コンクリート橋足場等設置工 : 1式
- 仮設工 : 1式

○橋梁下部工


- 道路土工 : 1式
- RC橋脚工 : 1式
- 擁壁工 : 1式
- 構造物撤去工 : 1式
- 仮設工 : 1式

【工期】 平成26年12月25日～平成28年10月31日

【平面図】

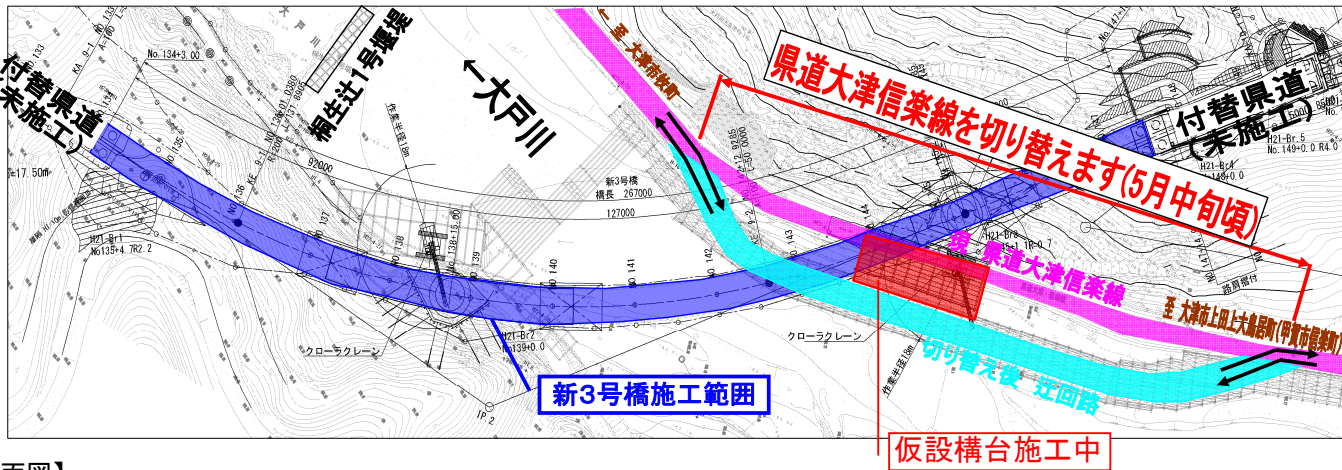

【側面図】

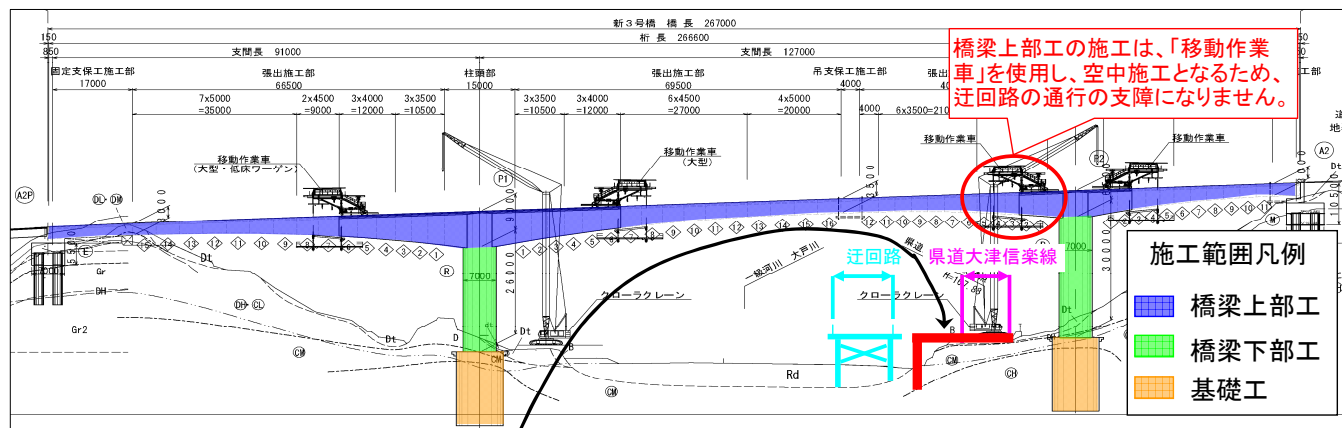

【施工状況】



仮設構台施工状況

橋脚施工の作業場となる
仮設構台を施工中です

【工程表】

作業内容	平成27年												平成28年									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
準備工	■	■																				
橋梁上部工																						
橋梁下部工																						
後片付け工																						
その他	◆ 県道切替え5月中旬予定																					

施工者 : 川田建設株式会社
 現場事務所 : 大津市上田上桐生町地先
 TEL : 077-549-0103

大津信楽線付替工事ニュース



平成27年 4月 16日

工事名：桐生地区工事用進入路整備工事
 施工者：株式会社 桑原組

【 平面図 】

凡例

- 本工事施工進入路
- (前年度)施工済進入路

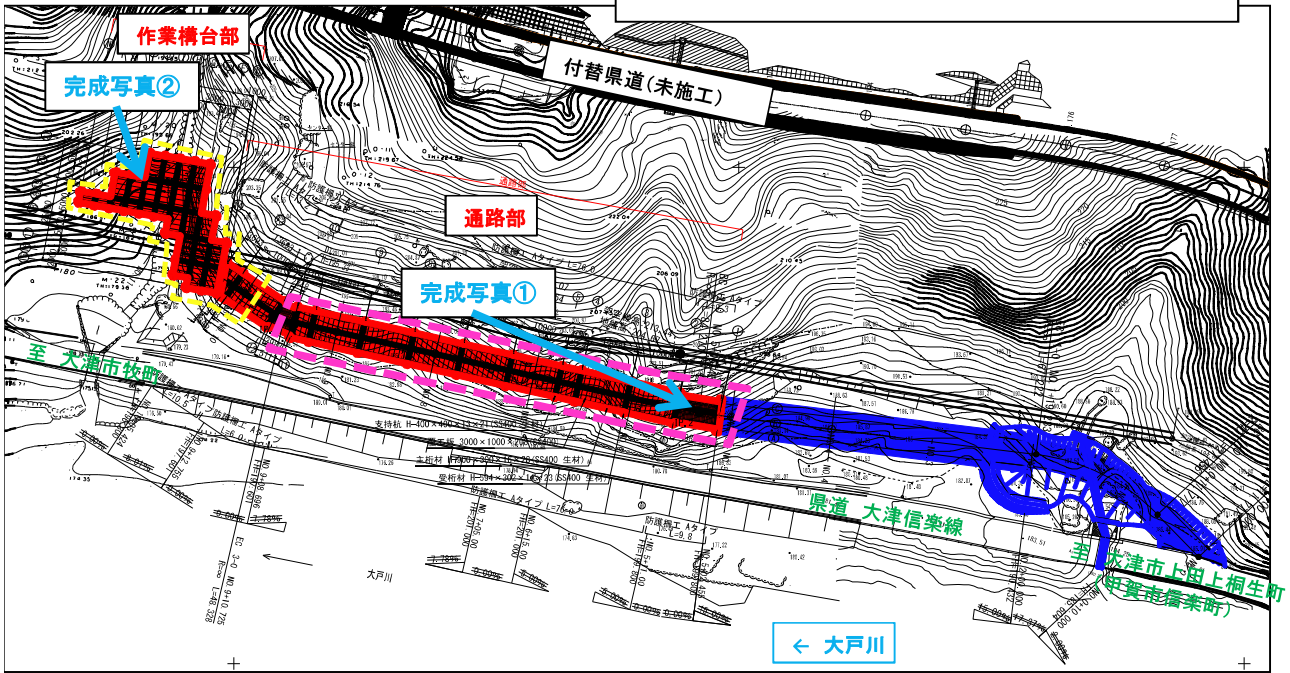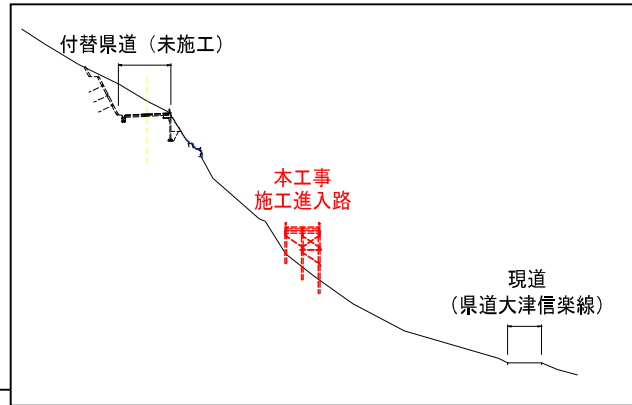

● 工事が完成しました。

完成写真① 通路部



完成写真② 作業構台部



工事期間中は、片側交互通行規制や仮囲いの設置などで、ご通行の際には大変ご迷惑をおかけしました。この度無事故で工事完了を迎えることができ、皆様方のご理解とご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

※ ホームページで工事の状況等を配信しています。


<http://ntamamura.wix.com/daidogawakiryuu>

大津信楽線付替工事ニュース

平成 27年 4月 16日

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

- 平成 27年 3月 30日を持ちまして、工事を完成することができました。

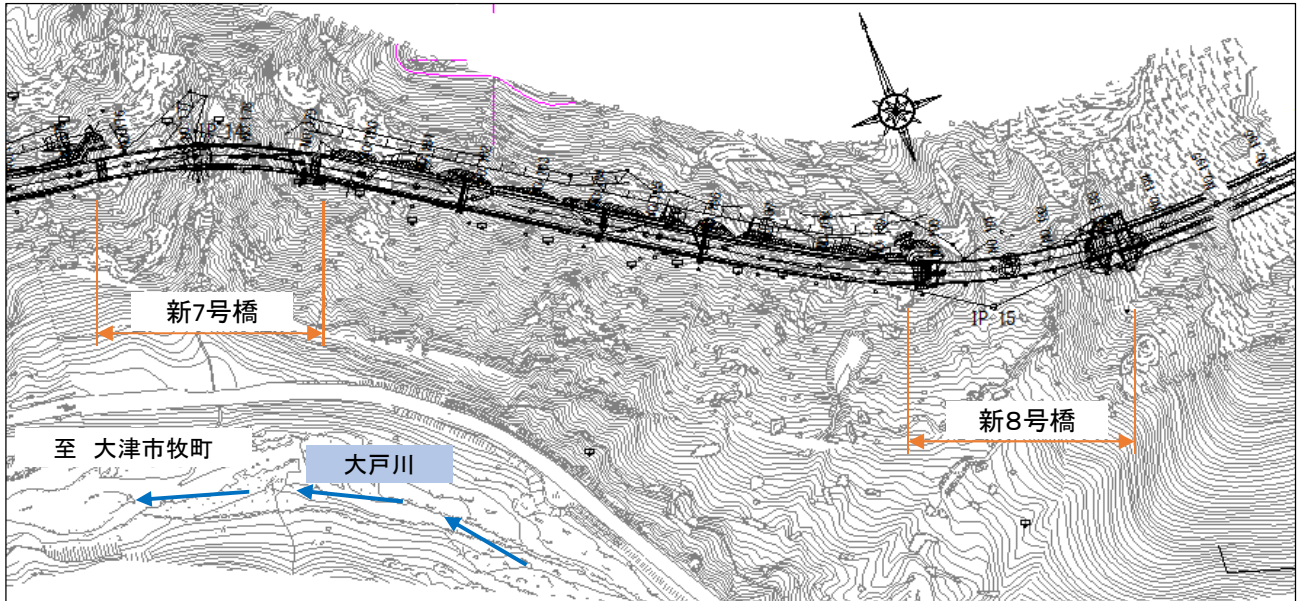

【新8号橋】 橋台が完成しました。



【新7号橋】 基礎施工作業台が完成しました。



大津信楽線付替工事ニュース


平成27年4月16日

工事名：大津信楽線落石対策工事

工期：平成26年10月23日～平成27年3月30日


工事概要：落石雪害防止工 ワイヤネット被覆工 97㎡、落石防止網工 ロープ伏 614㎡ ロープ掛 111㎡
落石防止柵工 542m、小割除去工 29m³、仮設工 落石防止柵工 88m モルレル工 1,657m

【施工位置図】

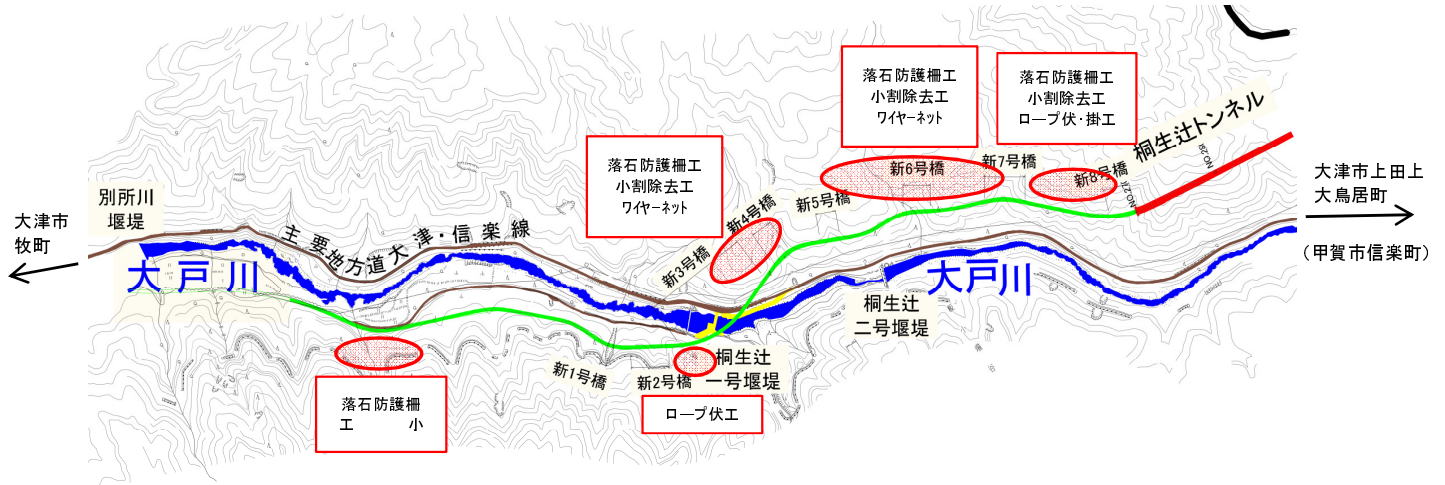

落石対策工 施工概要図

ロープ掛工 施工完了

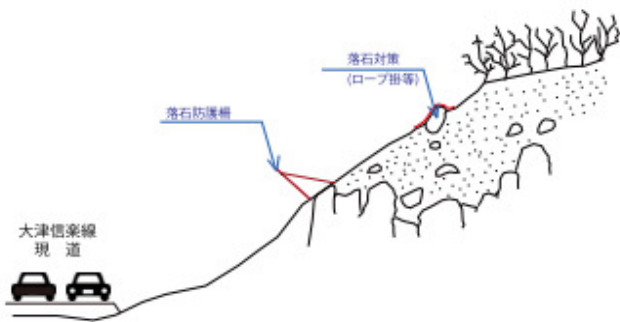

ワイヤネット被覆工 施工完了

落石防護柵工 施工完了



【工事説明】

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

上記写真は、当工事の落石対策の各工種(ロープ掛工・ワイヤネット被覆工・落石防護柵工)の施工完了状況写真です。

3月30日(月)を持ちまして、当工事は全て完了いたしました。

工事中は何かとご不便をお掛けいたしました。皆様のご理解・ご協力のもと、無事工事を完了できましたこと、お礼申し上げます。

施工者
会社住所
電話番号

イビデングリーンテック(株)関西支店
神戸市中央区脇浜町2-11-14
TEL 078-291-5585
