

＜大津信楽線付替工事ニュース＞

作成：2015/3/16


工事名：大津信楽線左岸部道路整備工事

＜工事状況＞


- ・工事用進入路部（市道）の排水工及び道路土工（盛土工）をしています。
- ・付替県道において、伐採材の搬出及び高盛土工の下部掘削と法面補強をしています。
- ・取付道路1の排水管設置と、盛土工を施工しています。

＜今後の予定＞

- ・高盛土工の法面補強後、盛土の基面に基盤排水層を施工します。
- ・4月より3号切土補強部の施工を始めます。

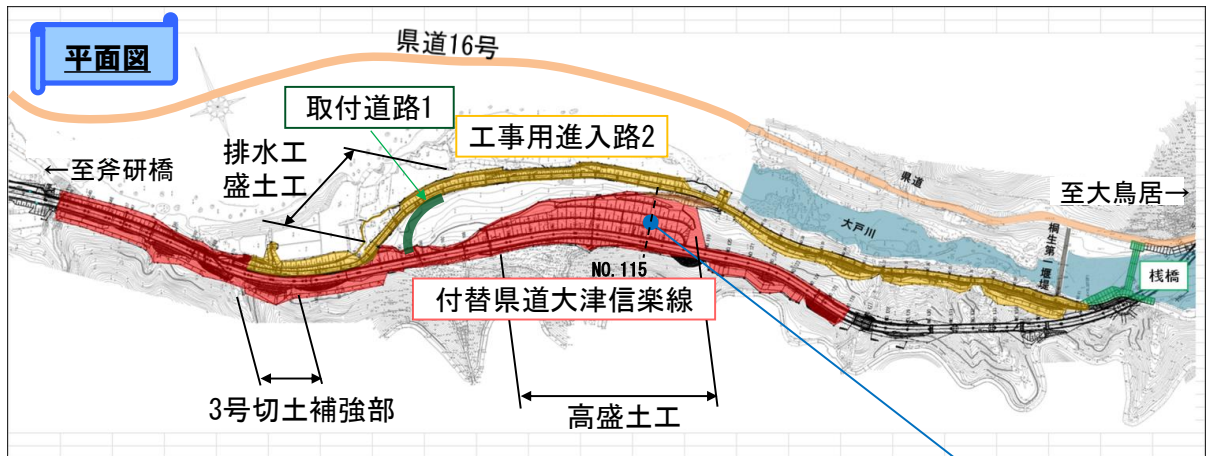

横断面図 (Cross-section Diagram)

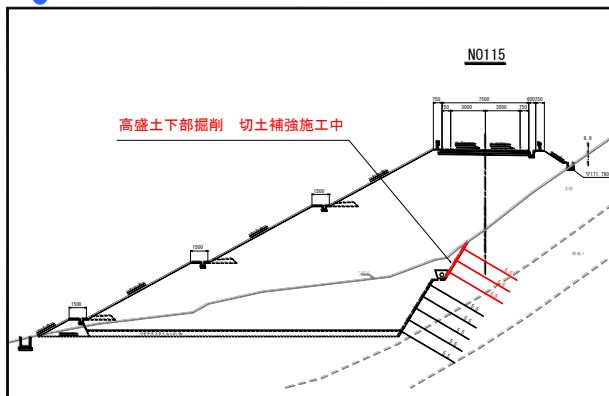

付替県道現況写真(3月14日)
(No.115付近)
※切土面に鉄筋を挿入し法面を補強します。



工程表 (Construction Schedule Table)

作業内容	3月			4月			5月			6月		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
工事用進入路2	[Progress bar]											
伐採工	[Progress bar]											
取付道路1	[Progress bar]											
高盛土工	[Progress bar]											

高盛土部 全体写真 (Overall Photo of Embankment Section)




奥村組
大津信楽道路工事所
〒520-2161
滋賀県大津市上田上桐生町地先
TEL 077-549-2032
FAX 077-549-2052

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年 3月 16日

工事名：桐生地区工事用進入路整備工事

【平面図】

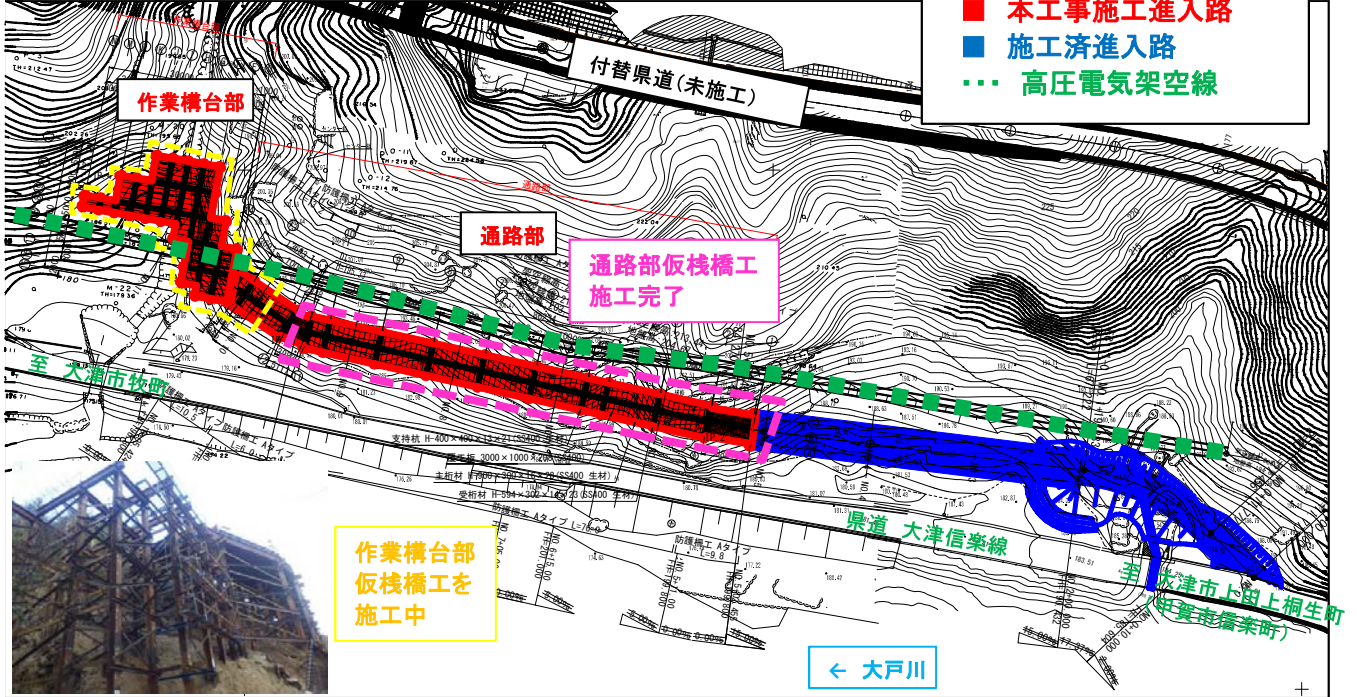

● 高圧電線下で作業の高さを調整しながら構台部仮栈橋工の組立作業を進めます。



高圧電気架空線の直下では、安全な作業高さは約3.5mです。このため架空線下はキャタクレーンを使用して鋼材を運搬し、仮栈橋工橋脚の架設作業を行っています。

● 3月5日、雲井小学校4年生のみなさんが現場見学に来られました。



現場の見学と水環境について学習する、『CESAプログラム』を実施しました。
開催日：H27.3.5
参加：雲井小学校4年生のみなさんと先生方

【工程表】

作業内容	平成26年						平成27年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工		計画・測量	伐採工						
落石雪害防止工 落石防止柵設置、撤去			移設						
仮橋・仮栈橋工 通路部									
作業構台部									
後片付け									
片側交互通行規制予定期間									

※ ホームページで工事の状況等を配信しています。
<http://ntamamura.wix.com/daidogawakiryuu>


施工者 株式会社 桑原組
現場事務所 住所 大津市上田上桐生町地先
TEL 077-549-2150
FAX 077-549-2165

大津信楽線付替工事ニュース

平成 27年 3月 16日

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

●現在 新7号橋では、P1橋脚部の軽量盛土工及び法面工が完了して作業足場、モノレールの解体作業を行っています。新8号橋では、A2橋台が完了し擁壁工事を行っています。

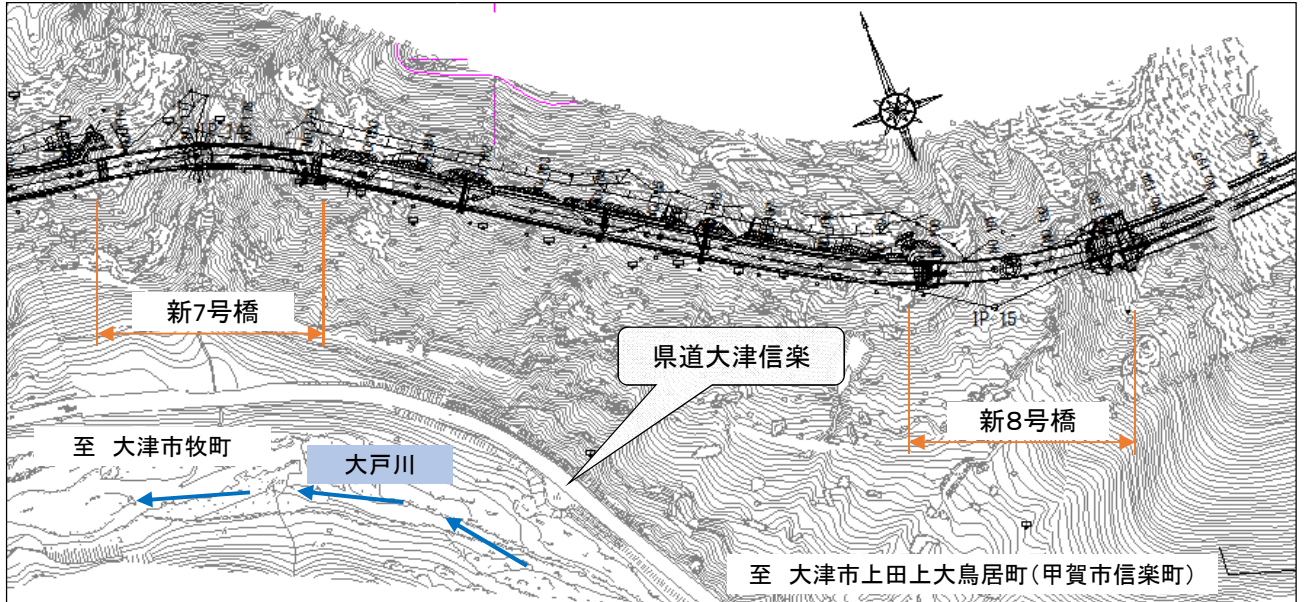

【新8号橋】



○2月23日より着手した擁壁工がほぼ完成しました。埋戻し及び道路部の法面整形を終えると完成です。

【新7号橋】



○法面工及び軽量盛土工が完了しました。
作業足場解体を終えると完成です。

【工程表】

工 種	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	■						
8号橋A2橋台		■	■	■	■	■	■
7号橋P1橋台			■	■	■	■	■
後方付け							■

請 負 者 名 株式会社 松浦組 住 所 大津市逢坂一丁目13-12

現場事務所 TEL 077-549-2207

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年3月16日

工事名: 大戸川ダム管内護岸補修工事

〈工事の進捗〉

- ・【7工区】: 3月7日(金)に河川内の仮設道路の撤去が終わり、舗装の準備を進めています。
- ・【2工区】: 3月10日(火)より法面の安定を図るためモルタル吹付を開始しました。

〈今後の予定〉

- ・【7工区】: 車道舗装が、3月20日(金)頃完成します。ガードレールの施工は、4月に予定しています。
- ・【2工区】: モルタル吹付後、法面部の補強のためアンカー(鉄筋)挿入を施工します。
モルタル吹付・アンカー挿入を各層(高さ毎)5回に分けて施工します。



【2工区(桐生地区)の作業状況】



法面にモルタルを吹付ています。
(上の写真)

法面部にアン
カー(鉄筋)
挿入
をしています。
(右の写真)




【7工区(大鳥居地区)の作業状況】



(左の写真)
護岸部分が
完成し、アス
ファルト舗装
の準備をして
います。

(2工区・計画断面)

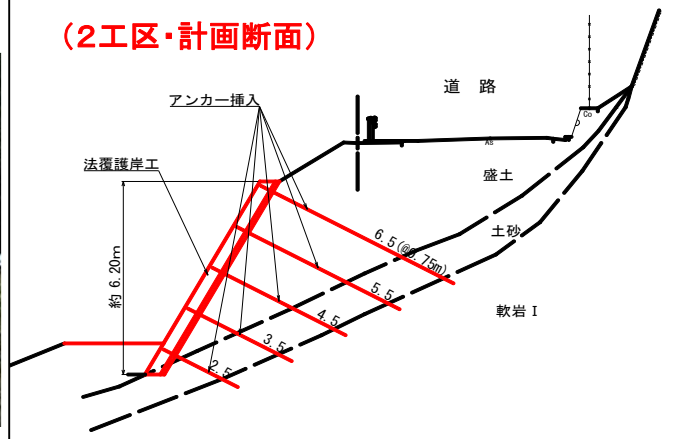

【工程表】

	3月	4月	5月	6月	7月	備考
(2工区)						
準備工						
仮設工						
法覆護岸工						
後片付け						
(7工区)						
仮設工						
擁壁工						
舗装工						

請負者: (株) 大同
現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)
TEL: 090-8932-7433

現場事務所: 滋賀県大津市上田上大鳥居地先
TEL: 077-549-2703
FAX: 077-549-2703

大津信楽線付替工事ニュース


平成27年3月16日

工事名：大津信楽線落石対策工事

工期：平成26年10月23日～平成27年3月30日

工事概要：落石雪害防止工 ワイヤネット被覆工 97㎡、落石防止網工 ロープ伏 614㎡ ロープ掛 111㎡
落石防止柵工 542m、小割除去工 29m³、仮設工 落石防止柵工 88m モノレール工 1,657m

【施工位置図】

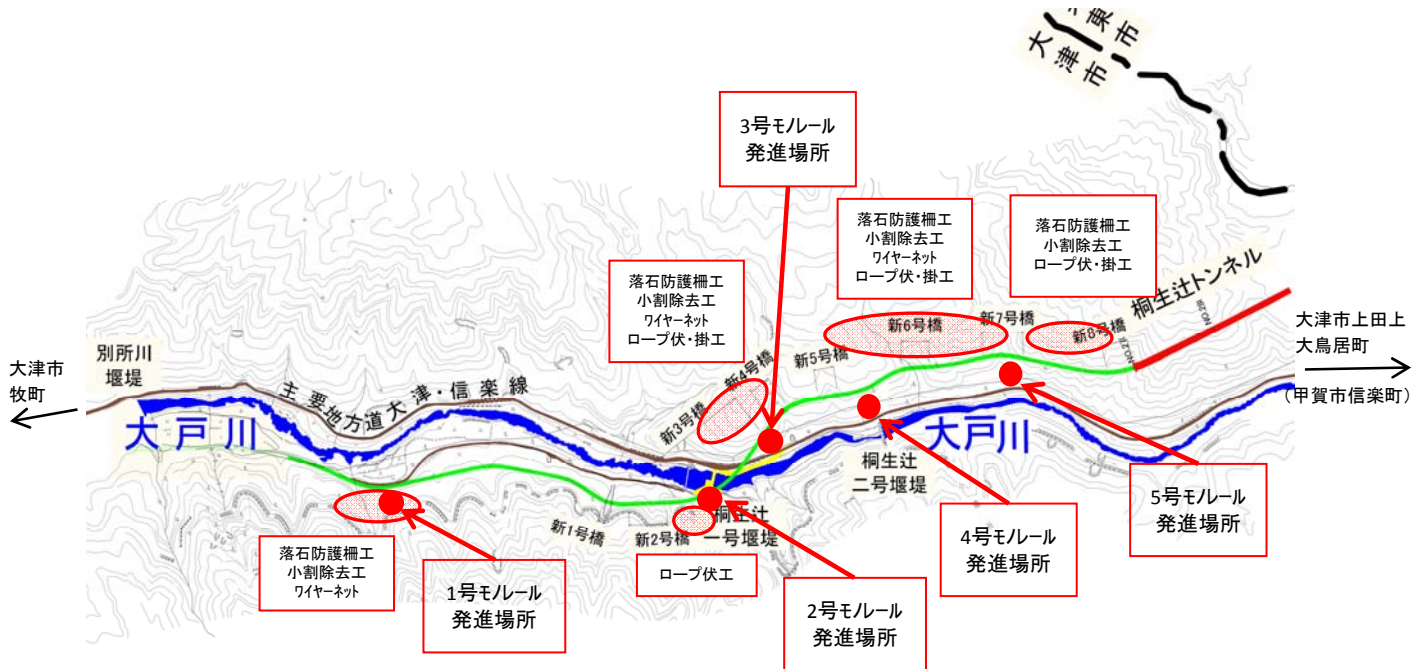

ワイヤネット被覆工 着工前

ワイヤネット設置完了

落石防護柵設置完了



【工事説明】

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

上記写真(ワイヤネット被覆工)は法面上に点在する落下の恐れのある転石をワイヤロープを巾着状に張付け固定し落石を防ぎます。

今後は仮設モノレールの撤去を行い、現場作業は完了となります。

工事中はご不便をお掛けすることがあると思いますが、何卒ご理解の上ご協力お願い致します。

【工程表】

作業内容	H26年			H27年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工		—	—			
根固め工				—	—	—
ロープ伏工				—	—	—
ロープ掛工				—	—	—
落石防護柵工				—	—	—
小割除去工				—	—	—
仮設工 落石防護柵工						—
モノレール工			—	—	—	—

— … 予定

施工者
現場事務所 住所
電話番号

イビデングリーンテック(株)関西支店
大津市上田上桐生町地先
TEL、FAX 077-549-0202

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年3月16日

工事名：大津信楽線新3号橋工事

【工事概要】

○橋梁上部工


- PC片持箱桁橋工 : 1式
- 橋梁付属物工 : 1式
- コンクリート橋足場等設置工 : 1式
- 仮設工 : 1式

○橋梁下部工


- 道路土工 : 1式
- RC橋脚工 : 1式
- 擁壁工 : 1式
- 構造物撤去工 : 1式
- 仮設工 : 1式

【工期】 平成26年12月25日～平成28年10月31日

【平面図】

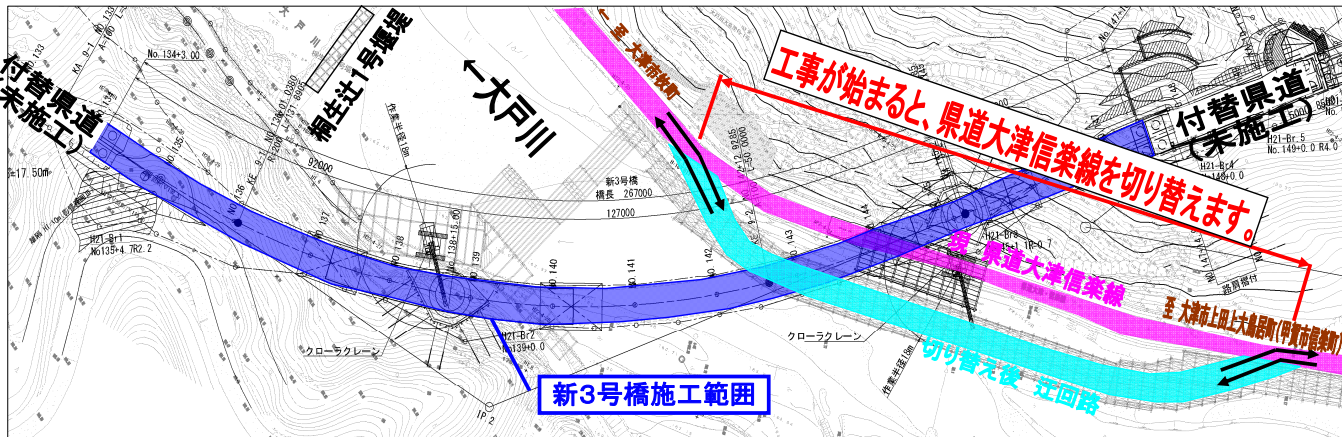

【側面図】

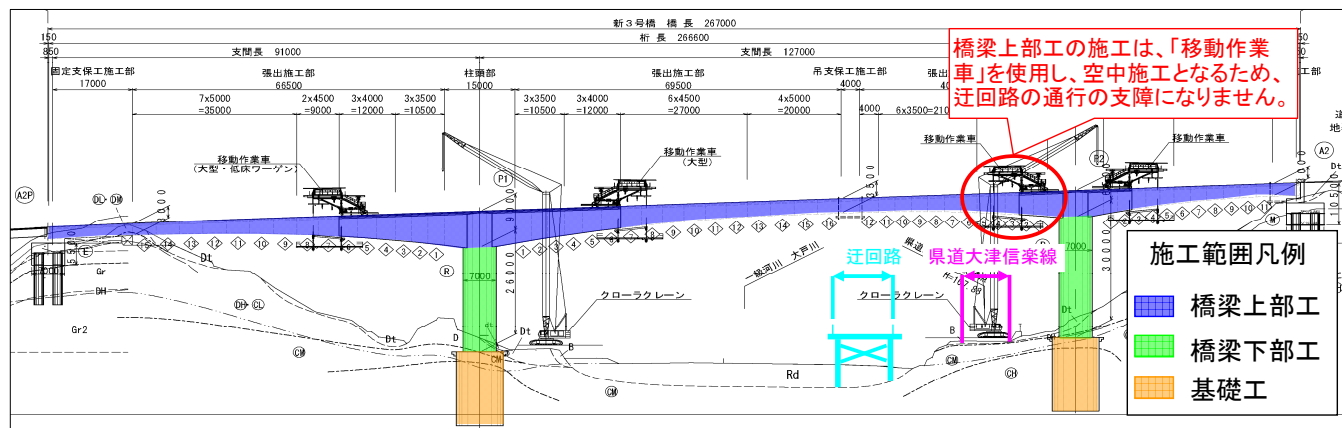

【完成イメージ】



【工程表】

作業内容	平成27年												平成28年									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
準備工	■	■																				
橋梁上部工														■	■	■	■	■	■	■	■	■
橋梁下部工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
後片付け工																						■
その他	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 仮設構台杭打込み4月初旬予定 ◆ 県道切替え4月中旬予定 																					

施工者 : 川田建設株式会社
 現場事務所 : 大津市上田上桐生町地先(予定)
 TEL : 080-5986-6203
