


大津信楽線付替工事ニュース

平成30年12月18日



ハッシュタグは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ


工事名：大津信楽線新6号橋上部工工事
工期：平成30年1月26日～平成31年3月29日
(付替県道新6号橋の橋梁を施工します。)

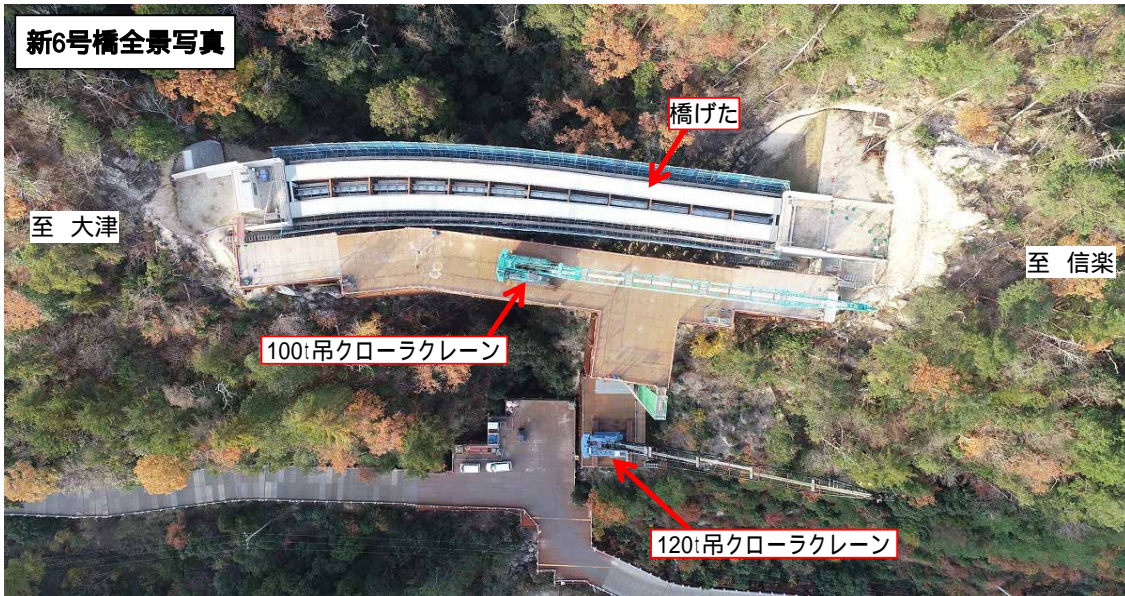

10月末から始まった橋げたの架設作業が11月いっぱいでも完了しました。
今月より床版作業が始まります。まずは年明けの床版コンクリート打設へ向け、型枠・鉄筋の組立を進めていきます。



現場状況(型枠組立)の全景写真

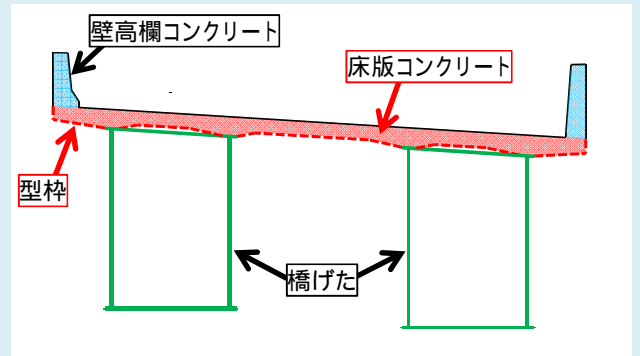

橋梁の断面図

KH 株式会社 駒井ハルテック

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生地先
【電話】0775-49-2633
【FAX】0775-49-2635

※現場の進捗動画を当社のHPにて公開しております!!

<http://www.komaihaltec.co.jp/bridge/result/result2.html>

安全第一



大津信楽線付替工事ニュース

平成30年12月18日



バックバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事

工期：平成30年3月29日～平成31年3月29日

(大戸川左岸側にプレキャスト製品のアーチカルバートを設置、道路下(擁壁部分)の地盤改良を行います。)



工事進捗と今後の予定

○工事進捗状況

先月から続く作業の地盤改良工及び擁壁工の掘削が一旦終了します。現場から土砂を搬出するために10tダンプトラックが1日平均30台が往復しました。

12月初旬からアーチカルバートの掘削が始まりました。仮橋の下にバックホウが入って掘削を行います。

○今後の予定

地盤改良工がスタートします。



↑ 山側掘削完了

↓ 橋下掘削開始




大津信楽線付替工事ニュース

平成30年12月18日



バックパ-は
QRコードを読み
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線工事用進入路設置その他工事
工 期：平成30年3月29日～平成31年3月29日

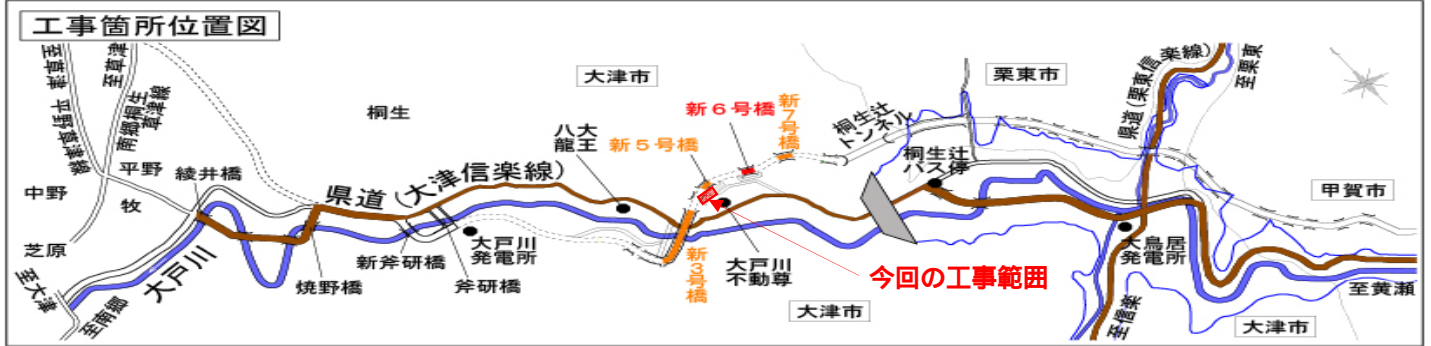

今回の工事について

新4号橋工事の施工の為、既設仮栈橋を延長します。

現在の施工状況




70t級クローラークレーンとダウンザホールハンマー、回転テーブルを使用して仮橋の支持杭の掘削を行っています。

現在の施工箇所

11月よりクローラークレーン、ダウンザホールハンマー等の施工機械を搬入し、仮橋の施工を開始しています。

『無事故の歳末、明るい正月』を目標に作業員一同、安全を最優先に施工を進めてまいります。

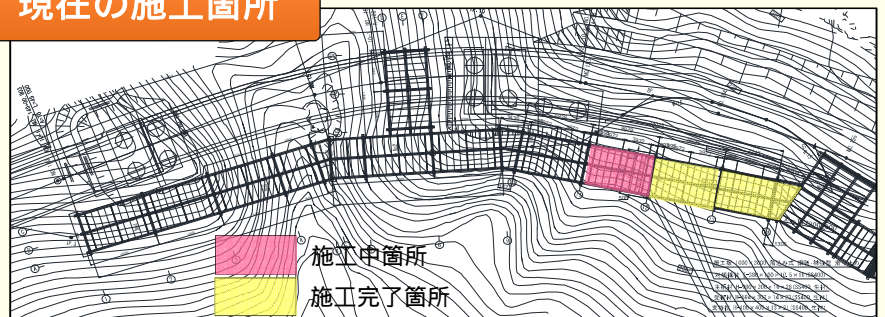

伐採の際に作成した薪、ほだ木は希望された方に引き取っていただきました。ご協力ありがとうございました。



大津信楽線付替工事ニュース

平成30年12月18日




バックパ-は
QRコードを読み
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：工事用迂回路撤去工事

工 期：平成30年11月6日～平成31年3月29日

12月

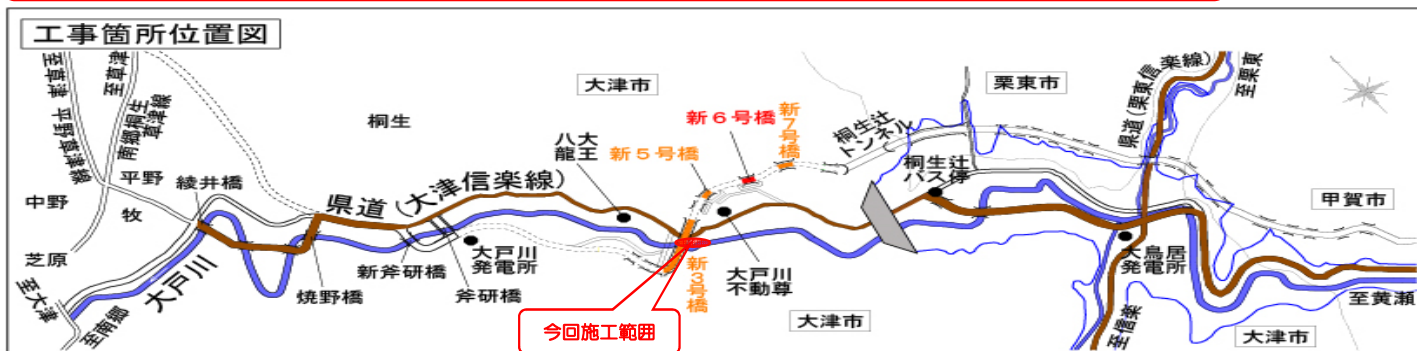

工事用迂回路撤去工事の施工を行うことになりました(株)金子工務店です。今回の工事は、県道大津信楽線の道路復旧を行い、道路を切替えて、大戸川上流部より仮橋（迂回路）の撤去を施工する工事になります。

県道大津信楽線の道路復旧は交通誘導員を配置し、一部屋間片側交互通行による道路規制にて施工を行います。安全には十分な配慮をして施工を行いますので、地域の皆様、ご通行される皆様のご協力をお願い致します。

【現在の進捗状況】

- ・工事着手に向け準備、現況測量を行っています。

【今後の予定】

- ・12月中旬より、県道大津信楽線の道路復旧を行います。※規制形態：一部屋間片側交互通行
- ・道路切替後、仮橋（迂回路）上の構造物撤去を行います。



現場代理人：上田 公博
監理技術者：中川 義之
現場事務所：大津市上田上桐生辻地先
事務所TEL：077-549-1427
