

大津信楽線付替工事ニュース

平成31年02月18日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線**新6号橋**上部工工事

当初工期：平成30年1月26日～平成31年1月31日

変更工期：～平成31年3月29日

(付替県道新6号橋の橋梁を施工します。)




新6号橋全景写真




2月5日に壁高欄コンクリートを施工し、残すは伸縮装置の設置、足場解体、クレーン解体が
主な作業となります。

無事故無災害で来月の工事竣工を迎えるため、作業員一同、気を引き締めて頑張ります。



壁高欄断面図

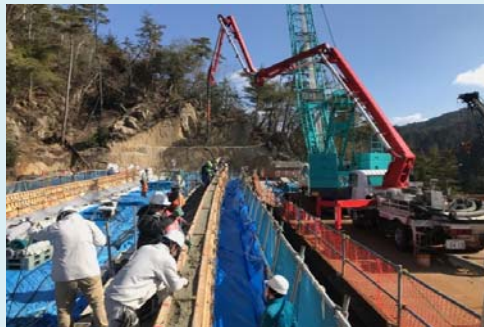

壁高欄コンクリート打ち込み状況



壁高欄コンクリート打ち込み完了

KH 株式会社 駒井ハルテック

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生地先
【電話】0775-49-2633
【FAX】0775-49-2635

※現場の進捗動画を当社のHPにて公開しております！！

<http://www.komaihaltec.co.jp/bridge/result/result2.html>

安全第一



大津信楽線付替工事ニュース

平成31年02月18日



パソコンはQRコードを読み込み大戸川が工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事

当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期：～平成31年5月31日

(大戸川左岸側にプレキャスト製品のアーチカルバートを設置、道路下(擁壁部分)の地盤改良を行います。)



工事進捗と今後の予定

○工事進捗状況

1月末でスラリー攪拌改良杭404本の打設が終了し地盤改良工が完了しました。

仮橋下では左岸側のアーチカルバート基礎のコンクリート打設作業が完了しました。

○今後の予定

梅谷右岸側のアーチカルバート基礎の掘削作業が始まります。2月末までに掘削の完了が目標です。



↑地盤改良工 施工状況

雪の日でも頑張ります。!!

左岸アーチカルバート基礎→完了



【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

【FAX】 077-549-0075

大津信楽線付替工事ニュース

平成31年02月18日




パソコンはQRコードを読み込み大戸川が工事事務所HPへ

工事名：工事用迂回路撤去工事

工期：平成30年11月6日～平成31年3月29日

2月

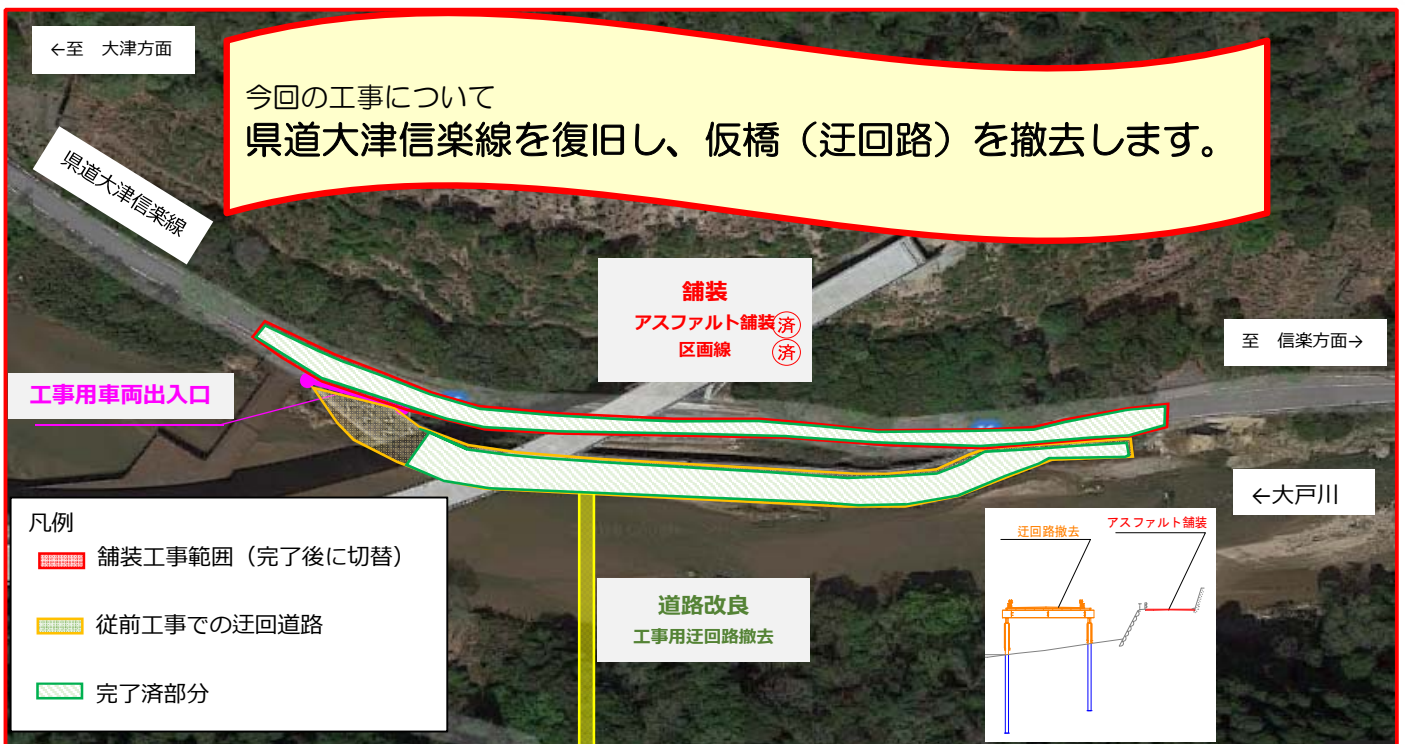

工事進捗状況

1月中旬より仮橋の撤去を開始しております。天候にも恵まれ、順調に撤去作業を進めてこられました。

撤去作業は、繰返し作業であり、ヒューマンエラーが起りやすくなるので、日々作業工程を確認し、安全第一で施工を進めてまいります。

今後の予定

引き続き、仮橋の撤去を行います。仮橋撤去完了後は、県道16号のガードレール復旧を行います。

仮橋撤去開始！



12月末時点



1月末時点



大津信楽線付替工事ニュース

平成31年02月18日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～平成31年11月30日

2月



工事箇所写真



大津信楽線桐生地区道路改良その他工事の施工状況は工事範囲の現状調査をしております。

施工区間大岩 →

【現在の進捗】

- ・工事を行う為の現地調査を行ってます。

【今後の予定】

- ・3月初旬より伐採作業をおこなう予定です。
- ・伐採木は希望者に配布する予定です。



近くで見ると、迫力ある大岩だなあ...



株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-3911
【FAX】 077-549-3911

