

# 大津信楽線付替工事ニュース

令和2年2月18日



パケットは  
QRコードを読み込  
み大戸川が工  
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事  
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日  
変更工期：～令和 2年3月20日



## 工事進捗

## 現場代理人から一言



1月はアーチカルバートを埋戻して道路高さを上げました。  
当工事では高さ10.6mまで盛土し、次回工事に引き継ぎます。  
完成までもう少しですが、転倒・転落災害が無いように注意します。

当工事も残すところ2か月となり、新しくできる大津信楽線の形も見えてきました。  
安全に少しでも早く工事が完了できるように頑張ります！！

現場代理人  
森田 圭一



# 大津信楽線付替工事ニュース

令和2年 2月18日




バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

2月

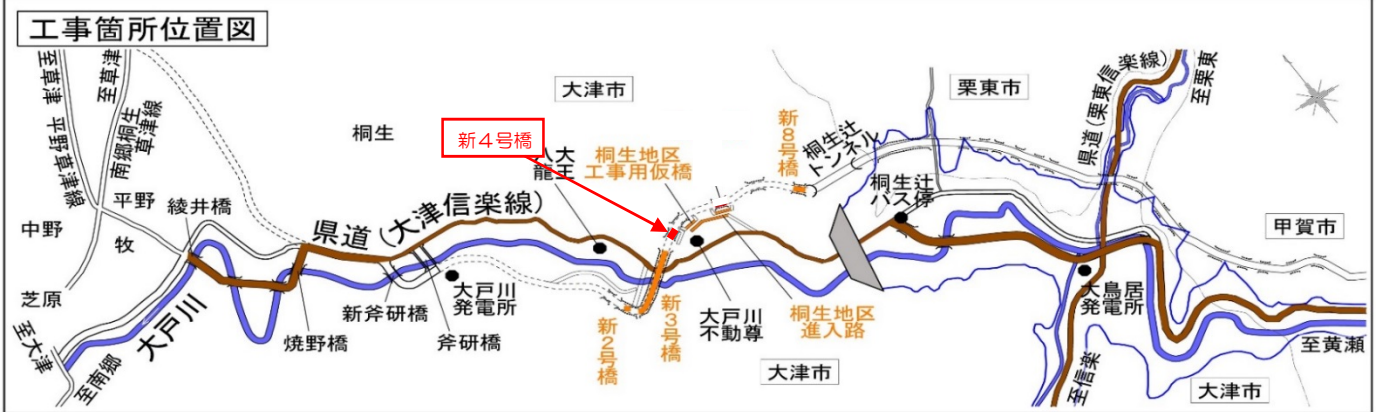

## 現場位置図




【工事の進捗】 A1橋台側は擁壁工を施工しています。A2橋台は深礎工を施工しています。

## A1橋台 橋台工 完了

## 作業状況

転石が発現しなかったため、施工は順調に進み予定より早く橋台コンクリートの打設が完了しました。コンクリートは4回に分けて打設しました。

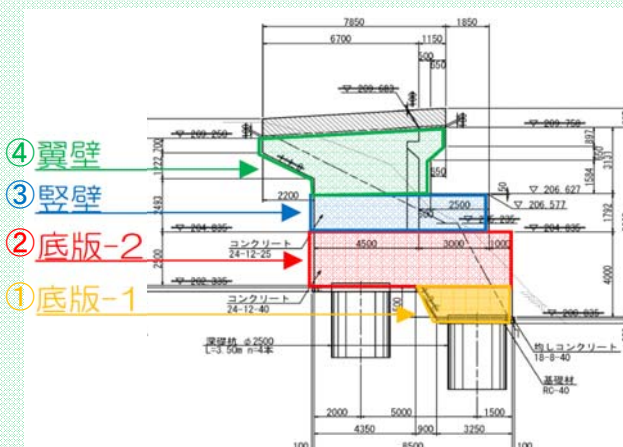

## 現場代理人のコメント

A2橋台は転石（硬岩）の発現より工程が遅れていますが、負けずに精一杯頑張っていきます。引続き、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。



請負者：西村建設株式会社  
現場代理人：森本 順  
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先  
事務所TEL：077-549-0100





# 大津信楽線付替工事ニュース

令和2年2月18日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事  
工期：令和元年8月31日～令和2年3月10日

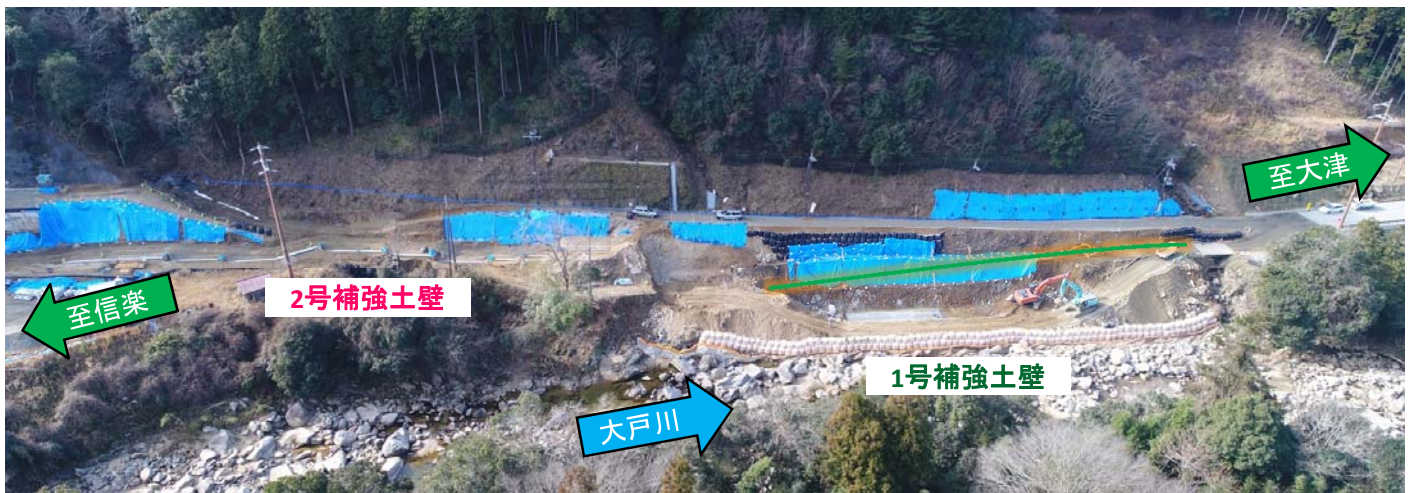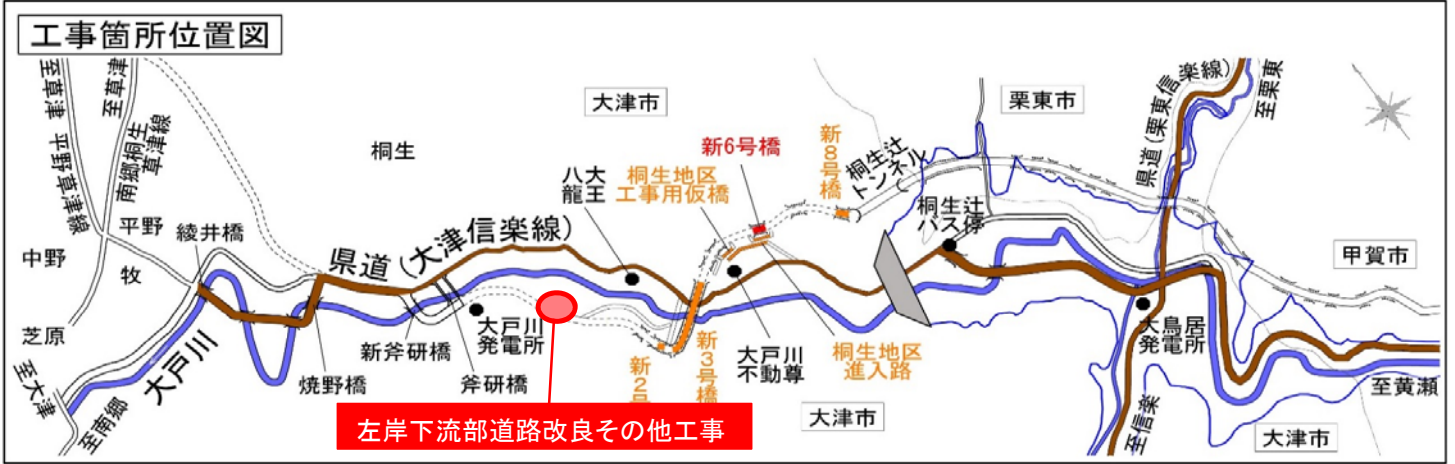

【現在の作業】2号補強土壁：壁面材設置と盛土を施工しています。 1号補強土壁：基礎フーチング型枠組立と岩盤破碎。  
【今後の予定】2号補強土壁：2月下旬に壁面材設置を完成させて、2月下旬より笠石コンクリートを施工します。  
1号補強土壁：2月下旬に基礎フーチング完成させて、2月下旬より壁面材を設置します。

## 1号・2号補強土壁の施工状況

## 現場代理人のコメント



2号補強土壁は順調に積上がって進んでいますが、1号補強土壁では岩盤が発現して破碎に日々奮闘中。焦らず作業員さんの健康面にも気を配り安全第一で頑張ります。

現場代理人  
米田 剛



Onyama (株) 大山建設

現場事務所  
電話  
FAX


大津市上田上牧町地先  
077-549-2587  
077-549-2588

# 大津信楽線付替工事ニュース 令和2年2月18日



バックバーはQRコードを読み込み大戸川が工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事  
 工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

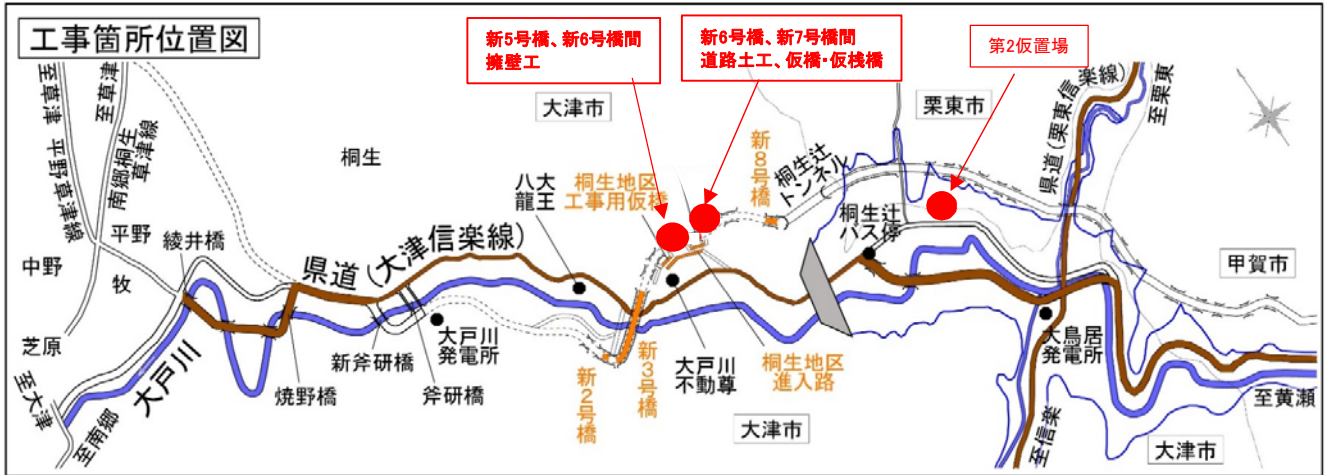

## 工事進捗

構台上に重機を上げ本線上の掘削を開始。掘削土をクレーンを使って下に降ろし仮置場まで運搬しています。



## 今後予定


2月中には掘削が完了し、仮橋を施工する準備に入ります。

## 監理技術者より一言

2月は現場から大型ダンプで掘削土を信楽方面の仮置場まで搬出します。ダンプの往来が増えますが、一般車両最優先で運行管理を行いますので今後とも工事へのご理解、ご協力をお願い致します。

監理技術者 秋村 智詩

# 松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先  
 【電話】 077-549-1070  
 【FAX】 077-549-1075

# 大津信楽線付替工事ニュース



令和2年2月18日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事  
工期：令和元年11月26日～令和2年10月31日

2月

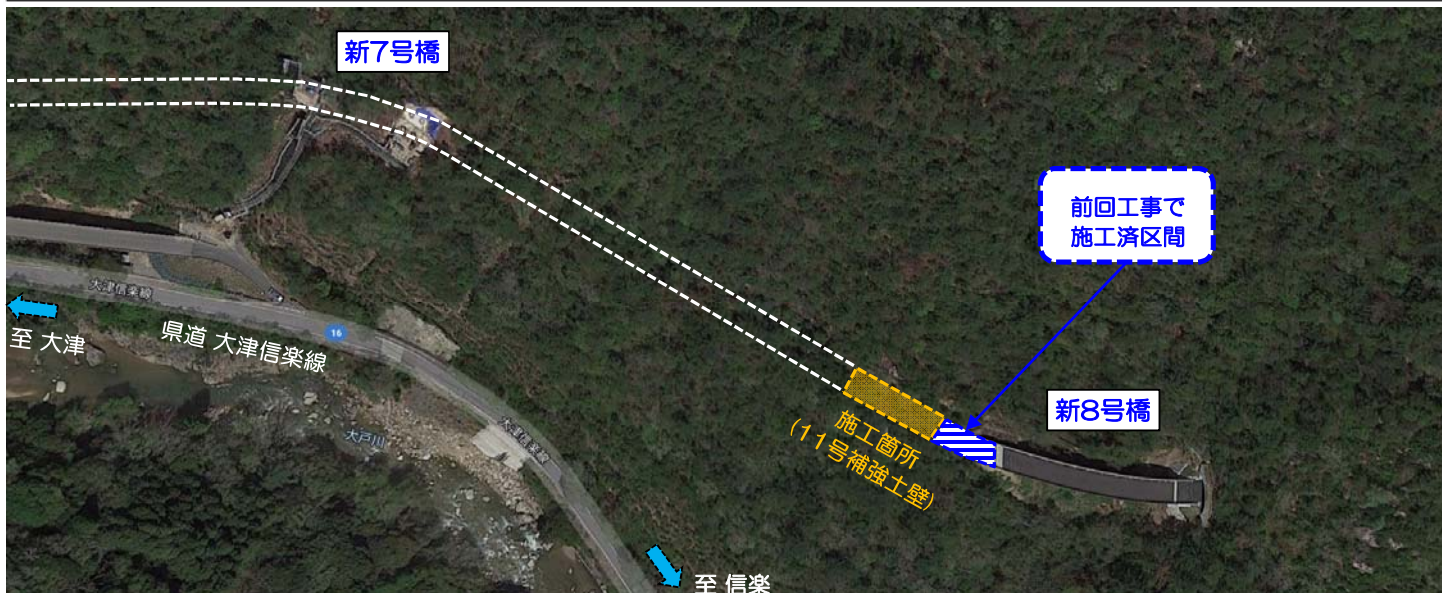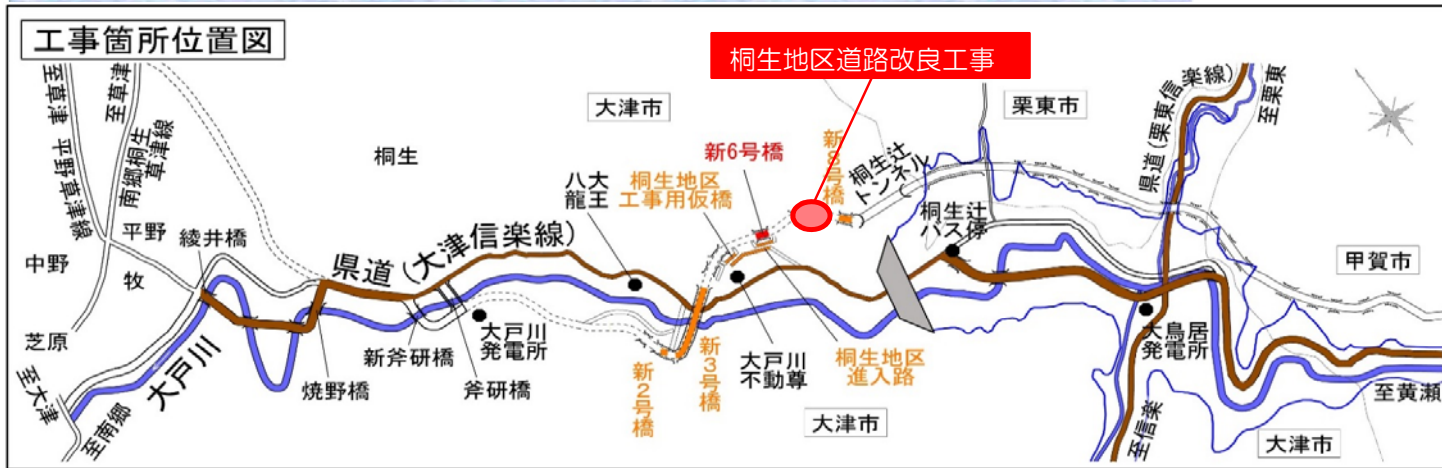

## 現在の状況

伐採完了



伐採完了



## 現場代理人コメント

準備工（伐採工）も完了し、2月よりいよいよ本工事に取り掛かります。  
世間ではコロナウイルス感染症が話題となっておりますが、私共も健康には気を付け作業に取り組んでまいります。

現在の作業：伐採完了後の事前測量結果から設計照査を実施中。  
今後の予定：2月中旬より法面清掃を実施し、完了後に仮設足場を設置いたします。  
仮設足場設置後は11号補強土壁工へと進んでまいります。



八田建設株式会社

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-3200  
077-549-3206
