

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年3月18日



パケットはQRコードを読み込み大戸川が工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日
変更工期：～令和 2年3月20日



着工前 2018年4月撮影



完成 2020年3月撮影



↑補強土壁を設置することで梅谷を渡河できるようになりました。


↓アーチカルバート設置完了。



完成御礼

左岸部道路改良その他工事が無事完了しました。
工事期間中は、工事へのご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。

現場代理人
森田 圭一



大津信楽線付替工事ニュース

令和2年 3月18日




パッケンパーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事
 当初工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日
 変更工期：（変更～令和2年4月27日）

3月

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

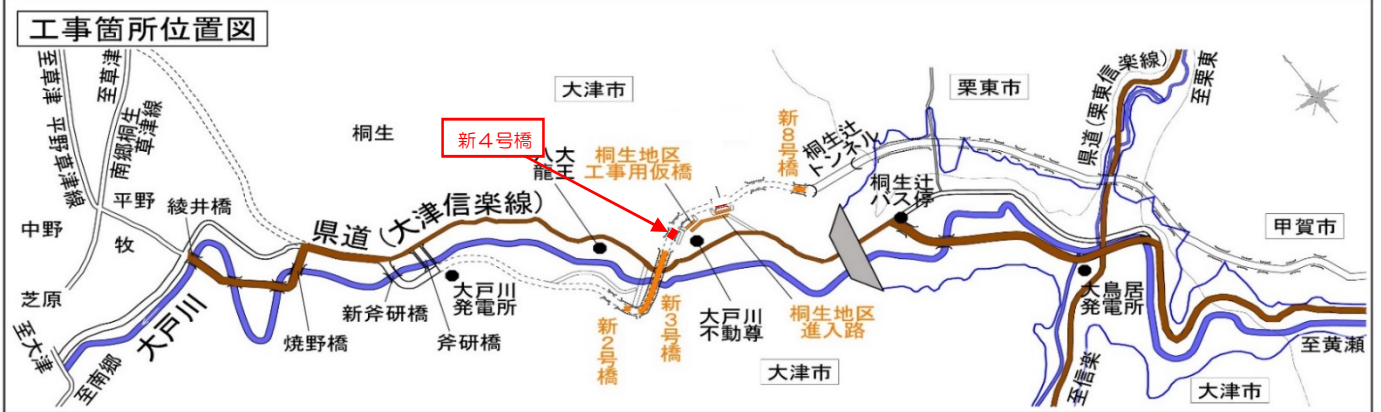

現場位置図



【工事の進捗】 A1橋台側は擁壁工が施工完了しました。A2橋台は底版を施工しています。

A2橋台 深礎工 完了

作業状況

外径φ2500、深さ4.5m～5.0mの深礎杭の掘削や鉄筋組立、コンクリートの打設が完了しました。

①ライナープレート部 掘削



②ライナープレート設置（土留）



計画位置とズレないように慎重に！

③モルタル吹付部 掘削



軟岩を人力にて円形に掘り下げます

④モルタル吹付（土留）



⑤索掘り部 掘削



特殊なアタッチメントで深く掘り下げます

⑥深礎杭鉄筋組立



⑦深礎コンクリート打設



⑧深礎杭 完了



黄色チューブで鉄筋の防錆処置を行っています

現場代理人のコメント

A2橋台は転石（硬岩）の発現により工程が遅れていますが、負けずに精一杯頑張っています。引き続き、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。



請負者：西村建設㈱
 現場代理人：森本 順
 携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
 事務所TEL：077-549-0100



大津信楽線付替工事ニュース

令和2年3月18日




バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ



工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事
工期：令和元年8月31日～令和2年3月31日

工事箇所位置図

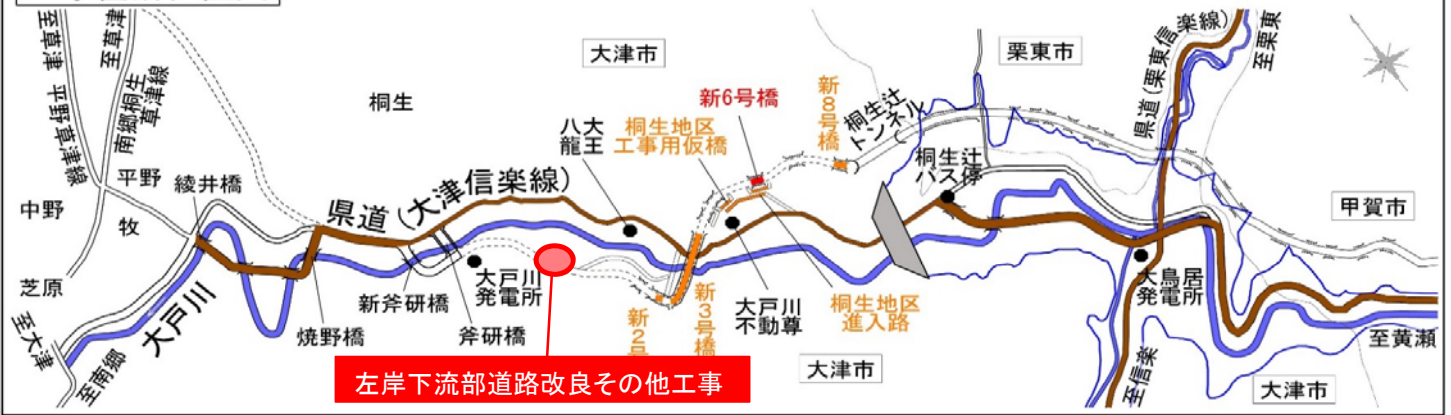

左岸下流部道路改良その他工事



【現在の作業】2号補強土壁—笠石コンクリート施工中。1号補強土壁—3月16日より補強土壁を設置、20日～瀬替えを撤去します。
【今後の予定】2号補強土壁—擁壁・側溝関係を施工し、3月末に完成です。1号補強土壁—最後に瀬替えを撤去し完成します。

工事用道路の施工状況



現場代理人のコメント

1号補強土壁の岩盤が先月末に
やっと破碎できました。
遅れた分、作業員さんを増員して
いただき施工しています。
最後まで気を抜かず一致団結、
安全第一で頑張ります。

現場代理人
米田 剛



Onyama (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上牧町地先
077-549-2587
077-549-2588

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年3月18日



パソコンはQRコードを読み込み大戸川が工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事
工期：令和元年9月19日～令和2年11月30日

3月

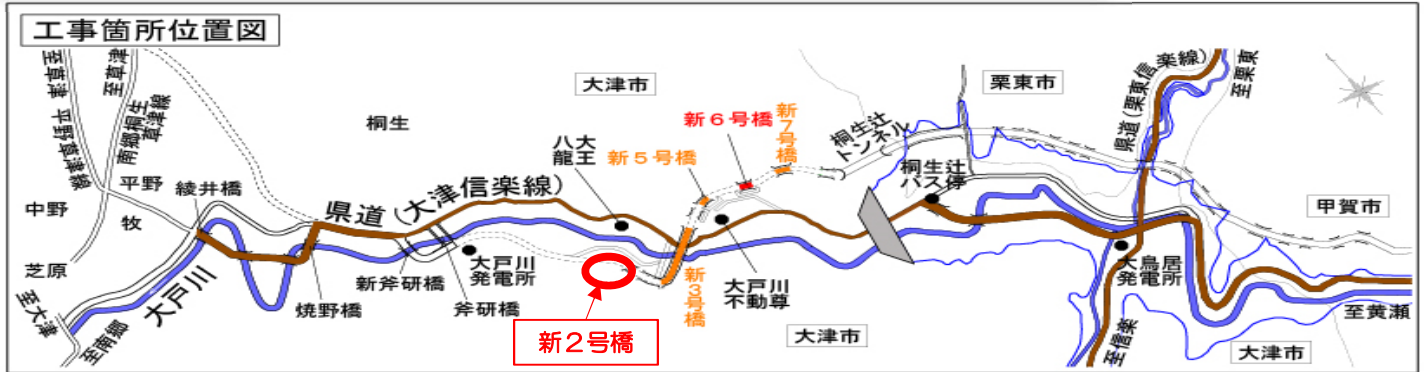

工事進捗

監理技術者「から一言」

新2号橋施工箇所



擁壁工施工箇所



いよいよ3/5より工事を着手しました。11月末まで安全第一で頑張りますので、よろしくお願いいたします。

監理技術者
野田 泰雄



現在の作業：新2号橋までの工事用道路（仮設道路）の造成に着手しました。
今後の予定：工事用道路完成後、新2号橋下部工の掘削を行います。



株式会社 内田組



【現場事務所】 大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-3356
【FAX】 077-549-3356

大津信楽線付替工事ニュース 令和2年3月18日



バックバーは
QRコードを読み込
み大戸川が△工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

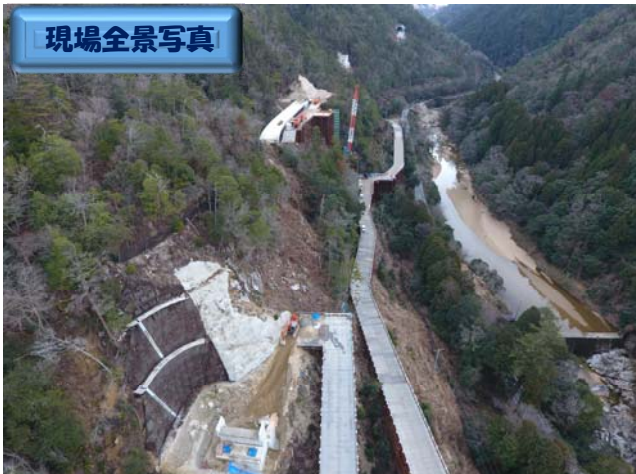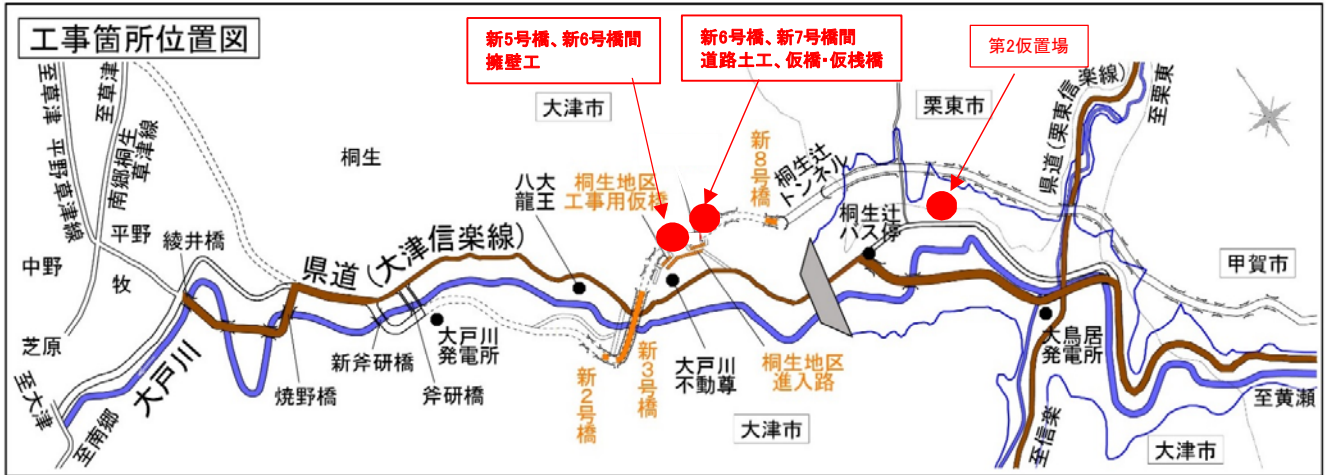

現場全景写真

現場全体をドローンで撮影しました。



工事写真


ここに仮橋橋がさま

反対側へ行くための掘削が完了しました。



工事苦勞写真

仮橋橋上は周りより冷えているので雪が積もり、除雪しながらの作業です。

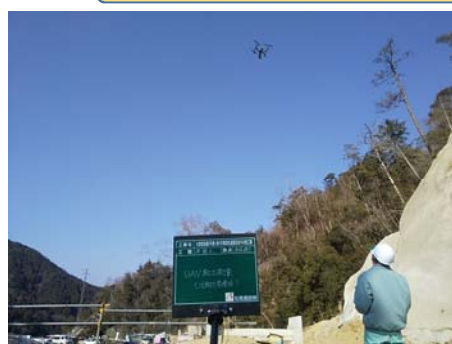


ドローンを飛ばして測量をしています。今回で2回目、地形が急峻なので飛ばす回数が増えます。...

今後予定

70tローラーを搬入し仮橋の工事をを行います。鋼材の搬入が多くなりますが、一般車両最優先で運行管理を行いますのでご理解、ご協力をお願い致します

松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-1070
【FAX】 077-549-1075
監理技術者 秋村 智詩

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年3月18日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事
工期：令和元年11月26日～令和2年10月31日

3月

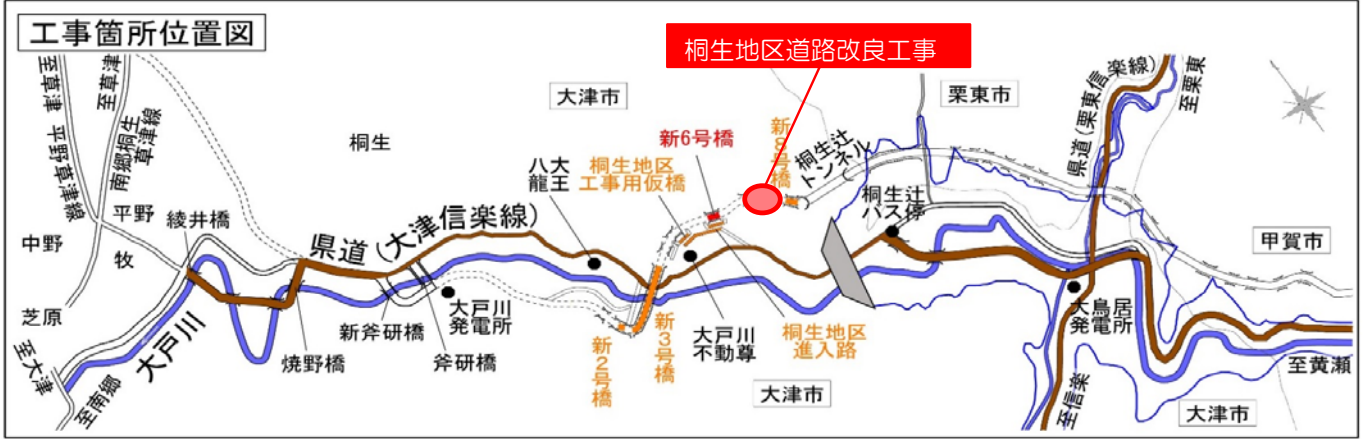

現在の状況

床掘状況



床掘状況



現在の作業：3月初めより擁壁基礎の床掘作業中です。
今後の予定：基礎工完了後、3月中旬より仮設足場の組み換えを行い、
仮設足場設置後は11号補強土壁工へと進めてまいります。

現場代理人コメント

現在、掘削時に想定した岩の
破砕が少なく、順調に施工が進
んでおります。

今後、材料搬入車両の増加が
予想されます。一般車両優先を
徹底致しますので、ご理解・ご
協力をお願い致します。

現場代理人
伊藤 雅記



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-3200
077-549-3206
