

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年6月16日




バッカバ-は
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事

工期：令和元年9月19日～令和2年11月30日

【付替県道 新2号橋の橋台を1基と、補強土壁を施工します。】

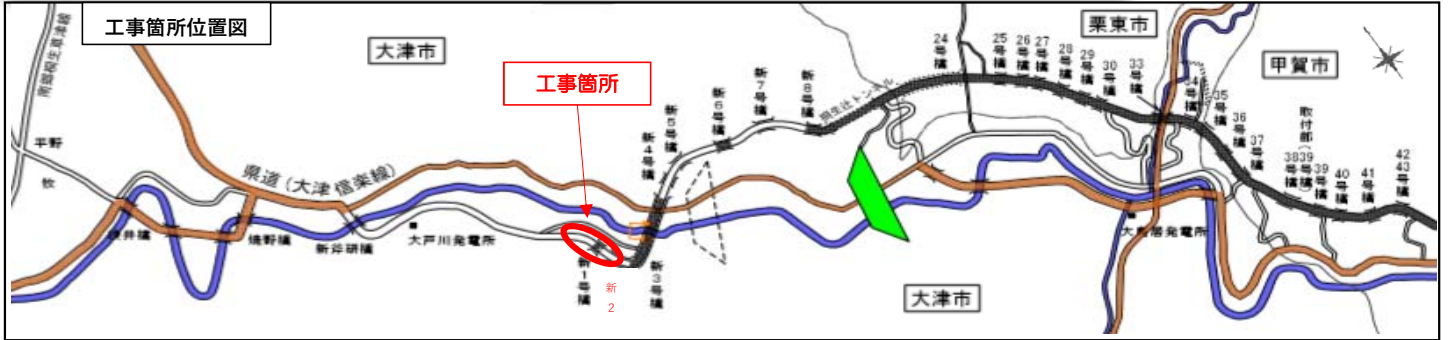


工事進捗

橋台の深礎杭、上段の2本が完成しました。

さあ下段の杭は順調に掘れるか転石の出現が心配ですが、はりきって頑張ります。

下段2本 = 6月~7月

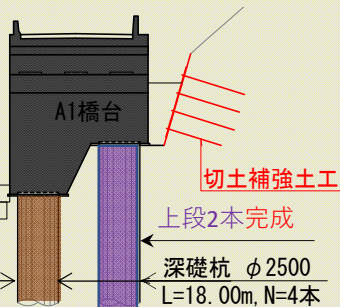

A1橋台 施工状況 信楽方面より撮影



今後の予定

深礎杭も継続しての施工と他工種の作業も増えてくるため工事車両が増加します。また、発破作業での一時通行止めで一般通行の皆様にはご不便をおかけしますがご協力のほどお願いいたします。

安全第一

集中注意にお願いします！



株式会社 内田組

【現場事務所】 大津市上田上桐生町地先

【電話】 077-549-3356

【FAX】 077-549-3356




工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

当初工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日（変更：令和2年8月31日）

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁、補強土壁（追加工事）を施工します。】

6月

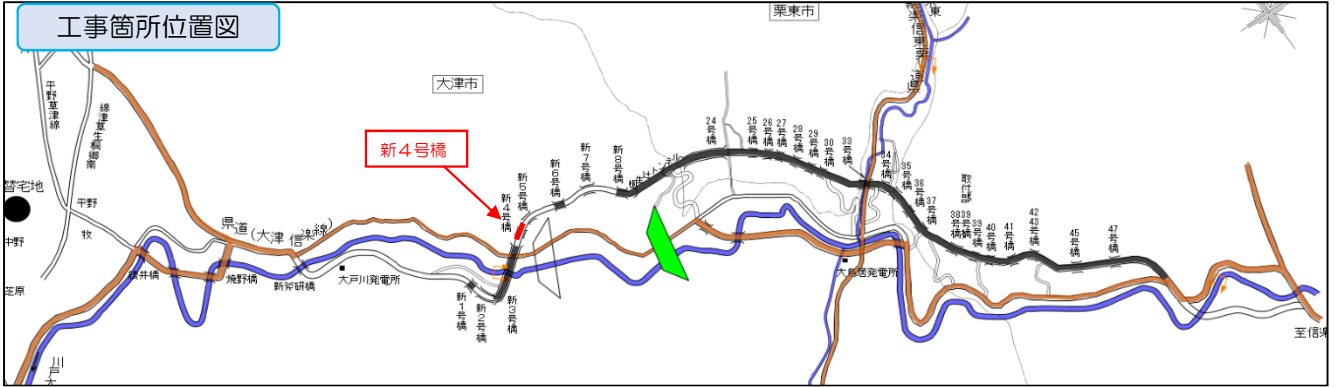

工事箇所位置図

現場位置図




【工事の進捗】 補強土壁（追加工事）の設計が終わり、施工を開始しています。


6号補強土壁（CAB-WALL工法） 施工方法説明

6号補強土壁工は地山補強土壁（CAB-C）と盛土補強土壁（CAB-B）を一体的な構造物とする切土・盛土複合補強土壁工法（CAB-WALL工法）です。改変範囲の縮小や掘削量が軽減できる工法であるため、急峻で転石が点在する当現場においては、最も有効な工法となります。

6号補強土壁工（CABWALL工法）

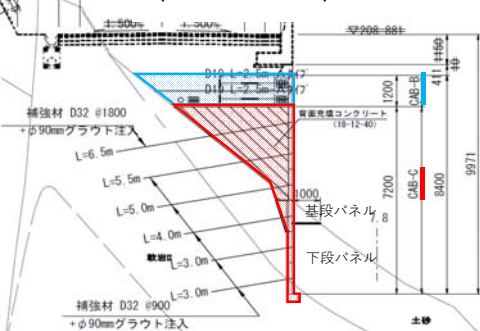

CAB-C工法...基段パネルを施工し、逆巻にて下段のパネルを施工していきます。掘削量が軽減でき、土砂崩壊の危険性が低く安全に施工できます。

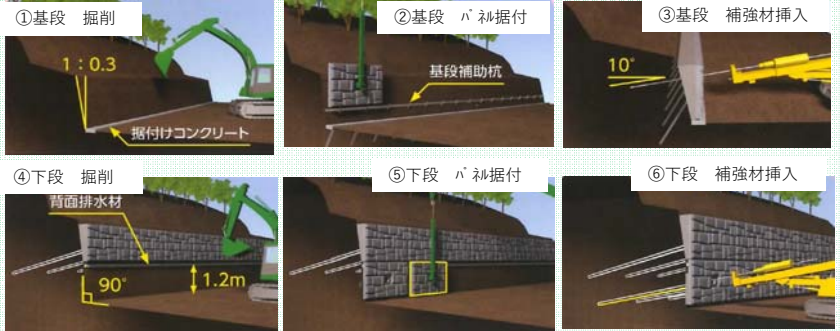

現場代理人のコメント

当初計画の構造物は完了、追加工事の補強土壁の施工を開始しています。新型コロナウイルス感染も落ち着いてきましたが、気を抜かず感染対策を講じて、施工への影響が無いよう頑張ります。引き続き、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。



請負者：西村建設(株)
現場代理人：森本 順
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0100

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年6月16日



パツナバーは
QRコードを読み
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事

当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日
(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

6月

工事箇所位置図



ブロック積み状況



掘削状況



転石破碎状況



本格着工より1ヶ月がたちましたが、転石がたくさん出ています。
転石の処理をしながら頑張って工事を進めたいと思います。

現場代理人コメント

コロナウイルス対策をしながらの施工となり、工事とは別の意味で苦労しているところもありますが、現場作業員一丸となって乗り越えていくよう頑張ります。

現場代理人
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地先

【電話】 077-549-0075

【FAX】 077-549-0075

大津信楽線付替工事ニュース



令和2年6月16日



バックパ-は
QRコードを讀込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事
工期：令和元年11月26日～令和2年10月31日

6月

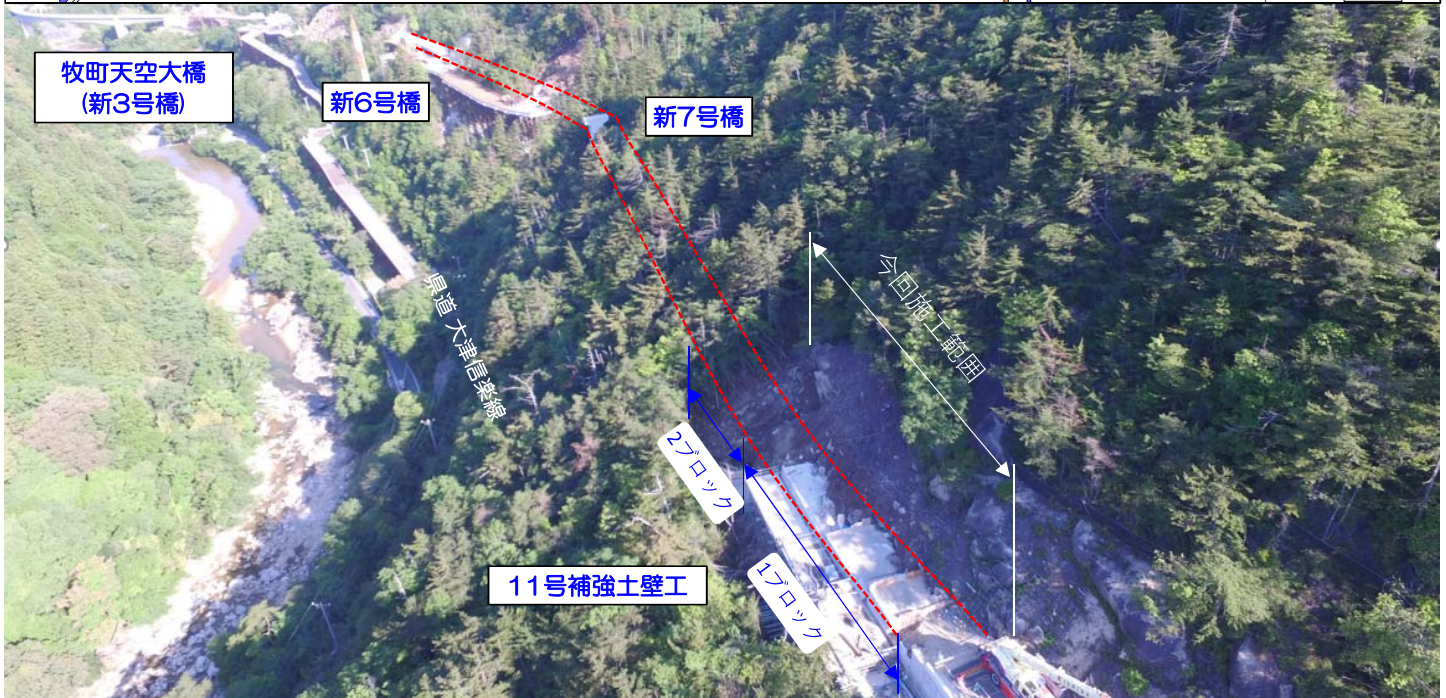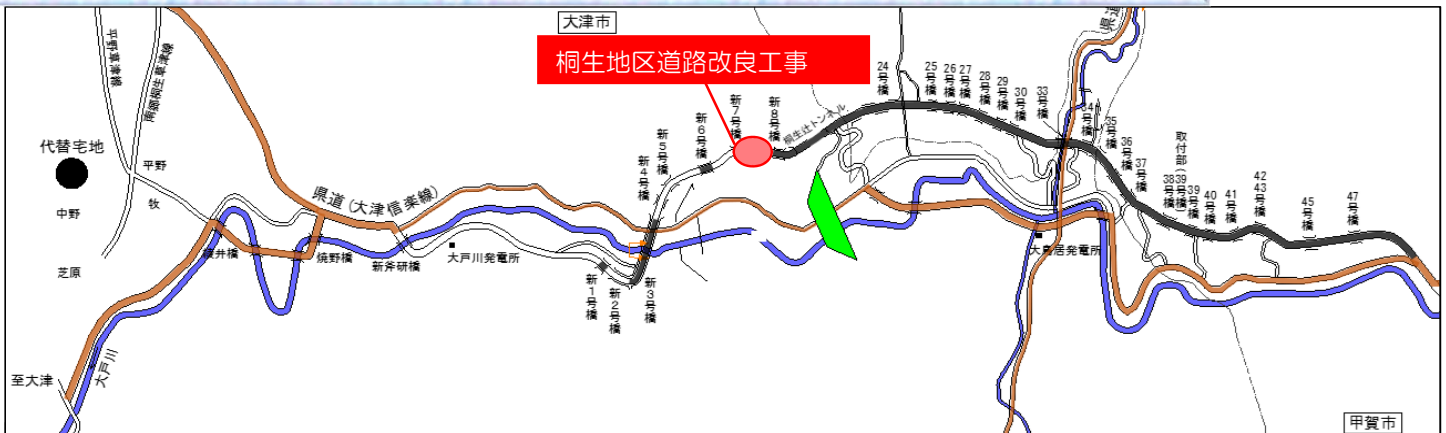

現在の状況

現場代理人コメント

盛土状況




設置状況



現在、パネル設置作業を順次行っております。
盛土を施工する為、土砂運搬車両が頻繁に出入り致します。一般車両優先を徹底して作業致しますので、ご理解・ご協力をお願い致します。

現在の作業：6月より1ブロックの各段のパネル設置作業中です。
今後の予定：パネル設置作業を6月中旬まで行います。その後、伐採及び土工作業の後、7月中旬頃から11号補強土壁工の2ブロックの施工へ移ります。

現場代理人
伊藤 雅記



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-3200
077-549-3206

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年6月16日



バックパ-は
QRコードを読み込み
大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事
工期：令和2年1月16日～令和3年2月28日

6月

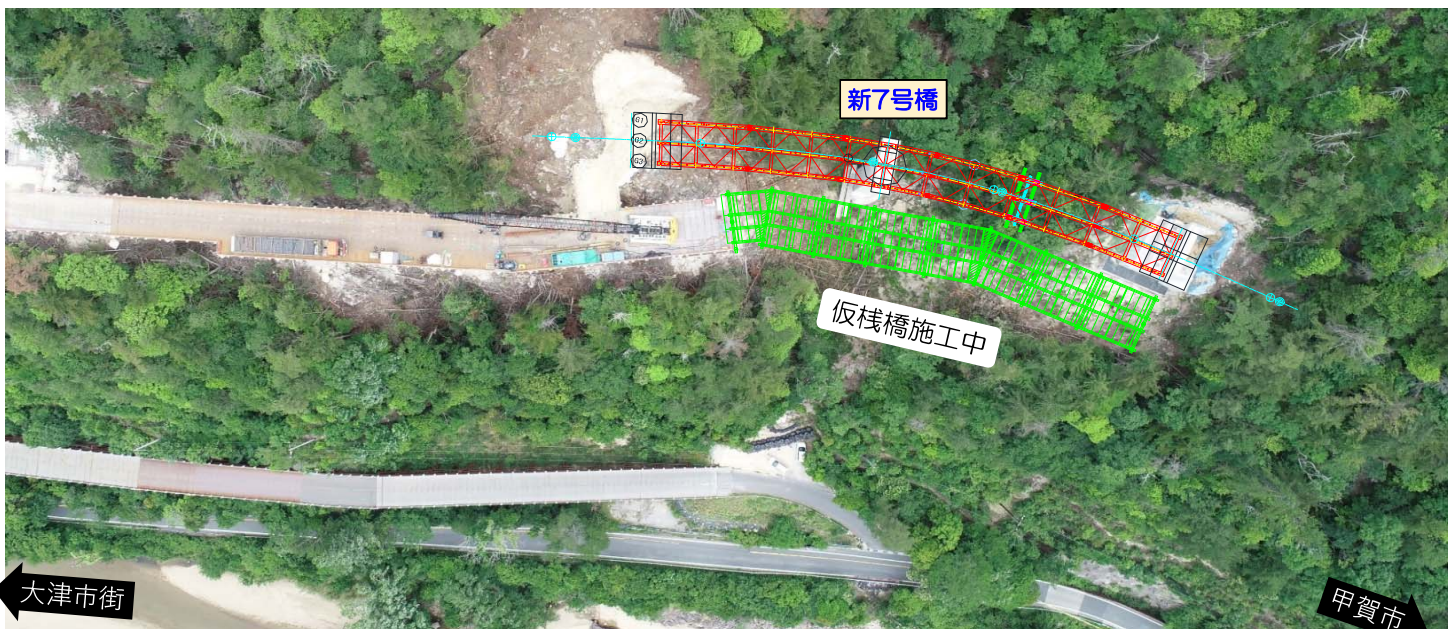

現在の状況

現場代理人コメント



新7号橋は急峻な山間部に架かる橋で、非常に厳しい現場条件ですが、付替道路の早期開通に向けて『安全第一』で工事を進めてまいります！

現場代理人
鶴田 政宏

現在の作業：和歌山の工場で橋げたを製作しています。
今後の予定：工場の作業は9月頃、完成を目指して作業を進めます。
6月より、現地では仮橋の工事に着手しています。
まずは余分な樹木を伐採し、仮橋の杭を打つ工事を進めます。

工場での製作状況

鋼板を溶接して組み立てています



駒井ハルテック
和歌山工場

KH 株式会社 駒井ハルテック
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-2546
077-549-2547

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年6月16日



バックバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
 工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日



終点側からの現場状況をドローンで撮影しました。新7号橋下部工の掘削を開始しました。

工事写真

上段栈橋からの掘削土はクレーンで降ろしダンプに積みこんで仮置場へと運びます。



0.8m幅の道をつけ0.25m幅で掘削します。



4tキリダブに積んで仮栈橋上の仮置場へ運搬。



2m3の土砂バケツに積込。



梅雨に入り、現場からの土砂等の流出を防ぐため、大型土嚢を設置しました。



土砂バケツは25tクレーンで120tクレーンに引継。



120tクレーンで下に降ろします。



4tダブに土砂を積込んで仮置場へ運搬。

監理技術者より一言



30度を超える日が増えてきました。今年も暑い日が多くなりそうですが、コロナ対策に加え熱中症対策と気を緩めることなく現場一丸となって頑張ります。

松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
 【電話】 077-549-1070
 【FAX】 077-549-1075
 監理技術者 秋村 智詩
