

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年8月14日




バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

当初工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日（変更：令和2年8月31日）

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁、補強土壁（追加工事）を施工します。】

8月

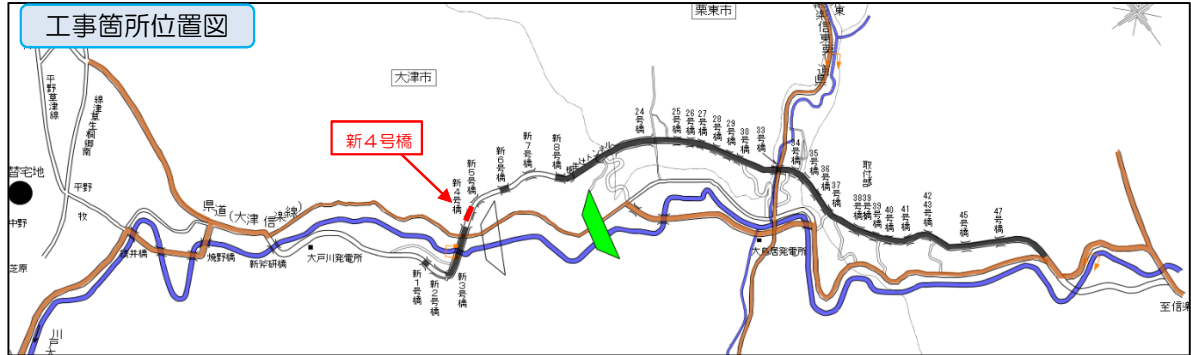

現場位置図



【工事の進捗】 補強土壁（追加工事）の施工を開始しています。

現場の進捗状況

A1橋台、A2橋台、擁壁、補強土壁の構造物も終了し、現在は盛土や埋戻し作業を行っています。盛土や埋戻しは丁寧に転圧を行い、降雨による崩壊が無いように仕上げていきます。

8月下旬から次工事の施工も開始されるため、早急に仕上げていきます。

補強土壁 着工前



補強土壁 施工中



現場代理人のコメント

新型コロナウイルス感染、熱中症が問題となってきました。現場においても気を抜かず感染、熱中症対策を講じて、施工や第三者への影響が無いよう進めてまいります。

当現場は今月で工事が完了します。工事期間中は、工事へのご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございました。

請負者：西村建設株
現場代理人：森本 順
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0100

西村建設株式会社
NISHIMURA CONSTRUCTION CO., LTD.




大津信楽線付替工事ニュース

令和2年8月14日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事
 工期：令和元年9月19日～令和2年11月30日
 【付替県道 新2号橋の橋台を1基と、補強土壁を施工します。】

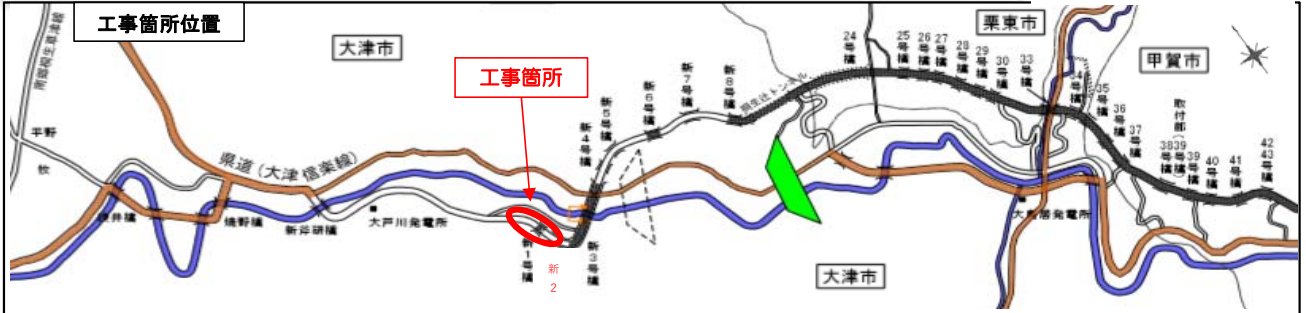


補強土壁とは？

盛土内に帯状の鋼製補強材を層状に敷設し土と補強材の摩擦効果によって強固な補強土壁を構築する擁壁です。

工事進捗

橋台工

深礎杭工完成しました。引続き橋台躯体工の施工に移ります。



補強土壁工工法紹介



- ①コンクリートパネル(厚さ14cm)をクレーンにて設置します。
- ②コンクリートパネルに補強材(帯鋼)をボルトにて固定します。



- ③補強材(帯鋼)設置後、盛土を行います。盛土の厚さは30cmです。
- ④盛土材の締め固めで1層完成です。引き続き②又は①からの繰り返しです。

今後の予定

深礎杭は7月で完成しました。引続きA1橋台工を施工していきます。A1橋台工の施工と同時に、補強土土壁工等道路構造物工事も進捗させていきます。安全第一を心掛け進めてまいりますので皆様のご理解ご協力をお願い致します。

安全第一



株式会社 内田組

【現場事務所】 大津市上田上桐生町地先
 【電話】 077-549-3356
 【FAX】 077-549-3356

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年8月14日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事
当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日
(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

8月

工事箇所位置図



擁壁掘削状況



ブロック積み完成



大型ブロック設置状況



アンカー削孔状況



現場代理人コメン

熱中症対策及びコロナウイルス対策をしながらの施工となり、苦労しているところもありますが、暑さとコロナに負けないよう頑張って工事を進めてまいります。

現場代理人
笠巻 慎也



梅雨から急に真夏日が続いてますが、暑さに負けず作業しています。
相変わらず転石がたくさんできてますが頑張って工事を進めたいと思います。



八田建設株式会社

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

【FAX】 077-549-0075

大津信楽線付替工事ニュース



令和2年8月14日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事
工期：令和元年11月26日～令和2年10月31日

8月

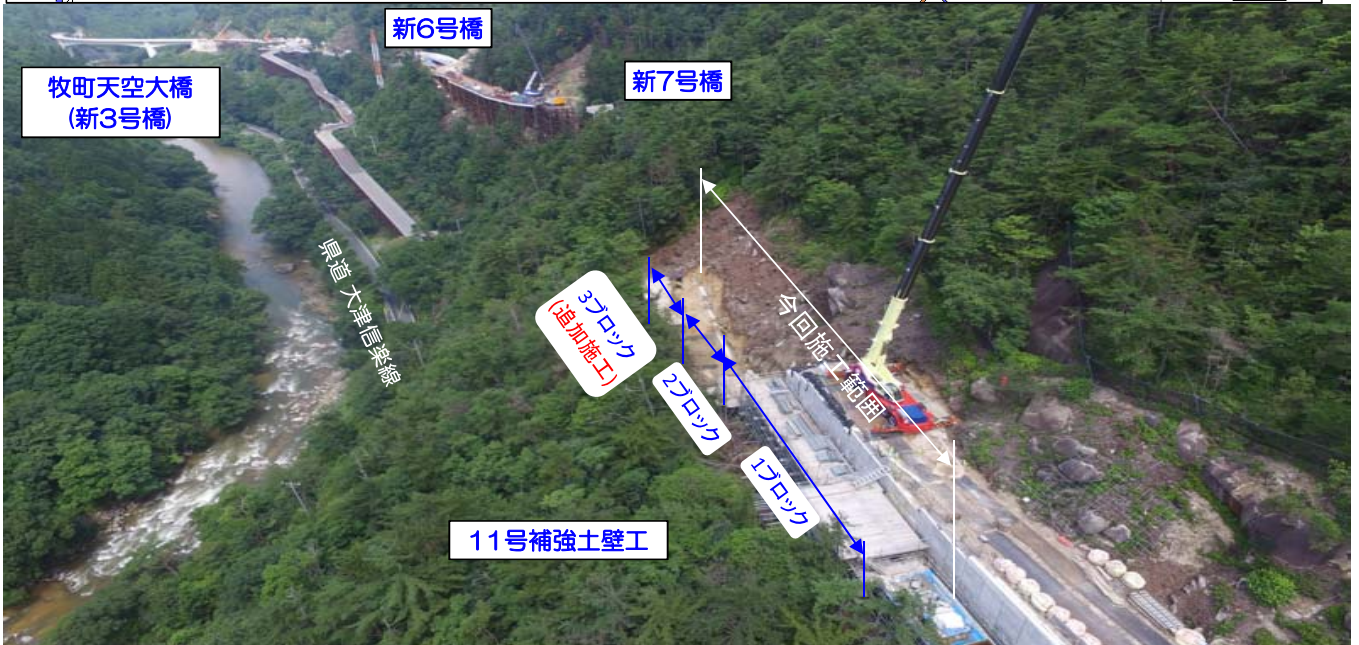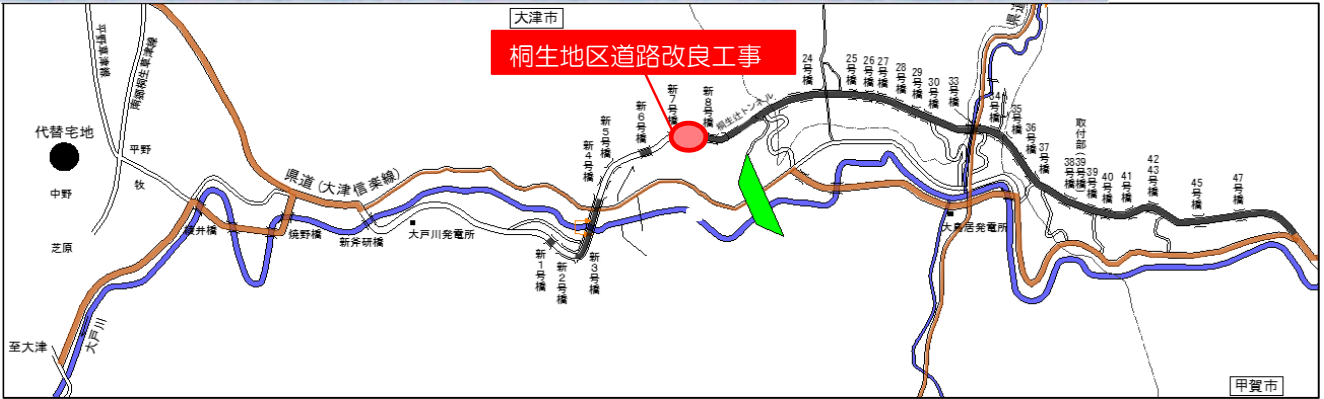

現在の状況

基礎施工状況



床掘状況




現在の作業：7月より床掘作業及び基礎工を施工中です。
今後の予定：基礎工が完了し、壁面パネルの試験後、益明けより
11号補強土壁工の2ブロックのパネルの施工へ移ります。

現場代理人コメント

現在、基礎工を順次行っております。熱中症の危険が高まっている為、水分補給を十分に行い作業行っています。また、3ブロックが追加施工となり工事量が増えましたが、これまで通り十分安全に注意して施工を行っております。

現場代理人
伊藤 雅記



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-3200
077-549-3206

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年8月14日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事
工期：令和2年1月16日～令和3年2月28日

8月

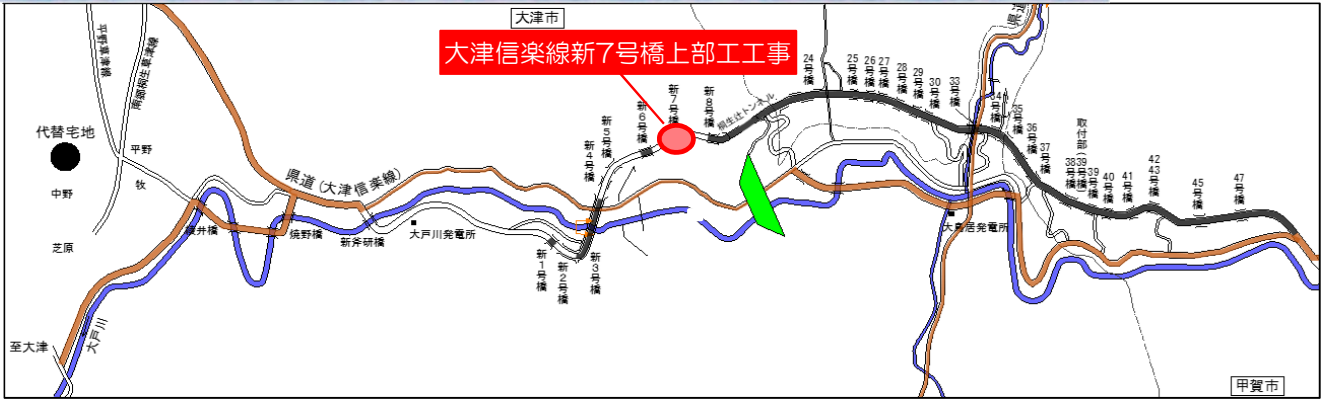

現在の状況

現場代理人コメント



工場では橋げたの製作が完了し、仮組立検査が行われました。現場では仮栈橋の施工が続いています。いよいよ夏本番、暑さに新型コロナにと現場作業に厳しい状況が続きますが、確りと対策しながら安全第一で進めています。

現場代理人 鶴田 政宏

工場での仮組立状況



現在の作業：橋げたの製作および仮栈橋の施工を進めています。
今後の予定：工場は仮組立した部材を解体し、塗装作業となります。
現場では引き続き仮栈橋の工事を進めます。

 **株式会社 駒井ハルテック**
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-2546
077-549-2547

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年8月14日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

8月

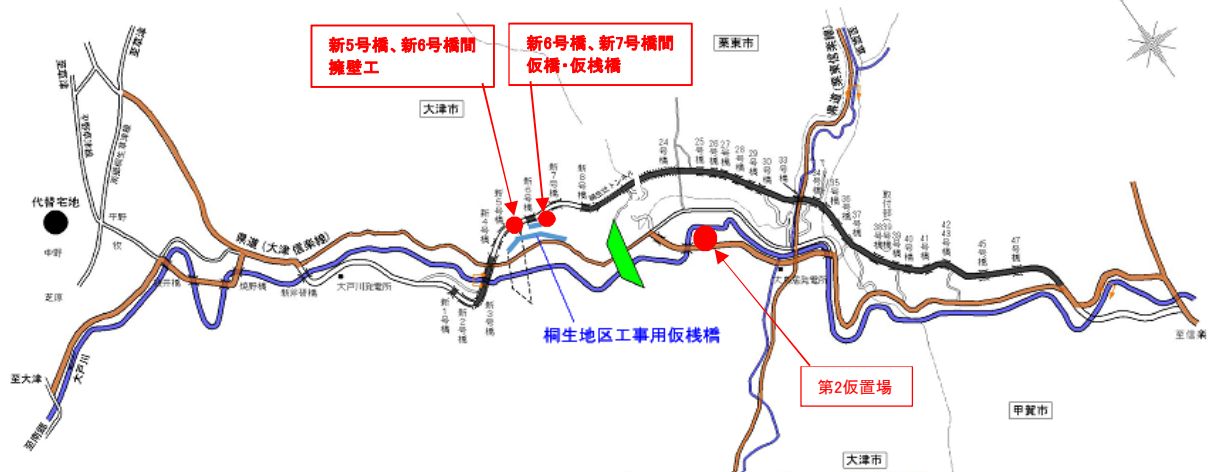

起点側からと終点側からの現場状況をドローンで撮影しました。新7号橋橋台工の深礎杭を施工中です。

工事写真

深礎杭L=6.5m 2本、L=9.5m 2本 発破掘削で掘り進んでいます。



ライナープレートをセットし、ミニBH掘削。



掘削が深くなったので発破の準備。



発破後土砂を人力で土砂バケツに積込



土砂バケツは25tフォークで搬出。




高所での作業のためレスキュー用タンカで救助訓練を実施しました。実際にレスキュー用タンカに人を乗せ、クレーンで少し吊り上げて手順の確認をしま

監理技術者よりー



7月は例年になく雨が続きましたが、雨が終わるといっきに30度を超える猛暑日が続いています。湿度が高いので毎日汗だくになっています。皆さんも熱中症にはお気を付けてください。

松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-1070
【FAX】 077-549-1075
監理技術者 秋村 智詩
