

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年11月16日




バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事

工期：令和元年9月19日～令和3年2月1日

【付替県道 新2号橋の橋台を1基と、補強土壁を施工します。】

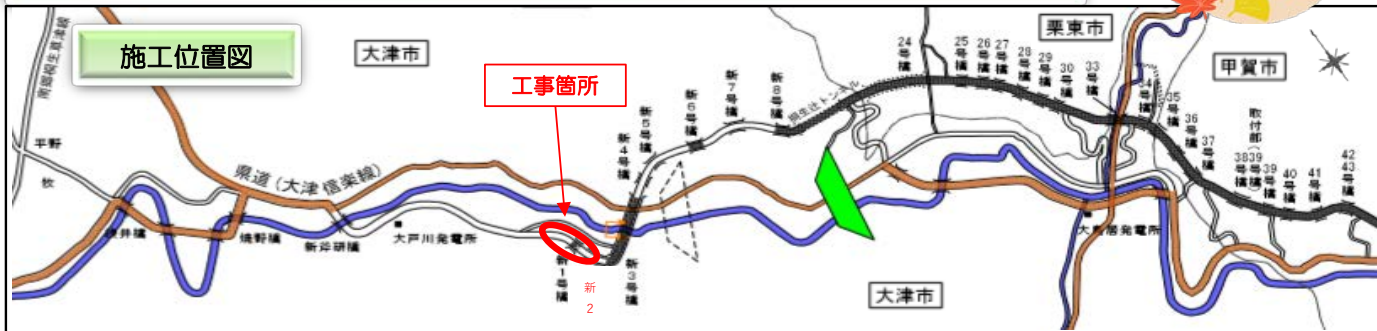

補強土壁とは？
盛土内に帯状の鋼製補強材を層状に敷設し土と補強材の摩擦効果によって強固な補強土壁を構築する擁壁です。

工事進捗




補強土壁工盛土を実施中。



鋼製補強材

今後の予定

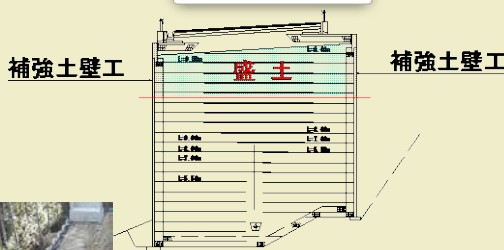

橋台～坑口壁間の補強土壁・坑口壁工（3号～6号）・盛土工の施工を行っています。県道16号を土砂運搬車両が多く通行しますが、一般車両優先、安全第一で工事を進めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

信楽方面



補強土壁工

安全第一

交通事故に注意してね！



株式会社 内田組

【現場事務所】大津市上田上桐生町地先

【電話】077-549-3356

【FAX】077-549-3356

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年11月16日




バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

11月

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事
当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日
(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

工事箇所位置図

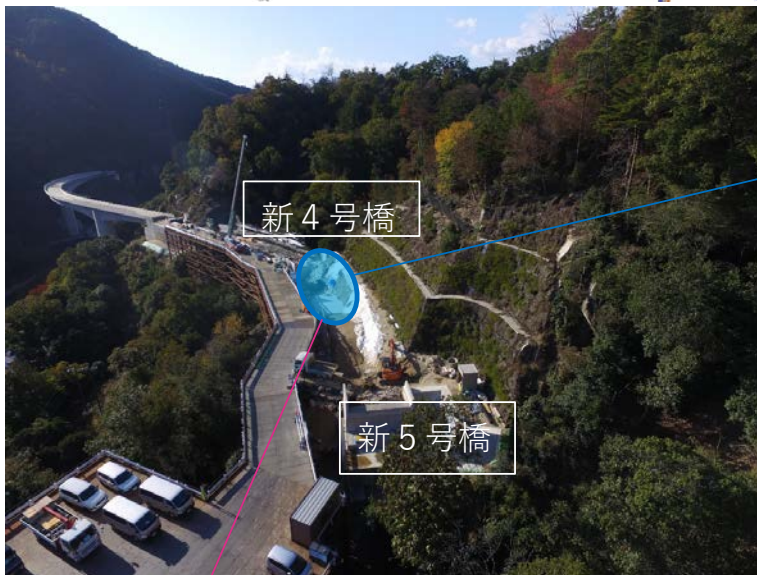

アンカー打設完了



基礎コンクリート鉄筋組立



コンクリート打設状況



朝晩と日中との気温差が大きくなってきました。体調管理に気をつけ
完成に向けて工事を進めてまいります。


圧縮補強土基礎基礎コンクリート打設完了



現場代理人コメン

山の木々が紅葉しだし、冬の訪れを感じながら作業をしています。
引き続き安全作業で頑張ります。

現場代理人
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

【FAX】 077-549-0075

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年11月16日



バックナンバーはQRコードを眺込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事
工期：令和2年2月18日～令和3年3月10日

11月

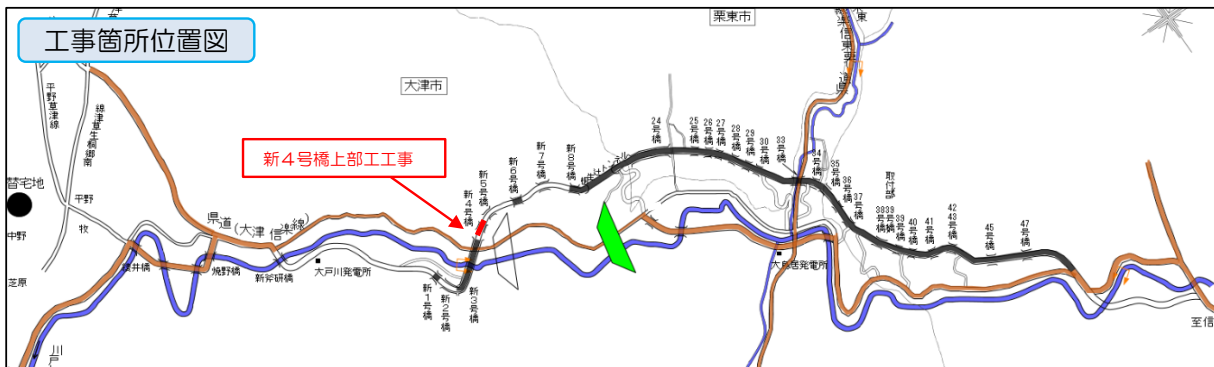

現場位置図



現場の進捗状況

支保工の施工がほぼ終わり、これから箱桁製作工の型枠の組立が始まります。段々と作業ヤードが狭くなってくるので、整理整頓に努め、周囲に十分気を付けて施工を行います。



現場代理人のコメント

11月になり一日の寒暖差が激しくなってきました。風邪やインフルエンザ、新型コロナにかからないよう健康にも気を配り、作業しています。現場では、支保工・足場の組み立て作業から橋梁本体工事へ移ります。安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。



請負者：昭和コンクリート工業(株)
現場代理人：渡邊泰全
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-2370

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年11月16日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事
工期：令和元年11月26日～令和2年12月31日

11月



現在の状況

全体施工状況



現在の作業：8月よりパネル設置及び削孔作業を順次施工中です。
今後の予定：11号補強土壁工の2ブロックのパネルの施工を順次
行って参ります。


削孔状況



現場代理人コメン

現在、11号補強土壁工を順次施工しております。
パネルの施工になりますので、搬入
材料の車輛の出入りが多くなります。
事故の無いよう十分安全に注意し施工
しますので、ご理解・ご協力の程よろ
しくお願い致します。

現場代理人
伊藤 雅記



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-3200
077-549-3206

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年11月16日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流道路改良工事
工期：令和2年7月7日～令和3年2月26日

11月

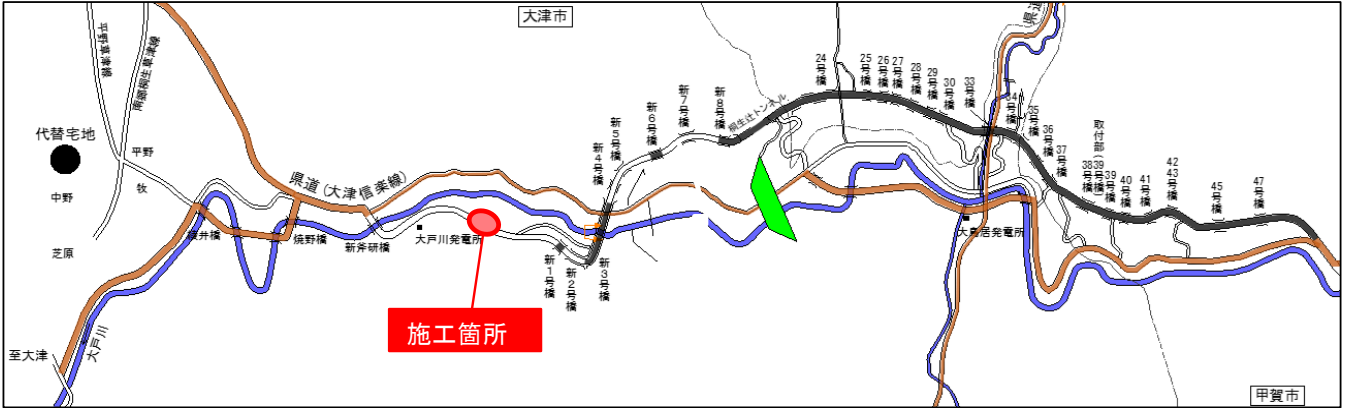

1号補強土壁の掘削と3号ブロック積工の施工をしています。

現場代理人のコメント



1号補強土壁掘削完了状況



3号ブロック積天端コンクリート施工状況

1号補強土壁の掘削がようやく完了しました。この後は、均しコンクリートの打設を行い、基礎フーチング型枠工を行います。11月に入り、寒さが増してきました。手洗いうがいに心がけ、これからも体調管理に注意し、安全作業で現場を進めてまいります。

現場代理人
山口 博孝



OhyAMA 株式会社 大山建設

【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上田上牧町1131
077-549-0583
077-549-0583

大津信楽線付替工事ニュース 令和2年11月16日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

11月



起点側からの現場状況です。法面の形状に合わせて足場を組み立てます。急斜面なので大変苦勞します。

工事写真

9号補強土壁工は基礎コンクリート施工中です。

9号補強土壁標準図。

EPルートパイルの間隔を確認。

基礎コンクリートの鉄筋組立。

基礎コンクリートの型枠組立。

基礎コンクリートのコンクリート打設。


コンクリートの散水養生。

基礎コンクリート 30m/87m完成。

基礎コンクリートは現況の法面に合わせるため鉄筋・型枠の組立は一つとして同じものが無く、たいへん苦勞しています。安全第一で頑張っています。

監理技術者より一言

松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-1070
【FAX】 077-549-1075
監理技術者 秋村 智詩

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年11月16日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事
工期：令和2年1月16日～令和3年2月28日

11月

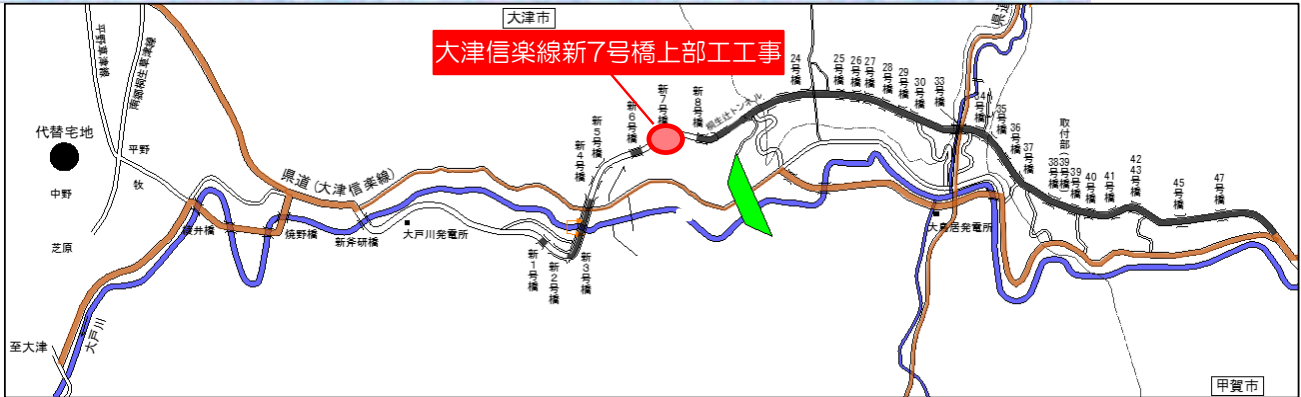

現在の状況

現場代理人コメント



工場では橋げたの塗装作業も完了し出荷の準備段階に入っています。現場では仮橋の施工が最終段階に入り来月の架設作業に向け現場に桁を搬入し地組立作業を行います。冷え込みが一段と進む中、コロナ、インフルエンザ対策と健康管理に留意し安全第一で進めています。

現場代理人 鶴田 政宏

現在の作業：橋げたの製作および仮橋の施工を進めています。
今後の予定：工場は仮組立した部材を解体し、塗装作業となります。
現地では引き続き仮橋の工事を進めます。

工場での仮組立状況



KH 株式会社 駒井ハルテック
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-2546
077-549-2547
