

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年2月12日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事
当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日
(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

2月

工事箇所位置図



新4号・新5号橋間改良その他工事




新4号橋

新5号橋

ガードレール基礎設置状況



U型側溝設置完了

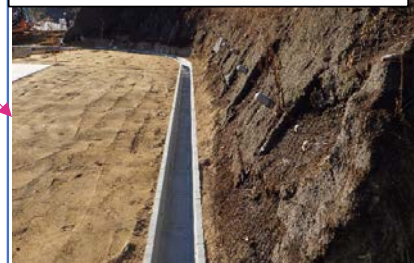

補強土壁設置状況



補強土壁設置完了




メインの補強土壁は完了し、工事もおと少しとなりました。
残すところ1ヶ月、完成に向けて工事を進めてまいりたいと思います。

現場代理人コメント

工事もおよいよ大詰めとなってきました。
コロナも増えてきている中、
感染防止対策しながら
引き続き安全作業で頑張ります。

現場代理人
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地先

【電話】 077-549-0151

【FAX】 077-549-0155

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年2月12日




バックパ-はQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事
工期：令和2年2月18日～令和3年7月30日
【付替県道 新4号橋の橋梁上部工本体を施工します。】

2月

工事箇所位置図

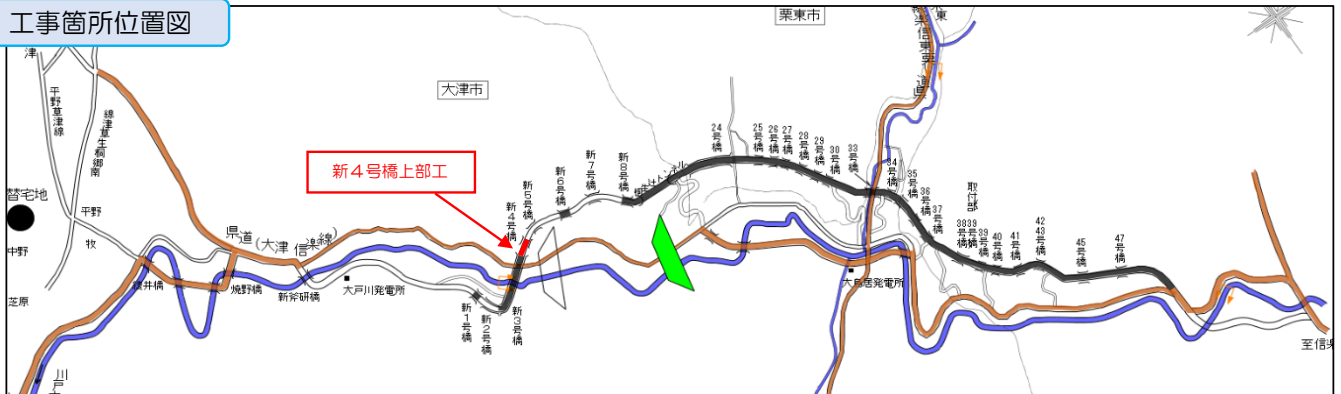

現場位置図



現場の進捗状況

PC箱桁製作工の一次施工範囲のコンクリート打設が無事完了し、現在は2回目のコンクリート打設（2月19日予定）に向けて鉄筋型枠の組立を行っております。場内の整理整頓に努め、周囲に十分気を付けて施工を行います。



現場代理人のコメント

寒い日が続く中予定通り作業が進行しています。今月作業予定は、2回目のコンクリート打設で橋梁本体部の打設が完了し、養生期間を経て、PCケーブルの緊張、型枠支保工の解体作業へ進めていきます。

安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。



請負者：昭和コンクリート工業(株)
現場代理人：渡邊泰全
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-2370

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年2月12日



パフパフは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事
工期：令和3年1月8日～令和3年10月31日

2月

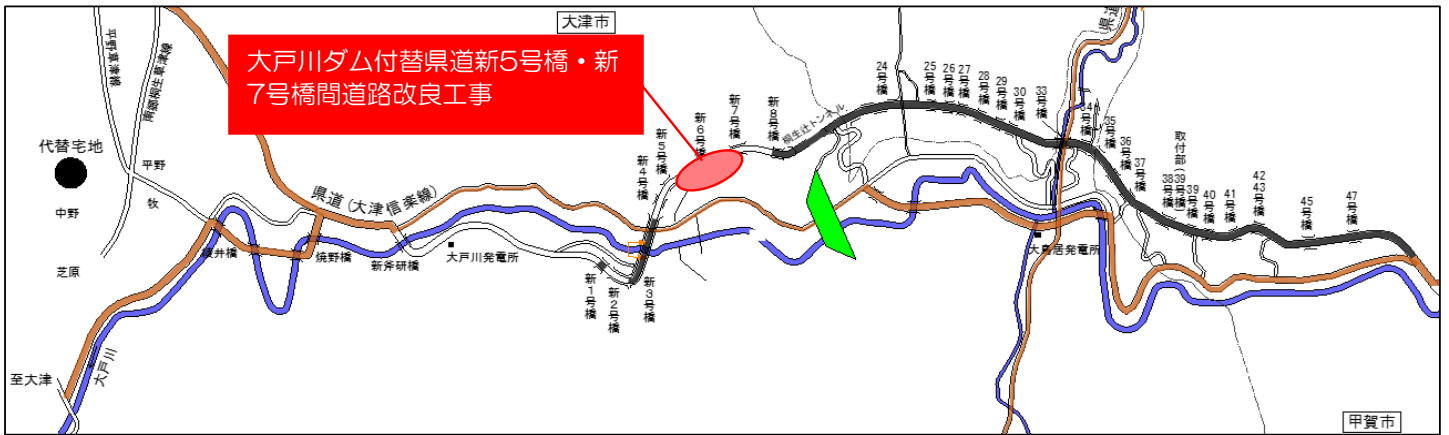

現在の状況




今後の予定：
2月中に準備工を終え、3月
初旬頃より工事に取り掛かる
予定です。
9号切土補強土工側より撮影

現場代理人コメント

新5号橋・新7号橋間の工事を担当することになりました。宜しく願い致します。現場内は岩石の多い地盤ですので、安全に十分注意して施工して参ります。
今後、工事用車両等の出入りが多くなります。ご迷惑をお掛けしないよう注意しますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

現場代理人
佐野 邦生



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-0151
077-549-0155


大津信楽線付替工事ニュース

令和3年2月12日



パツパツは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工期：令和2年11月7日～令和3年11月19日

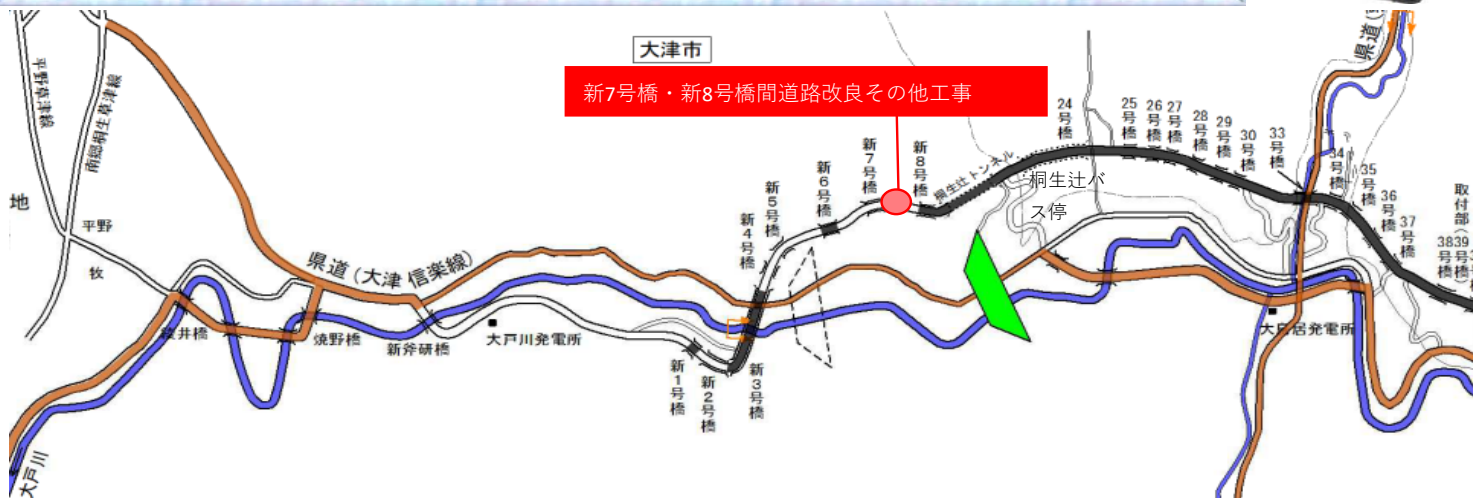

【現在の作業】 11号補強土壁の一部完成部分にガードレールの基礎を作っています。

【今後の予定】 11号補強土壁—2月中に右下写真までコンクリートパネルを積み、盛土をしてクレーンを前方に移動します。移動後、パネルを吊り下げて下から1段ずつ積み上げていきます。

工事現場の施工状況



監理技術者のコメント

2月8日より11号補強土壁のパネル設置作業を開始します。少しでも早く付替県道が開通できるように安全第一で頑張ります。

監理技術者
米田 剛



OhyAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年2月12日



バックバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流道路改良工事
工期：令和2年7月7日～令和3年2月26日

2月

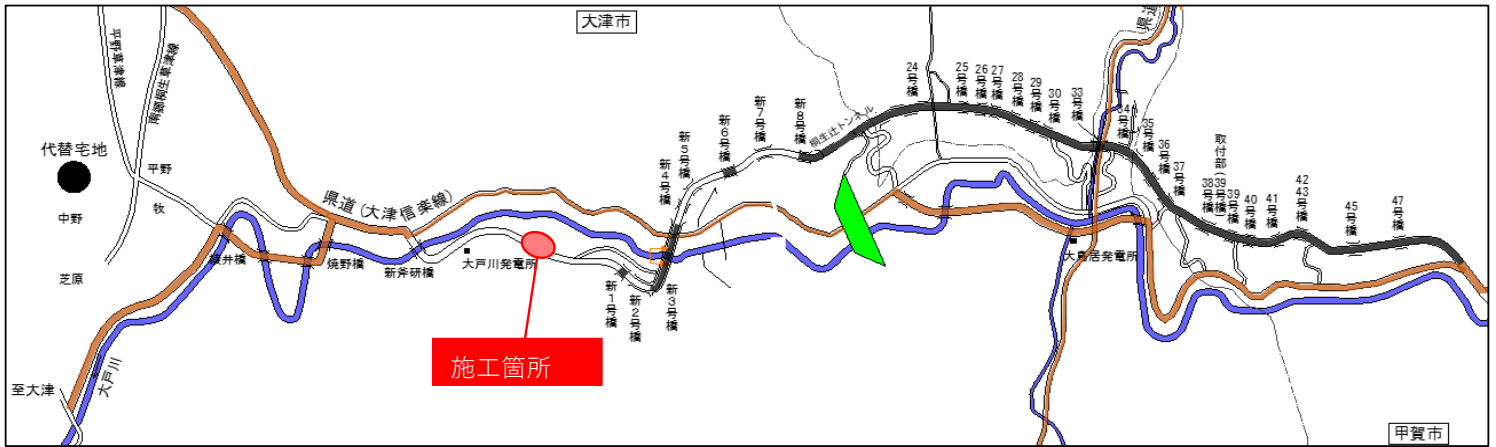

1号重力式擁壁と、重力式擁壁の施工をしています。

現場代理人のコメント



重力式擁壁施工状況



1号重力式擁壁(養生中)施工状況

1号重力式擁壁、重力式擁壁の施工を行っています。
工事も終盤になり、慌ただしく現場は進みますが、事故の無いように注意し、安全作業で現場を進めてまいります。

現場代理人
山口 博孝



OnyAMA

株式会社 大山建設

【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上田上牧町1131
077-549-0583
077-549-0583

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年2月12日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線上流区間他舗装その他工事
工期：令和2年11月18日～令和3年3月10日

2月

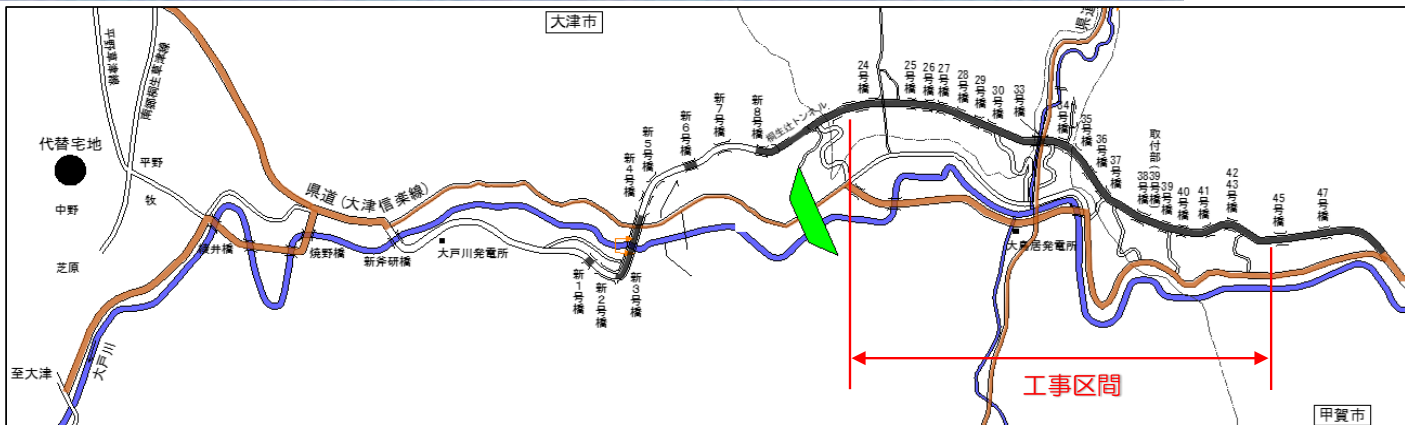

現在の状況①



現在の状況②



現場代理人コメント

2月となり、いよいよメインの舗装工事を行っていきます。当作業所では、引き続き新型コロナウイルス対策を行い、全員が体調を整え安全第一で快適な道路づくりに取り組んでまいります。県道大津信楽線を通行される皆様方には、大型車両の往来で一時的にご迷惑をお掛けしますが、交通には十分配慮して通行いたしますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。



請負者：近江道路土木(株)
現場代理人：増田 晋一

現場事務所：甲賀市信楽町黄瀬3315番地
電話 0748-60-6747

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年2月12日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
 工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日



仮橋・仮栈橋完成後、新7号橋A1橋台が完成。8号補強土壁工・3号重力式擁壁は完成。9号補強土壁工は本体部分は完成、足場を解体後モルタル吹付を行って完成です。



監理技術者よりお礼の言葉
 令和3年2月で完成を迎え今回の工事ニュースで最後となります。令和元年10月から約1年と4ヶ月の工事でした。急峻な地形で難題が多く大変な工事でしたが良い経験となりました。工事期間中は住民皆様のご協力を頂き無事工事の完成を迎えられます。ここに感謝の意を申し上げます。

松尾建設株式会社



MATSUO

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
 【電話】 077-549-1070
 【FAX】 077-549-1075
 監理技術者 秋村 智詩
