

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年5月14日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事
工期：令和2年1月16日～令和3年4月30日

5月



大津市街

甲賀市街




現在の状況

現場代理人コメント



現場乗込みから1年を迎え、5月11日の検査を経て、施工完了となりました。
工事中は、近隣住民の方々には、ご迷惑をおかけいたしました。多大なるご協力を頂き無事故にて工事を完了することができました。本当に有難うございました。

現場代理人 鶴田 政宏

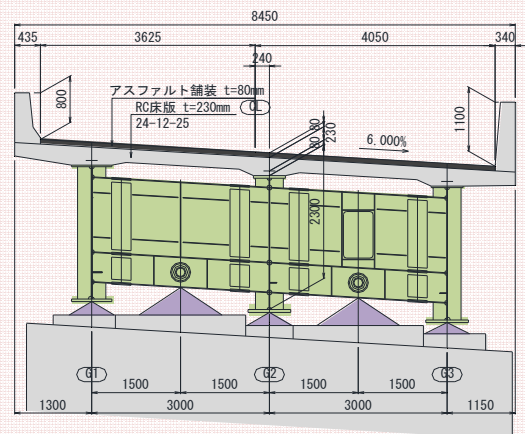

KH 株式会社 駒井ハルテック
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-2546
077-549-2547

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年5月14日




バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事
工期：令和2年2月18日～令和3年7月30日

5月

工事箇所位置図

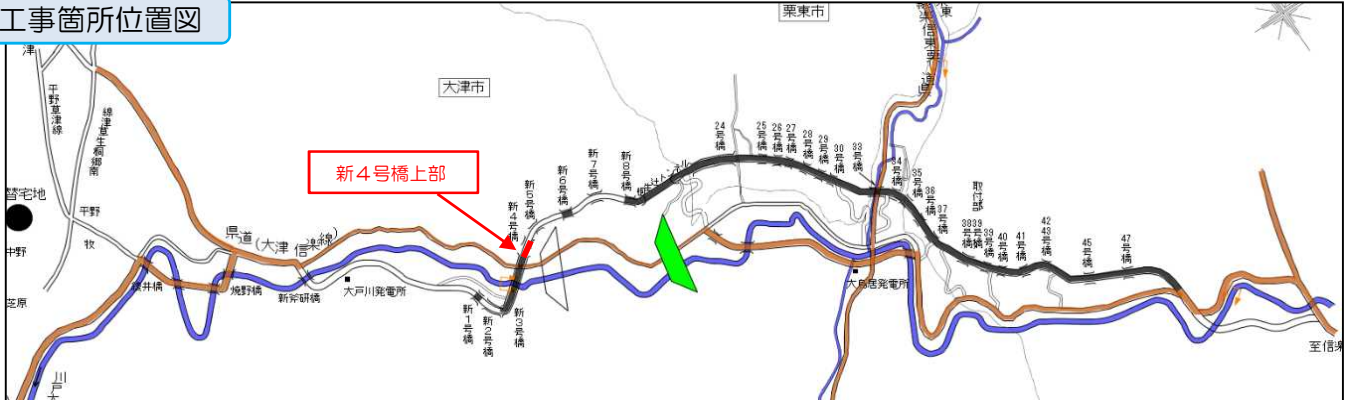

現場位置図



現場の進捗状況

PC箱桁製作工が完了し、心配された支保工の解体も無事に終わりました。今は橋面の壁高欄の施工を行っています。場内の整理整頓に努め、周囲に十分気を付けて施工を行います。



現場代理人のコメント

現場作業は予定通り進行しています。今月の作業は壁高欄の施工を予定しています。新型コロナウイルスの感染拡大している中、感染防止対策を講じて、施工への影響が無いよう進めてまいります。
安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。



請負者：昭和コンクリート工業(株)
現場代理人：渡邊泰全
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-2370

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年5月14日



バックナンバーは
QRコードを眺込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事
工期：令和3年1月8日～令和3年10月31日

5月

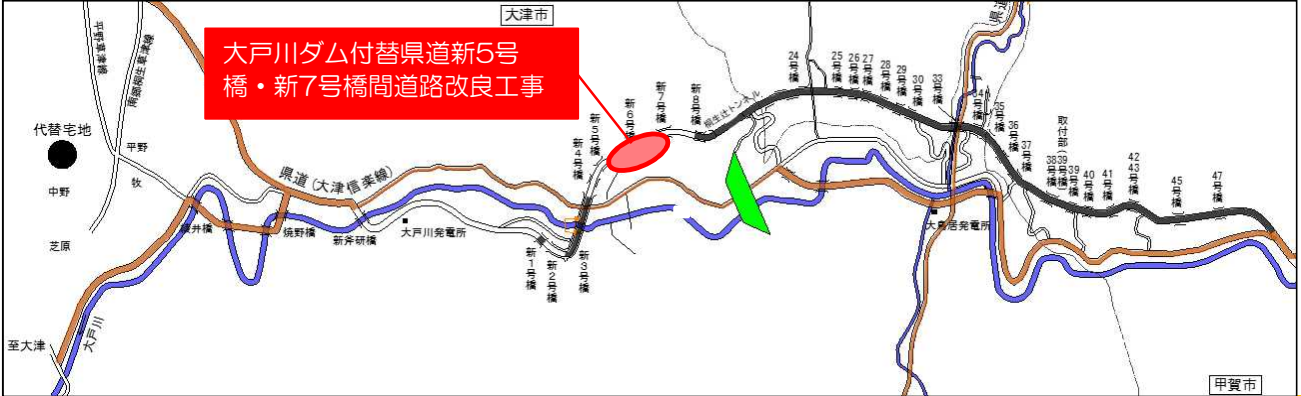

現場代理人コメント

5月上旬の早い時期に気温も夏日となり、初夏の訪れを感じる季節となりました。気温が高い日には熱中症に十分に注意して施工して参ります。

今後、補強土壁工の施工の為、大型車両による材料の搬入及び切土補強土工の土砂の搬出が予想されます。ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。



現場代理人
佐野 邦生


大津信楽線付替工事ニュース

令和3年5月14日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工期：令和2年11月7日～令和3年11月19日

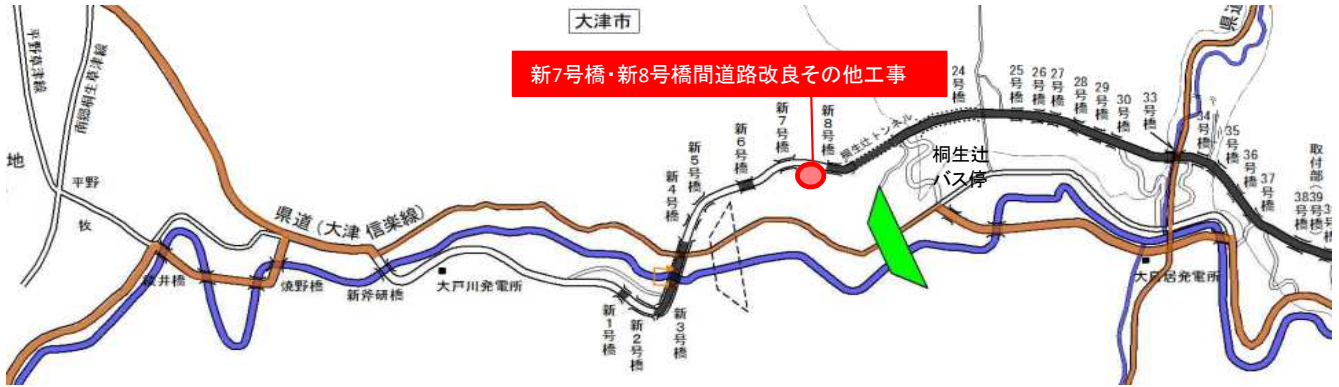

【現在の作業】次工程へ進む前に、作業に支障をきたす転石の破碎・撤去を行っています。


【今後の予定】11号補強土壁—5月下旬より、右下写真先端までコンクリートパネルを積上げ、クレーンを前方に配置できるようヤードを設置します。その後、樹木の伐採と搬出を行い、基礎工事に着手します。

工事現場の施工状況

施工状況(先月)



施工状況(今月)

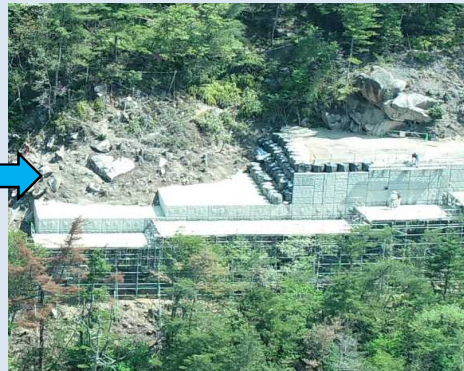

監理技術者のコメント

5月に入って暖かくなり、過ごしやすくなりましたが、雨の日が多くなってきました。当現場は急峻な地形であるため、無理をせず安全第一で工事を進めてまいります。今後ご理解・ご協力を宜しくお願いいたします。

監理技術者
米田 剛



OnYAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705
