

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年7月15日




バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事
工期：令和2年2月18日～令和3年7月30日

7月

工事箇所位置図

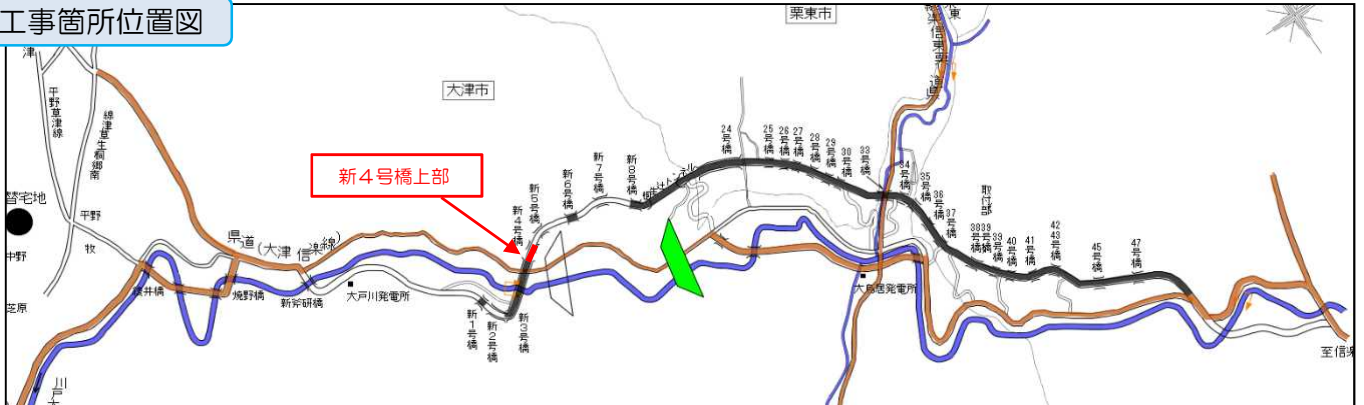

現場位置図



現場の進捗状況

R3.6.26撮影

PC箱桁製作工に続き、壁高欄工をはじめ、すべての現場作業が完了しました。おかげさまで、無事故無災害で最後まで安全に施工できました。ありがとうございました。



現場代理人のコメント

現場作業は予定通り進行し全作業工程を終了しました。今月29日の完成検査をもって、工事の完成を迎えます。

工事期間中は、地域の皆様のご理解・ご協力をいただきありがとうございました。



請負者：昭和コンクリート工業(株)
現場代理人：渡邊泰全
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-2370



大津信楽線付替工事ニュース

令和3年7月15日




バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工期：令和2年11月7日～令和3年11月19日

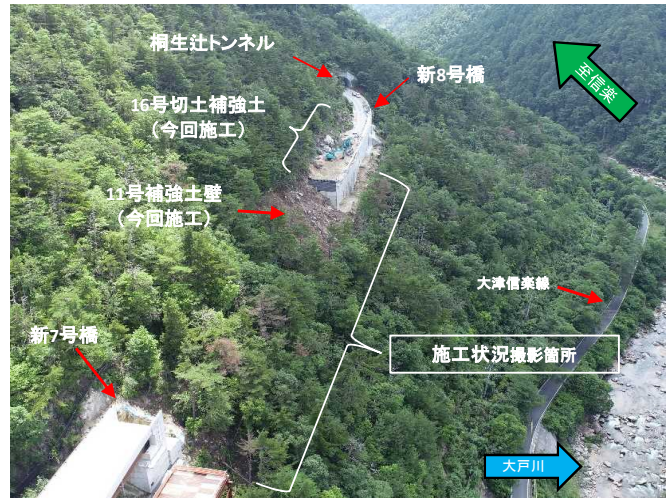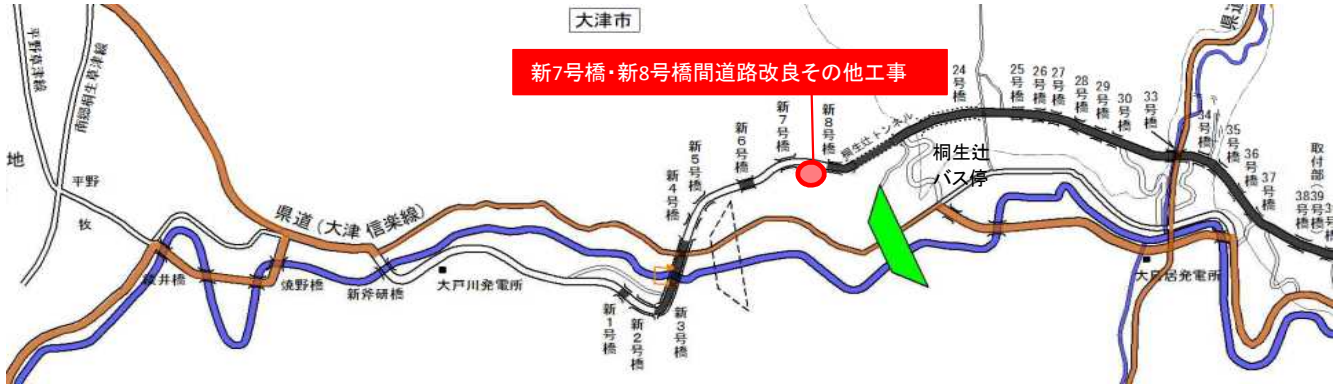

【現在の作業】16号切土補強土の施工において、作業に支障をきたす巨石・転石の破碎、撤去を行っています。
【今後の予定】8月上旬まで、上記巨石・転石の破碎、撤去を行い、8月上・中旬より法面保護工事を行います。

工事現場の施工状況

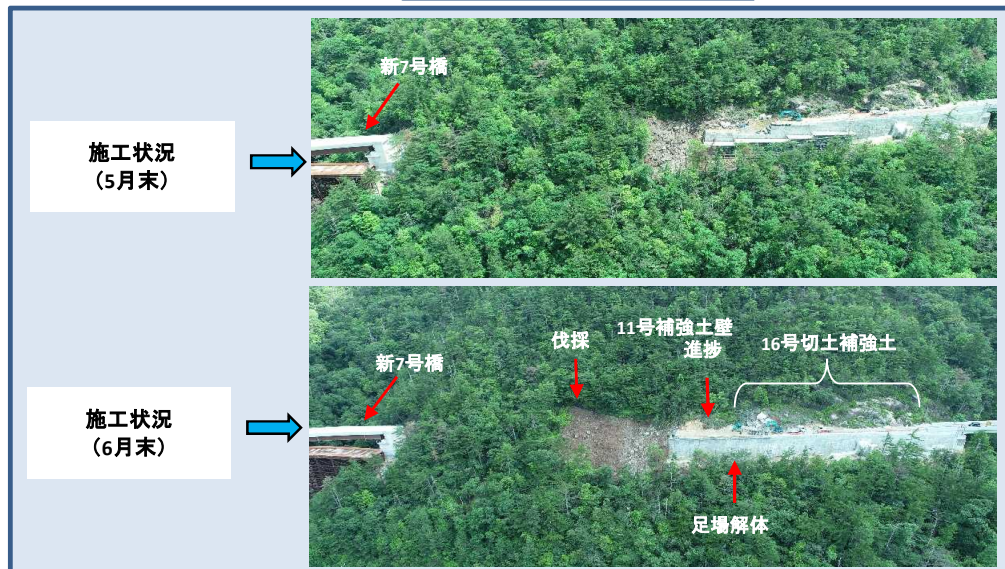

監理技術者のコメント

6月中に11号補強土壁を約20m天端まで仕上げ、クレーンヤードを設置し、同じく約20m伐採を行いました。
今後も安全第一で工事を進めます。また、工程を密にして短縮を図り早期完成を目指します。引き続きご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

OhYAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年7月15日



パッケンパーは
QRコードを眺込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ


工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事
工期：令和3年1月8日～令和3年10月31日

7月

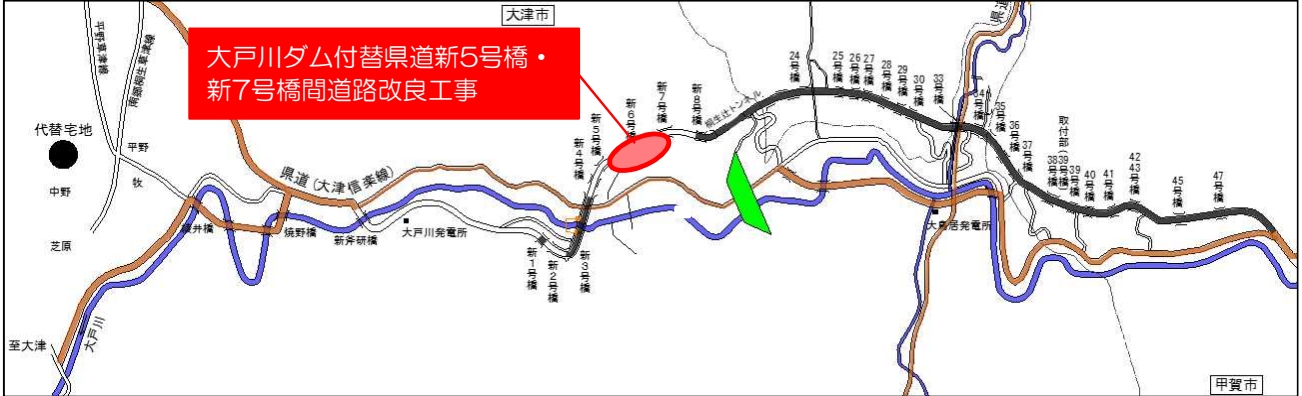

現在の施工位置

施工写真①

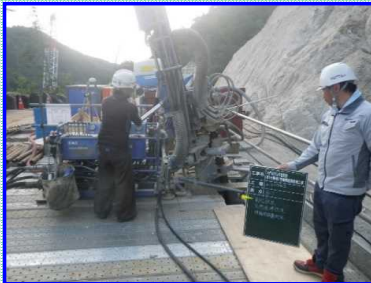

EPルートパイル施工状況

施工写真②



転石破碎状況

現場代理人コメント

最高気温が30℃を超える日々となって参りました。現場内では熱中症対策としてテントや冷房の効いた休憩所設置及び水分補給を十分に行っております。

引き続き、切土補強土工等の施工の為、工事用車両による転石及び土砂の搬出が予想されます。一般車両優先で通行致しますのでご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

現場代理人
佐野 邦生

