


# 大津信楽線付替工事ニュース

令和4年1月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事  
工期：令和2年11月7日～令和4年5月20日

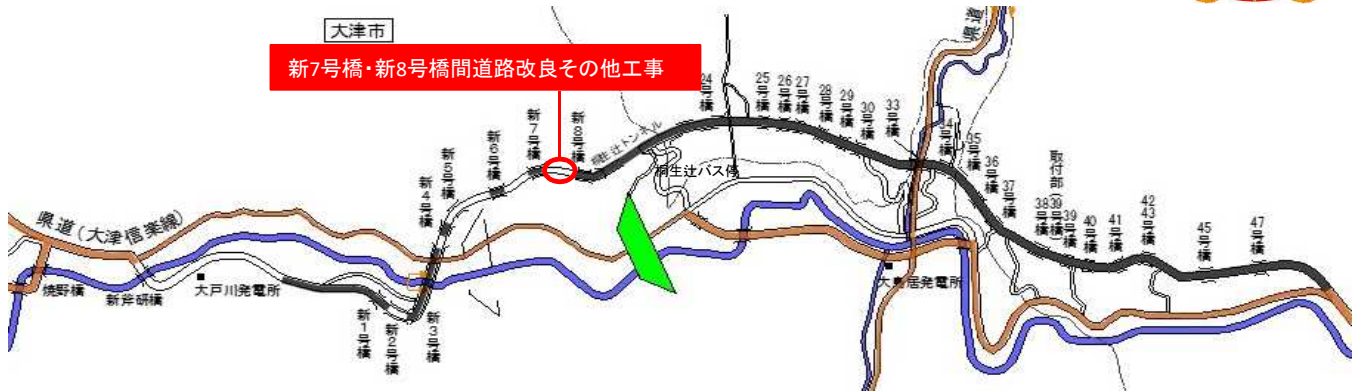

【現在の作業】11号補強土壁基礎部の鉄筋挿入打設準備と16号切土補強土の鉄筋挿入(法面補強)を行っています。  
【今後の予定】16号切土補強土(法面補強工事)・11号補強土壁(擁壁)の基礎工事(足場の組立)→(鉄筋挿入)を年始より施工します。

## 工事現場の施工状況

施工状況  
(11月末)

→

施工状況  
(12月末)

→

## 監理技術者のコメント

明けましておめでとうございます。平素は大戸川ダム付替県道工事にご理解ご協力を頂き感謝申し上げます。現在、法面補強工事と擁壁工事を並行作業で進めておりますが、年始より左下図のように足場を組立て、道路の基礎の一部となる鉄筋挿入を行います。急峻な場所での作業となりますので、安全に細心の注意を払いながら工期短縮に努めてまいります。



監理技術者 米田 剛

**OhYAMA (株) 大山建設**

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-1700  
077-549-1705

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年1月15日



バックナンバーは  
QRコードを隠込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事  
工期：令和3年1月8日～令和4年2月28日

1月

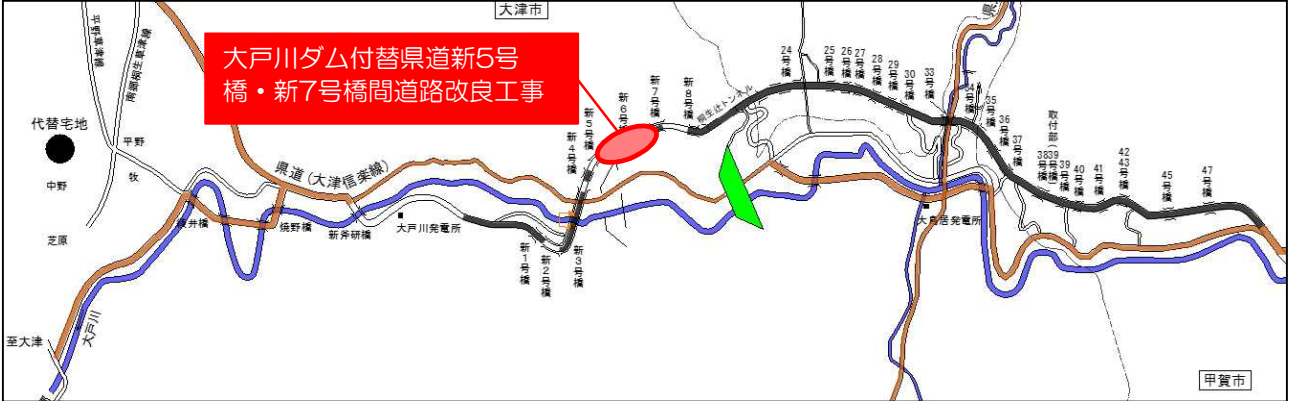

## 施工状況写

### 切土補強土工



### 重力式擁壁工



## 現場代理人コメント

明けましておめでとうございます。  
本年もどうぞよろしくお願い致します。  
当該現場でも初雪が降り、冬本番となつて参りました。作業員一同、寒さに負けず現場を安全第一で進めて参りますので、今後ともよろしくお願い致します。今後の施工予定としまして、切土補強土工（鉄筋挿入工）を主体で現場の方を進めて参ります。

現場代理人  
佐野 邦生



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年1月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事  
工期：令和3年6月17日～令和4年6月15日

1月

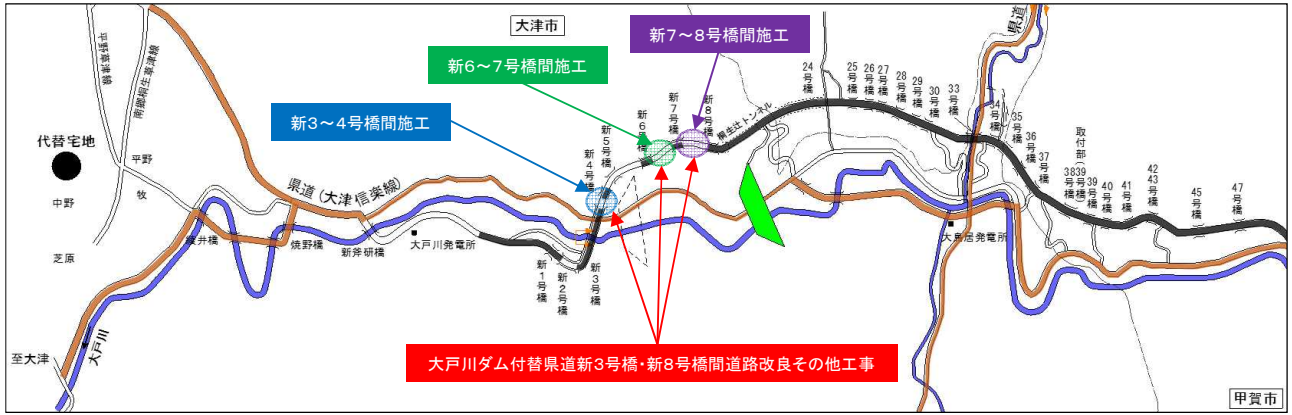

工事現場全景(新3号橋から新8号橋に向けて)



新3～4号橋間施工箇所



新6～7号橋間施工箇所



工事現場全景(新8号橋から新3号橋に向けて)



現場代理人：寺内 敬嗣

新6～7号橋間では11号切土補強土壁掘削を行っています。10号補強土壁については基礎部分の鉄筋挿入が年明けにて終わる予定にて動いております。土砂運搬時において一般車優先にて工事車両の通行をおこないます。また、工程の短縮を図り早期完成を目指します。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



株式会社 アクト

現場事務所  
電話

大津市上田上桐生町地先  
077-549-0010


# 大津信楽線付替工事ニュース

令和4年1月15日



バックナンバーは  
QRコードを隠込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新2号橋上部工事  
工期：令和3年4月1日～令和4年3月10日

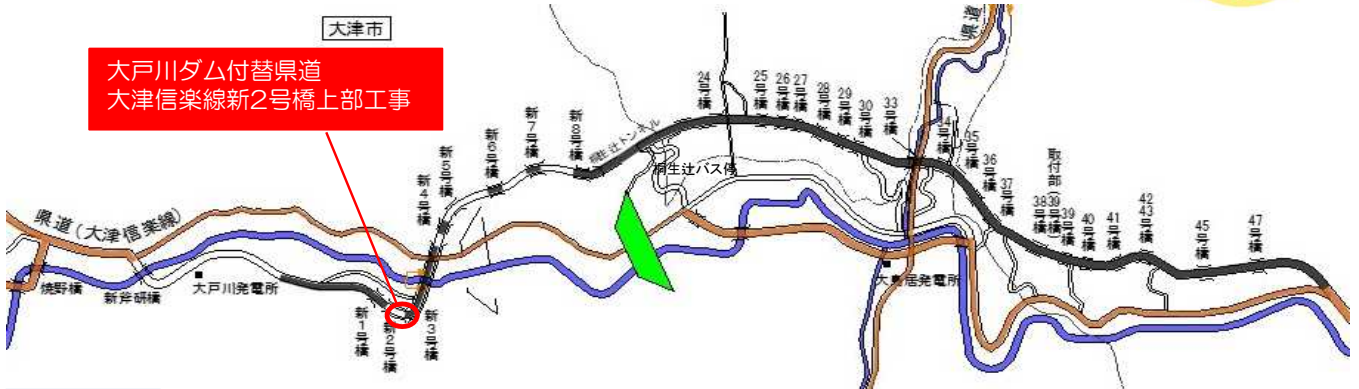


【現在の作業】 連結工・床板工コンクリート打設に向け、鉄筋・型枠組立作業を進めています。  
【今後の予定】 1月中旬に、床板工コンクリート打設を行い、その後、壁高欄の施工を進めていきます。

## 工事現場の施工状況

## 監理技術者のコメント

### 施工状況（12月中旬） 横組工コンクリート打設

PC桁架設および架設桁の解体を完了したため、横組工の施工を進めていき、コンクリート打設を行いました。打設距離が長いので、打設箇所の移動に時間を要しました。

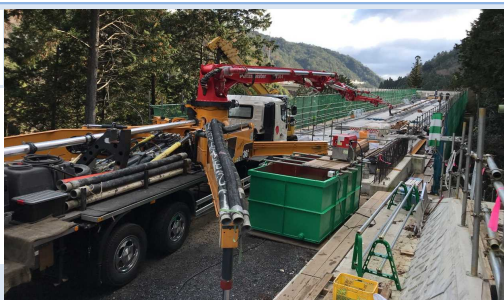

### 施工状況（12月末）床板工鉄筋組立

横組工の施工を完了したため、床板工の鉄筋組立を進めています。施工延長が長いので、鉄筋でのつまづきなどないように、注意しながら施工を進めています。



12月中旬に、横組工コンクリート打設を終了し、12月末までは床板工の鉄筋型枠組立を進めています。

年末年始休暇を経て、床板工の施工を引き続き進めていき、1月中旬に床板工のコンクリート打設を予定しております。

1月中は、コンクリート打設等で車両が多くなりますので、引き続き交通災害十分注意して、施工を進めていきます。年末年始休暇を経て、現場施工も終盤に差し掛かり、より一層気を引き締め、無災害を目標に進めていきます。

今後ともご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。



監理技術者 稲葉 諒



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年1月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新5号橋上部工事  
工期：令和3年3月31日～令和4年3月10日

1月

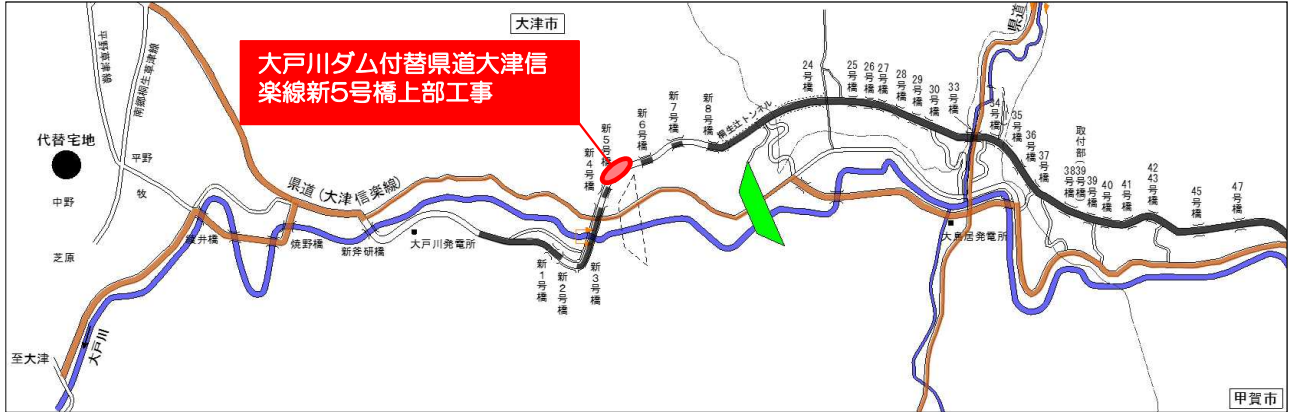

【現在の作業】 「壁高欄」の鉄筋・型枠組立等を行っています。

## 現在の施工状況



あけましておめでとうございます。  
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末にメインとなる床版コンクリートの打設が完了しまして、現場もいよいよ終盤が近づいてきております。

あと2ヶ月少々で工期末となりますが最後まで気を抜かないよう無事故・無災害にて完工を目指しておりますので今後ともご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



現場代理人  
實 扇太郎



株式会社 名村造船所  
NAMURA SHIPBUILDING CO.,LTD.

現場事務所 大津市上田上桐生町地先  
TEL&FAX 050-5444-5662

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年1月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事  
工期：令和3年8月5日～令和4年3月10日

1月

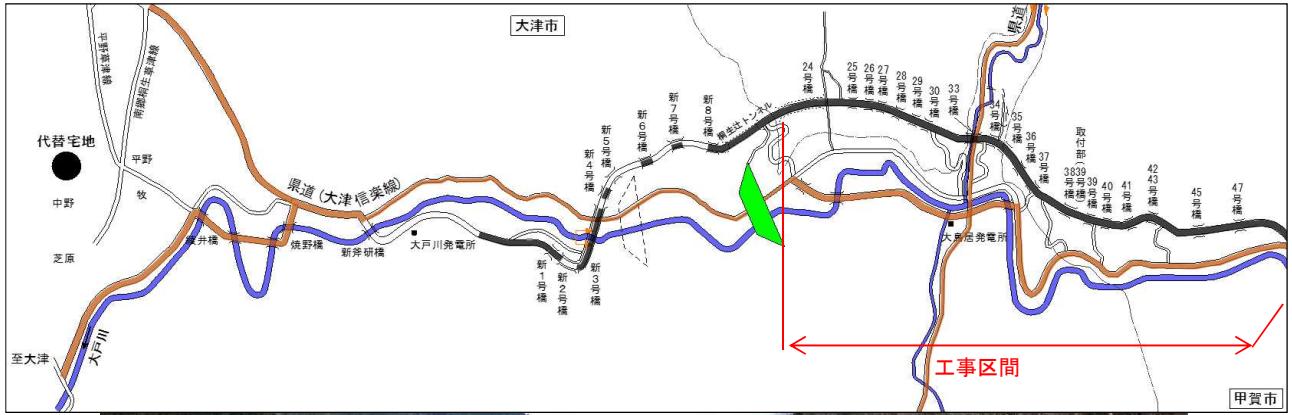

工事現場全景(甲賀から大津に向けて)



工事現場全景(大津から甲賀に向けて)



現場代理人：野々村 英樹

12月度は舗装工を中心に施工してまいりました。令和4年1月中頃から現道大津信楽線を片側交互通行規制で作業する予定です。また、舗装工においては現道大津信楽線を終日片側交互通行規制による施工を実施する期間がございますのでご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。



株式会社 アクト

現場事務所  
電話

大津市上田上桐生町地先  
077-549-0010

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年1月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事  
工期：令和3年8月11日～令和4年2月28日

1月

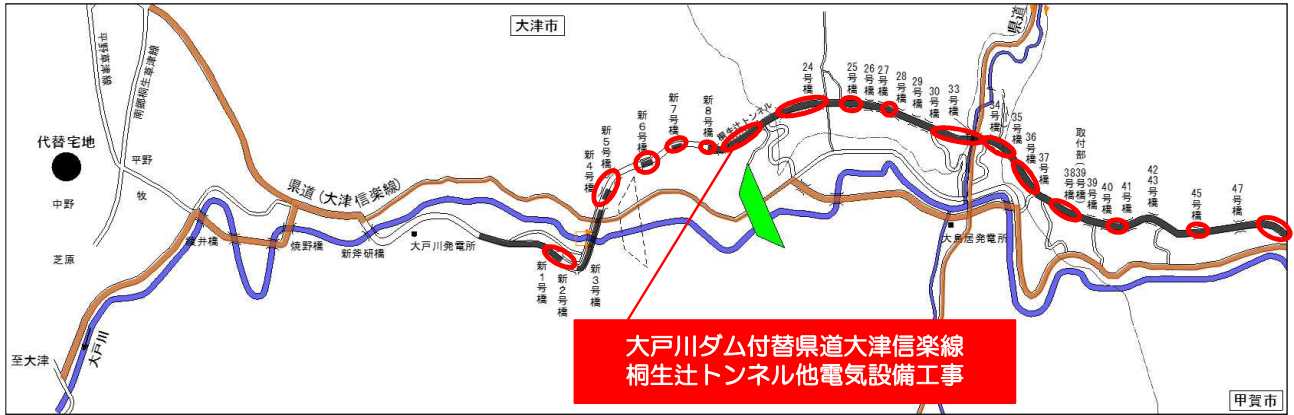

桐生辻トンネル終点側

工事名	大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工事種	出先高等支
撮影箇所	桐生辻トンネル 終点側
撮影内容	12月度出来高
受注者	株式会社デューイテクニカル

桐生辻トンネル終点側 R側

桐生辻トンネル終点側 L側

トンネル照明用金具取付完了  
トンネル照明用ケーブル支持金具取付完了  
プルボックス取付完了

桐生辻トンネル終点側(甲賀方面)から撮影

【現在の作業】 トンネル照明用アンカー打設等を行っています。



先月から開始した、トンネル照明用のアンカー打設、ケーブル支持金具用のアンカー打設作業が完了しました。

今月からトンネル照明用分電盤の基礎設置、埋設配管敷設作業、凍結注意表示板の設置を行っていきます。

先月から降雪があり、寒くなってきておりますが安全第一にて作業を行って参ります。今後もご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人  
下矢 智一
