


# 大津信楽線付替工事ニュース

令和4年2月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事  
工期：令和2年11月7日～令和4年5月20日

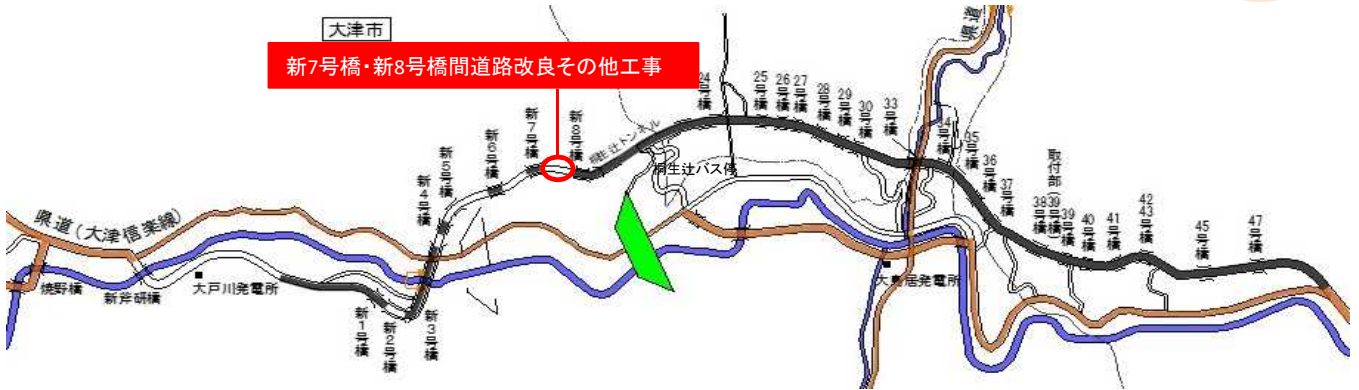

【現在の作業】11号補強土壁基礎部の鉄筋挿入と16号切土補強土法面部の鉄筋挿入(法面補強)を行っています。  
【今後の予定】16号切土補強土(法面補強工事)・11号補強土壁(擁壁)の基礎工事(鉄筋挿入)→(足場の解体)を2月末まで施工します。


## 工事現場の施工状況

## 監理技術者のコメント

施工状況  
(12月末)



施工状況  
(1月末)



現在、法面補強工事と擁壁工事を並行作業で進めておりますが、擁壁部は足場の組立が完了し、1月末より鉄筋挿入を開始しました。法面補強部の鉄筋挿入は2月中旬に完了予定です。  
寒さの厳しい毎日ですが、今後も安全に細心の注意を払い健康管理に留意し、工期短縮を図り早期完成を目指し頑張ります。



監理技術者 米田 剛

**OhYAMA (株) 大山建設**

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-1700  
077-549-1705

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年2月15日



バックナンバーは  
QRコードを眺込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事  
工期：令和3年1月8日～令和4年3月22日

2月

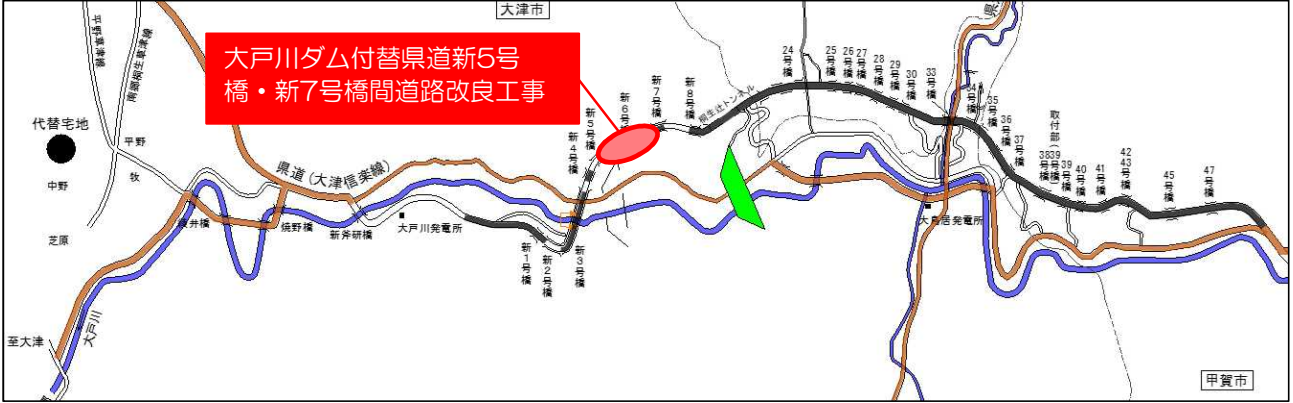

## 切土補強土工

## 施工状況写

## 防護柵基礎工

## 現場代理人コメント



削孔後鉄筋挿入状況



プレキャストガードレール基礎据付状況

現在、新5号橋～新6号橋間にて切土補強工（鉄筋挿入工）及び、防護柵工（プレキャストガードレール基礎工）の作業を行っております。  
工事完工に向け作業員一同、コロナウイルス感染対策を実施しながら、安全第一で工事を進めて参ります。  
今後ともご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。

現場代理人  
佐野 邦生



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年2月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事  
工期：令和3年6月17日～令和4年6月15日

2月

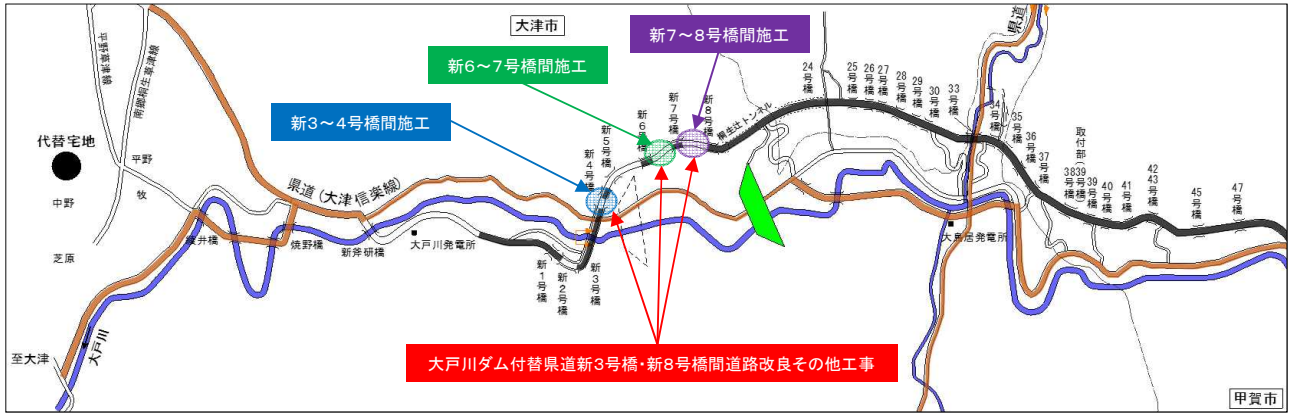

工事現場全景(新3号橋から新8号橋に向けて)



工事現場全景(新8号橋から新3号橋に向けて)



新6~7号橋間施工箇所



新7~8号橋間施工箇所



現場代理人：寺内 敬嗣

新6~7号橋間では11号切土補強土壁掘削が施工完了間近です。10号補強土壁については基礎部分のコンクリートを今月中に打設完了の予定です、引き続き軽量盛土を施工していきます。  
新7~8号橋間では基礎部分の掘削を着手していく予定です。工程の短縮を図り早期完成を目指します。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



株式会社 アクト

現場事務所  
電話

大津市上田上桐生町地先  
077-549-0010


# 大津信楽線付替工事ニュース

令和4年2月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新2号橋上部工事  
工期：令和3年4月1日～令和4年3月10日

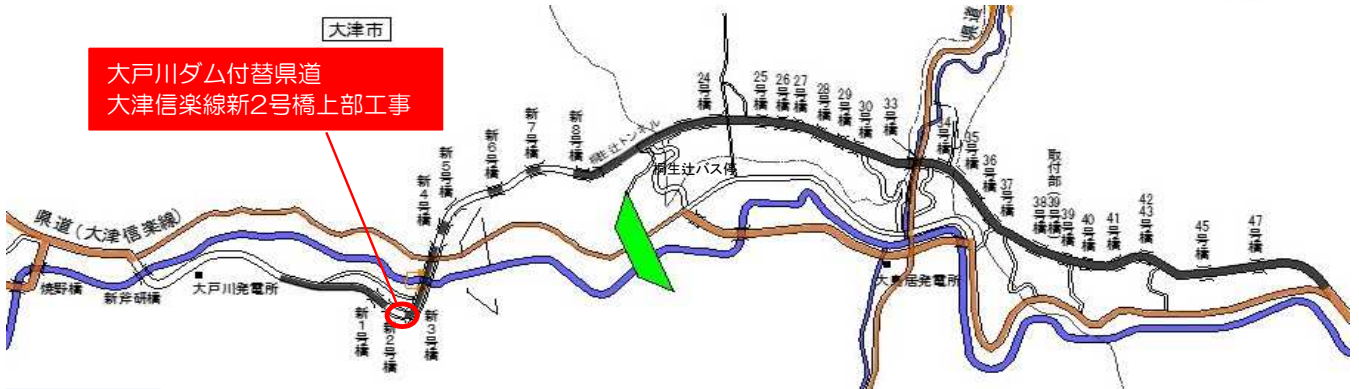

【現在の作業】 壁高欄工のコンクリート打設に向けて、型枠組立作業を進めています。  
【今後の予定】 2月中旬に壁高欄のコンクリート打設を行い、2月末から足場の解体作業を進めていきます。

## 工事現場の施工状況

### 施工状況（1月中旬） 壁高欄鉄筋組立

床版工コンクリート打設を終えて、壁高欄工施工に向けて、鉄筋組立を進めております。



### 施工状況（1月末）

壁高欄工鉄筋組立完了後、排水工の設置作業を進めております。



## 監理技術者のコメント

1月初旬に、床版コンクリート打設を終了し、1月中旬より壁高欄工の施工を進めております。  
工事作業としては、壁高欄工が最後のコンクリート打設となるため、最後まで安全に施工を進めていきます。  
2月末には、橋梁の構築作業が全て完了し、施工に使用した足場の解体作業を残すのみとなります。  
足場解体作業は、高所作業で大きな危険の可能性がありますので、最後まで気を引き締め、安全に進めていきます。  
今後ともご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。



監理技術者 稲葉 諒



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年2月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ


工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新5号橋上部工事  
工期：令和3年3月31日～令和4年3月25日

2月

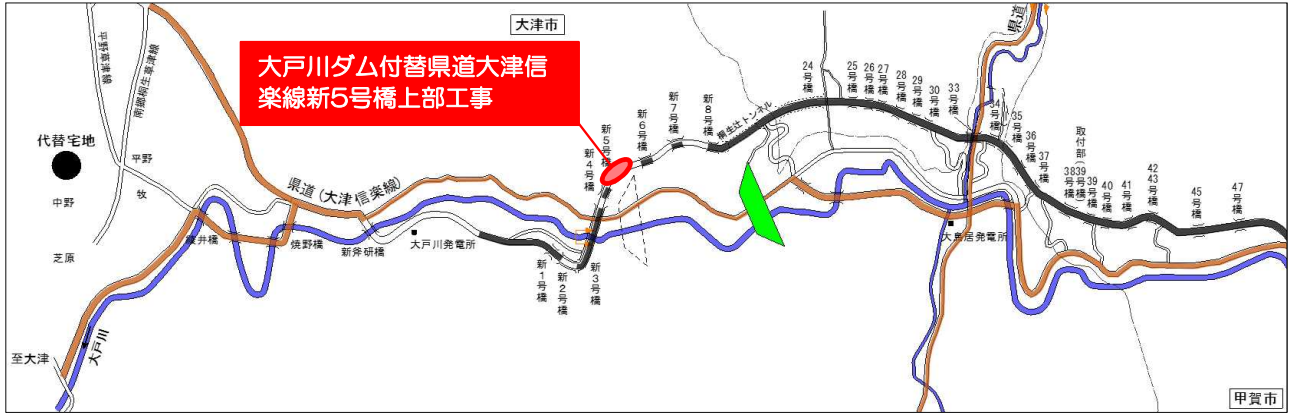

【現在の作業】 「壁高欄」の型枠解体、「伸縮装置」の据付等を行っています。

## 現在の施工状況

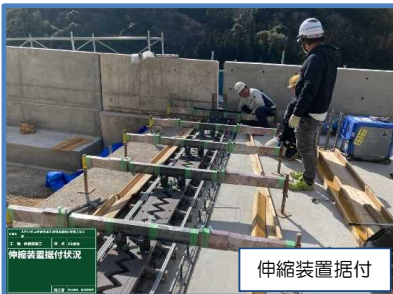

伸縮装置据付



壁高欄コンクリート打設

壁高欄のコンクリートの打設も完了し工事も残すところ後わずかとなりました。今月は伸縮装置、防護柵の設置を行い、足場解体を予定しています。今後も現場一丸となり無事故・無災害での完工を目指してまいります。今後ともご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人  
實 扇太郎



株式会社 **名村造船所**  
NAMURA SHIPBUILDING CO.,LTD.

現場事務所 大津市上田上桐生町地先  
TEL&FAX 050-5444-5662

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年2月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事  
工期：令和3年8月5日～令和4年4月9日

2月

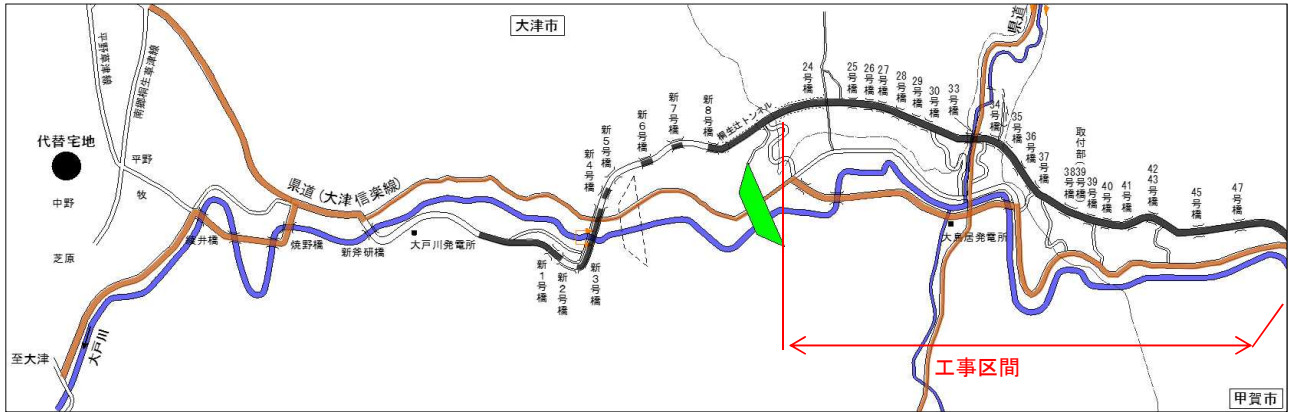

工事現場全景(大津から甲賀に向けて)



工事現場全景(甲賀から大津に向けて)



現場代理人：野々村 英樹

令和4年1月中頃から現道大津信楽線を片側交互通行規制での舗装工の作業をしてまいりました。みなさまのご理解・ご協力で作業を無事終了することができました。引き続き、付替県道(本線)での作業は進めさせていただきますのでよろしくお願いします。



株式会社 アクト

現場事務所  
電話

大津市上田上桐生町地先  
077-549-0010

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年2月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事  
工期：令和3年8月11日～令和4年2月28日

2月

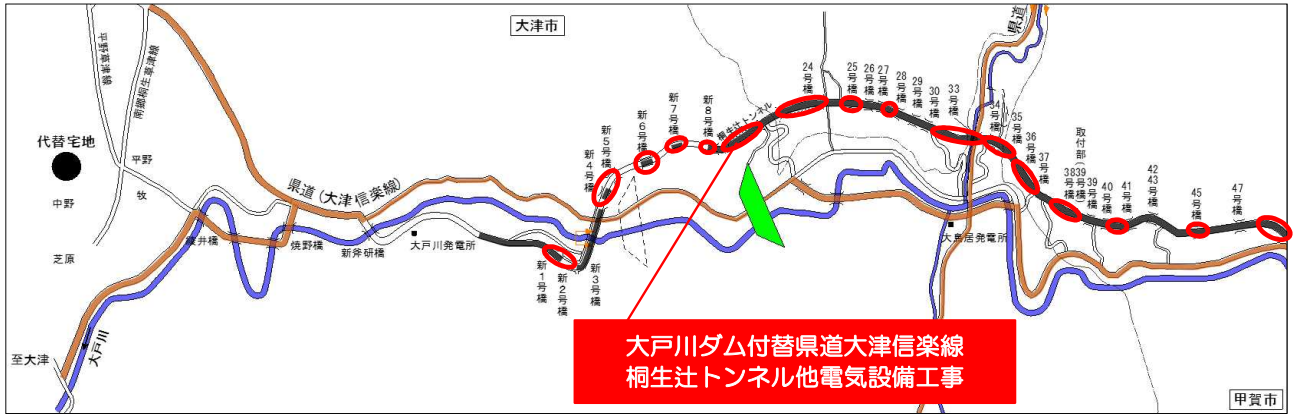

【現在の作業】 埋設配管敷設作業等を行っています。



先月から開始した、トンネル照明用分電盤設置、埋設配管敷設作業が完了しました。

今月は、トンネル照明器具設置、道路照明柱用基礎コンクリート打設、凍結注意表示板設置を行っていきます。

今月もまだ寒い時期が続きますが体調管理に気を付けて安全第一にて作業を行って参ります。今後もご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

