

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年5月1日



バックナンバーは  
QRコードを読み  
込み大戸川ダム工事  
事務所HPへ



工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事  
工期：令和2年11月7日～令和4年8月31日

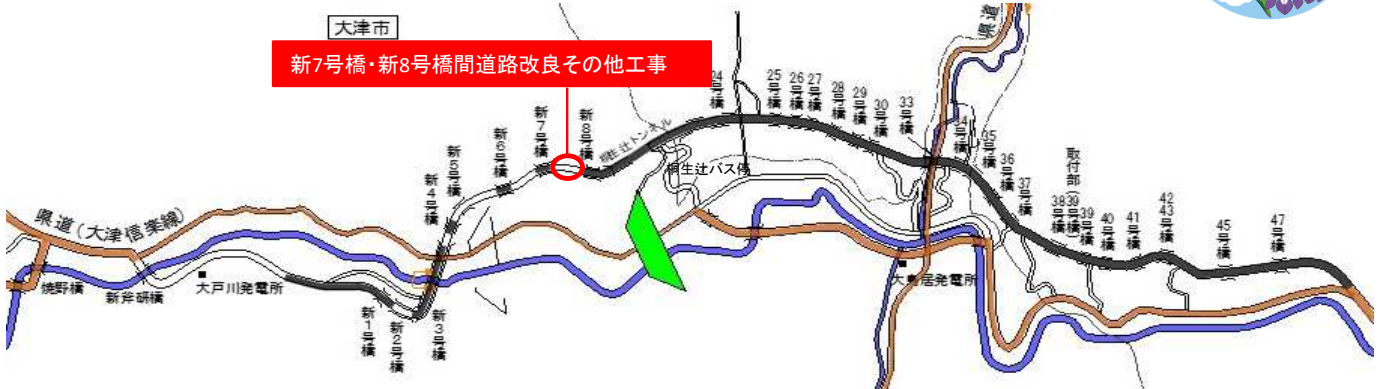


【現在の作業】11号補強土壁基礎部、基礎コンクリートの鉄筋組立(1回目)を行っています。  
【今後の予定】11号補強土壁基礎部の型枠組立 → コンクリート打設を2回行います。(1回目26.5m、2回目26.5m)

## 工事現場の施工状況

## 監理技術者のコメント

施工状況  
(3月末)

施工状況  
(4月末)



・法面工事は植生基材(種子)吹付を行い完成しました。  
・擁壁工事は基礎コンクリート(左記図)の施工を行っています。擁壁の土台となる基礎は5月中の完成予定で6月より、擁壁本体の施工を開始します。今後も安全に十分留意し早期完成を目指し進めて参ります。今後もご理解とご協力を宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

**OhyAMA (株) 大山建設**

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-1700  
077-549-1705



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年5月15日



ハッシュタグは  
QRコードを眺込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事  
工期：令和3年6月17日～令和4年6月15日

5月

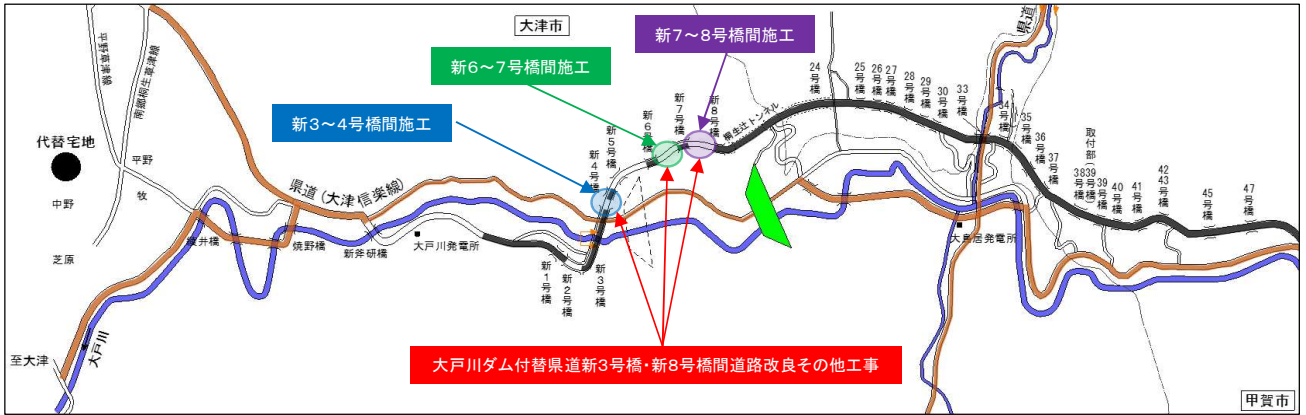

工事現場全景(新3号橋から新8号橋に向けて)




新3～4号橋間施工箇所



新6～7号橋間施工箇所



新7～8号橋間施工箇所

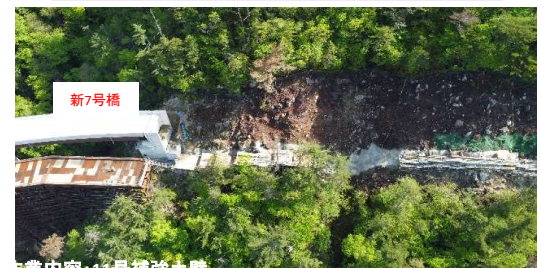

工事現場全景(新8号橋から新3号橋に向けて)



現場代理人：寺内 敬嗣

新6～7号橋間の10号補強土壁については軽量盛土工を17段目まで完了しました。3号橋～4号橋にかけては剛性防護柵基礎を完了、引き続き盛土を開始したいと思います。7号橋～8号橋については、足場組立を完了しルートパイル打設を開始地山状況を確認し転石の落石事故等ないように作業を行います。ご協力の程、宜しくお願いたします。



株式会社 アクト

現場事務所  
電話

大津市上田上桐生町地先  
077-549-0010



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年5月16日



ハッシュタグは  
QRコードを眺込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事  
工期：令和3年8月5日～令和4年6月15日

5月

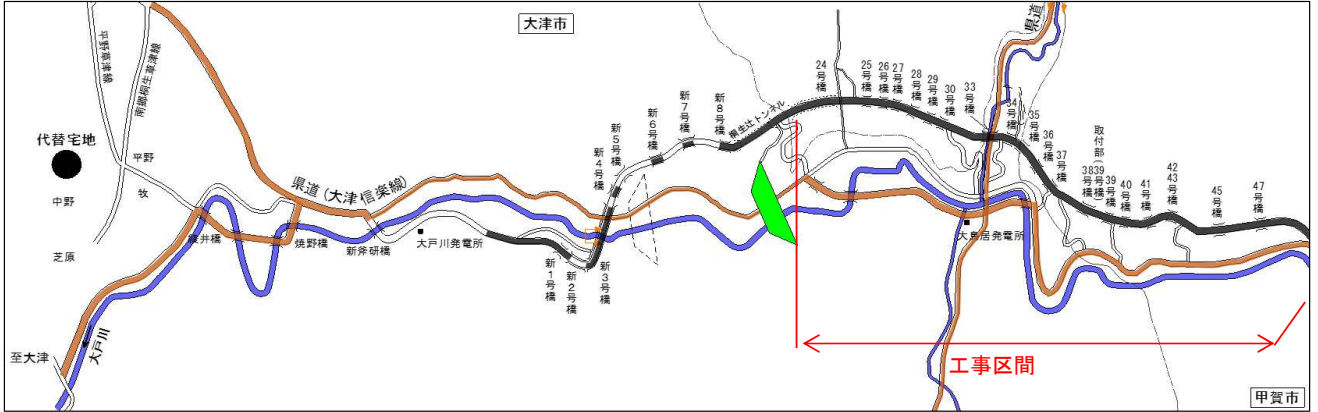

工事現場全景(大津から甲賀に向けて)



工事現場全景(栗東から甲賀に向けて)



現場代理人：野々村 英樹

本工事もあと残すところ1ヶ月となりました。工事完工に向けて作業員一同安全第一で工事を進めて参りますので引き続き、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



株式会社 アクト

現場事務所  
電話

大津市上田上桐生町地先  
077-549-0010



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年5月16日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事  
工期：令和3年8月11日～令和4年11月30日

5月

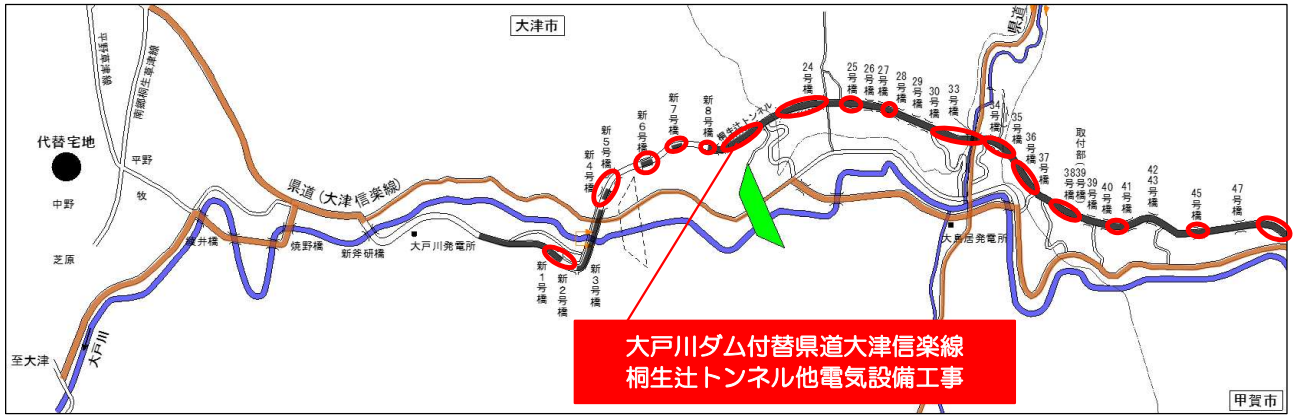

大鳥居橋(33号橋)

：凡例取付箇所

工事名	大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工程	道路照明設備工事
撮影箇所	大鳥居橋(33号橋)起点側
撮影内容	4月度出来形
受注者	株式会社デューイテクニカル

大鳥居橋(33号橋)(大津方面)から撮影



大鳥居橋(起点側)



大鳥居橋(終点側)



新2号橋(起点側)



37号橋(起点側)

【現在の作業】 橋梁配管添架作業等を行っています。



配管添架状況



ボルトマーキング状況



ボルトマーキング状況



プルボックス取付状況

大鳥居橋の橋梁配管作業が完了しました。この作業には橋梁点検車を2台使用し配管を添架しました。職人さんは20m以上の高所にもかかわらず何もなかったように作業されてました。とても頼もしいですね。

今月はトンネル照明のケーブル配線作業、道路照明柱建柱、接地工事を行います。

施工困難な事がありますが、社員一丸となって知恵を出し、安全第一に引き続き作業を行って参ります。今後もご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人  
下矢 智一



株式会社デューイテクニカル

現場事務所  
電話

大津市上田上桐生町地先  
077-549-0007



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年5月



バックナンバーは  
QRコードを讀込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事  
工期：令和4年2月19日～令和4年9月30日

5月

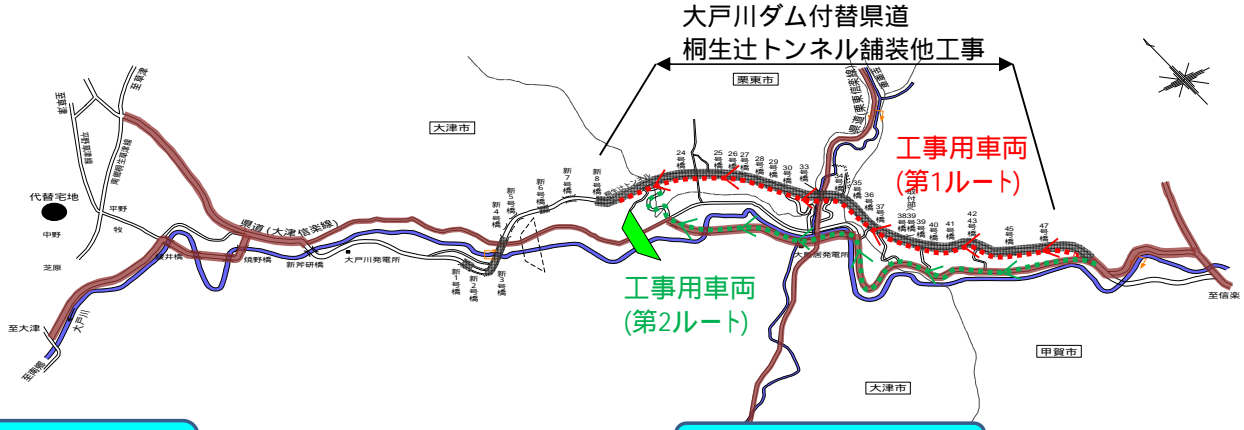

桐生辻トンネル  
(大津側より)




24号橋 (大津側より)



【現在の作業】 現地測量及び防護柵工 (嵩上げ) の工場製作を行っております。  
【今後の予定】 引き続き、現地測量及び防護柵工 (嵩上げ) の工場製作を行います。

24号橋  
(着工前)

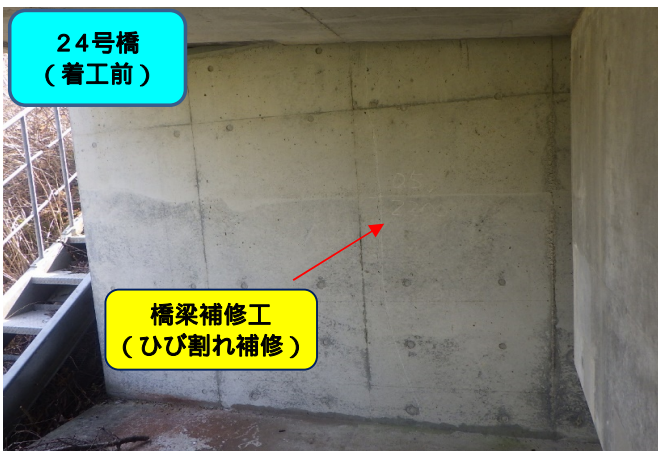

## 現場代理人コメント

安全第一で進めてまいります。  
宜しくお願いいたします。

現場代理人  
香水 達弥



DYNAMIC SHOKEN  
株式会社 昭建

昭建

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-552-4118  
077-553-8414



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和4年5月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事  
工期：令和4年2月22日～令和4年10月21日

5月

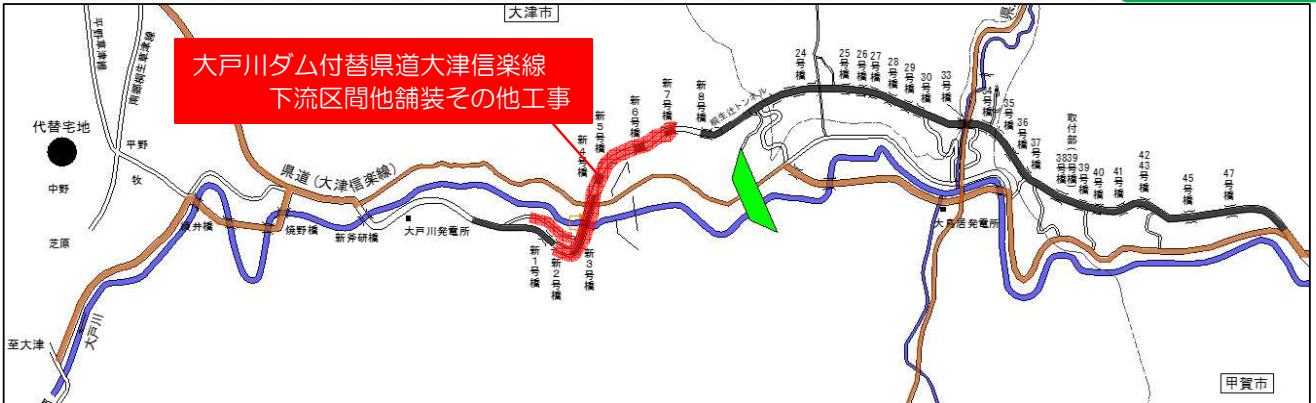

付替県道（新7号橋から新2号橋間）



### ■主な工事内容

ブロック積工、排水構造物工、橋梁附属物工、防護柵工、アスファルト舗装工、区画線工他

### ■現在の作業

市道(左岸線)で準備工(除草)を行っています。

### ■今後の作業予定

市道(左岸線)でのブロック積工の施工が主体となります。

市道(左岸線) 法面除草



(市道(左岸線))



### 現場代理人コメント

5月のゴールデンウィーク明けより準備工事に着手いたしました。雨の日が多くなってきました。

これから、工事車両の搬出入も増えていきますが、一般車両優先を徹底致しますので、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。

現場代理人  
大山 隆



未来につなぐ確かな道づくり  
 戸田道路株式会社

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上牧町斧研  
050-5371-1865  
050-5371-1866
