


平成28年10月末 工事現場 えいへいじおおの えいへいじ かみしひ
 永平寺大野道路 (永平寺IC～上志比IC)

★轟地区では、橋梁上部の架設が進み、谷口～花谷地区では一部舗装を施工しています。



定点写真-① 轟地先(福井向き)

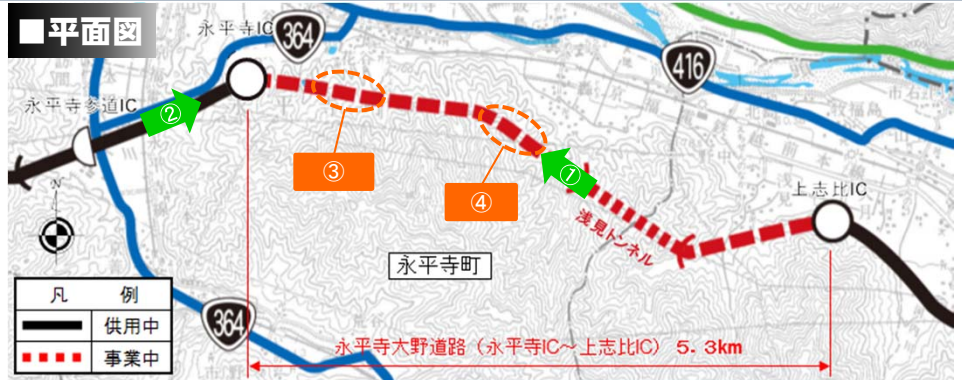

定点写真-② 永平寺IC(大野向き)



全体の状況(谷口から花谷方面)



舗装の施工状況(花谷地区)

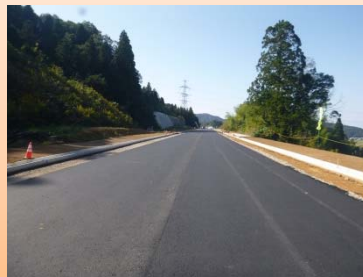


写真-③:谷口～花谷地区

・舗装の施工状況

アスファルト舗装(基層)を施工しました。
 今後、永平寺ICから花谷・光明寺地区への資機材搬入のための工事用道路として使用していきます。

全体の状況(轟2・3号橋)



架設状況(轟3号橋)



写真-④:轟地区

・橋梁上部の施工状況

轟2号橋・轟3号橋(仮称)の主桁架設11月中に完了し、床版・高欄の施工に移行していきます。

