

熊野川流域における民有林直轄治山事業の 取組状況について

令和3年12月
近畿中国森林管理局
計画保全部 治山課



国民の森林・国有林

近畿中国森林管理局



十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況①

- 本地区では、平成23年9月の台風12号に伴う豪雨により多数の大規模な崩壊が発生し、甚大な被害となったことから、被災箇所の早期復旧を図るため、奈良県吉野郡十津川村、野迫川村、天川村、五條市大塔町において緊急かつ計画的に復旧事業を実施中。
- 令和3年度は14箇所において溪間工6基、山腹工10箇所を計画しており、現在14箇所において溪間工6基、山腹工7箇所を実行中、山腹工3箇所完成。




①赤谷b(被災時)



②檜股(被災時)



③五百瀬2号地(被災時)

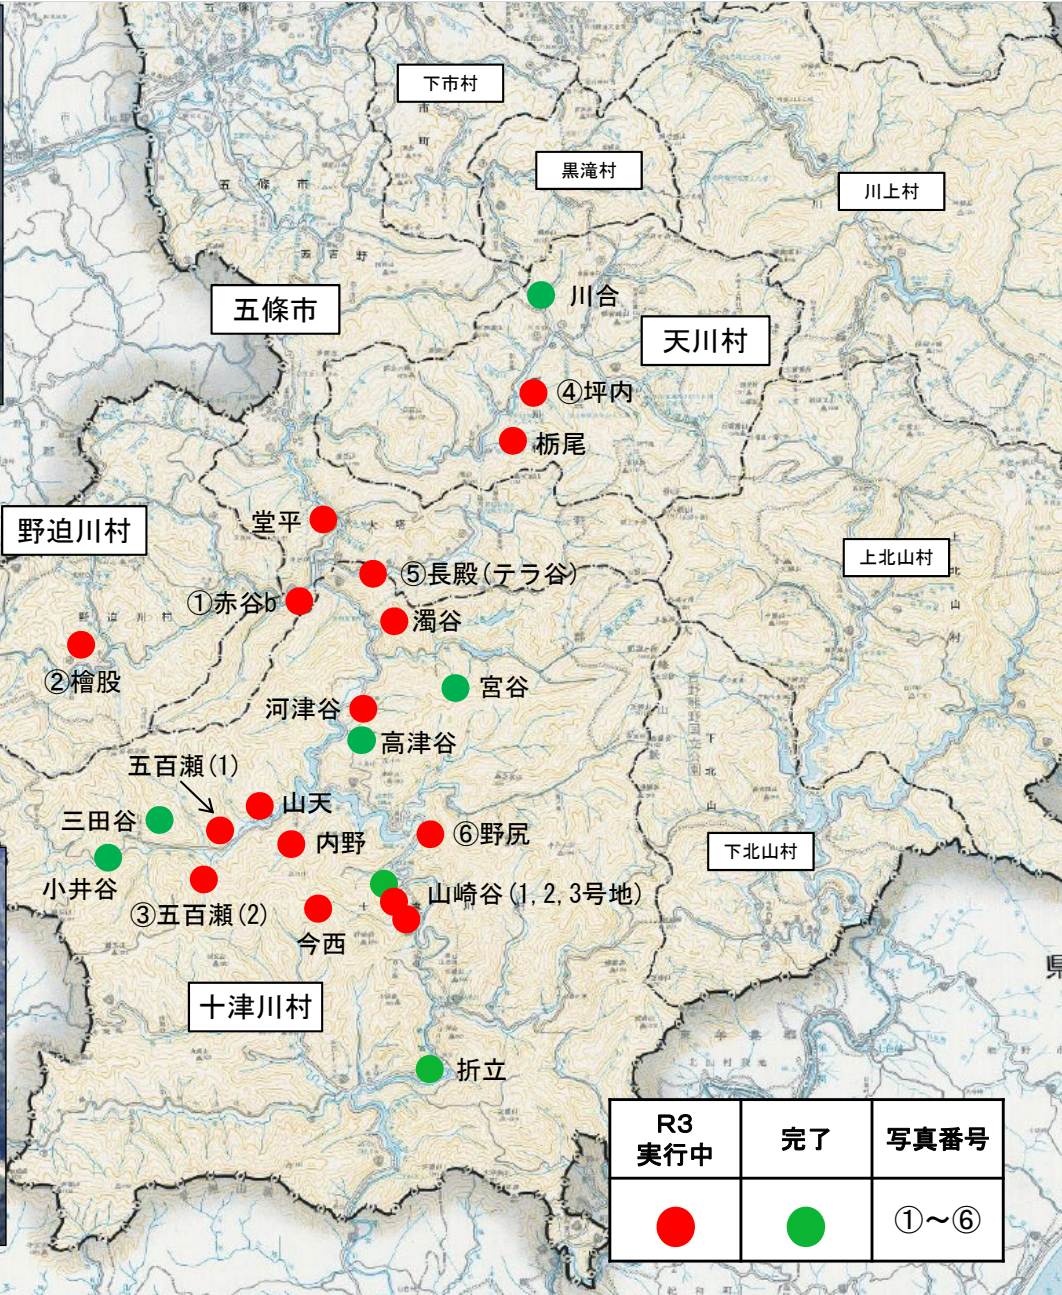

④坪内(被災時)



⑤テラ谷(被災時)



⑥野尻(被災時)

R3 実行中	完了	写真番号
●	●	①~⑥

十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況②

OR 3 実行状況

① テラ谷 (R3. 6月撮影)



山腹工(簡易法砕吹付工・モルタル吹付工)

② 河津谷 (R3. 9月撮影)




溪間工(床固工)

③ 檜股 (R3. 10月撮影)



山腹工(大型かご砕土留工)

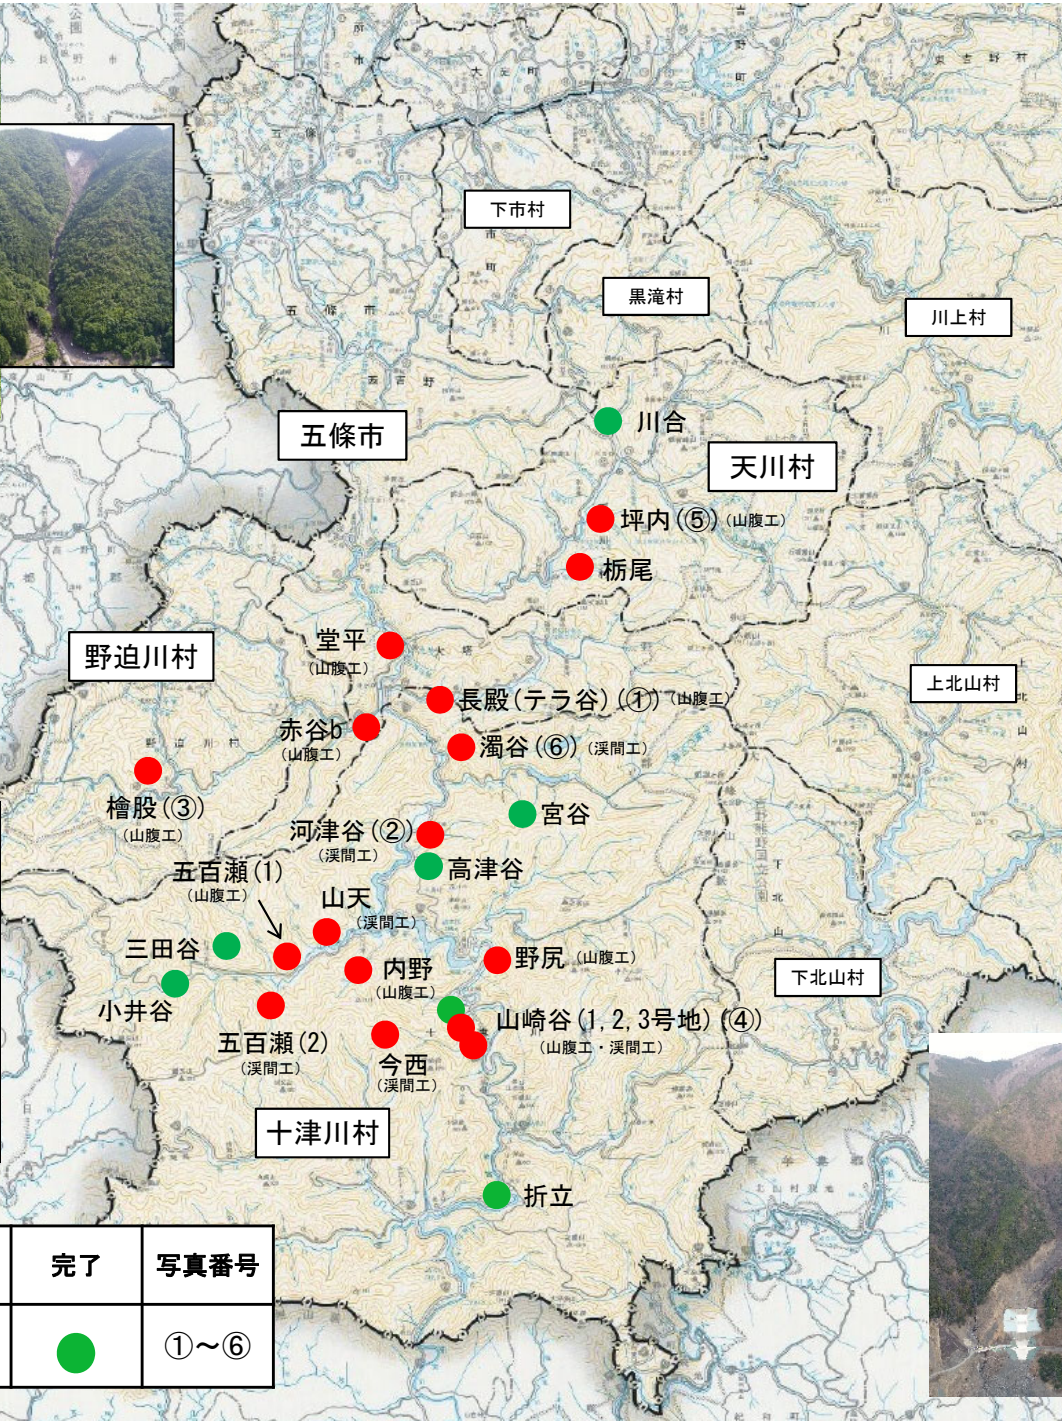

④ 山崎谷 (R3. 6月撮影)



山腹工(法砕工)

溪間工(谷止工)

⑤ 坪内 (R3. 11月撮影)



山腹工(排土工)

⑥ 濁谷 (R3. 6月撮影)



溪間工(谷止工)

R3 実行中	完了	写真番号
●	●	①～⑥

十津川地区民有林直轄治山事業の取組状況③


〇完了箇所

①三田谷 (完了)



溪間工(鋼製谷止工・コンクリート護岸工)
山腹工(簡易法枠工・モルタル吹付工・コンクリート土留工・緑化工)

②小井谷 (完了)

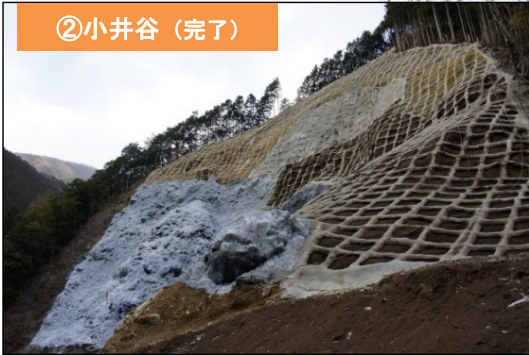

山腹工(法枠工・モルタル吹付工・緑化工)

③高津谷 (完了)



山腹工(法枠工・モルタル吹付工・緑化工)
溪間工(谷止工・護岸工)

④川合 (完了)



山腹工(土留工・法枠工・緑化工)

⑤山崎谷 1号地 (完了)




山腹工(法枠工・モルタル吹付工・緑化工)
溪間工(護岸工)

⑥折立 (完了)




山腹工(法枠工・土留工・緑化工)

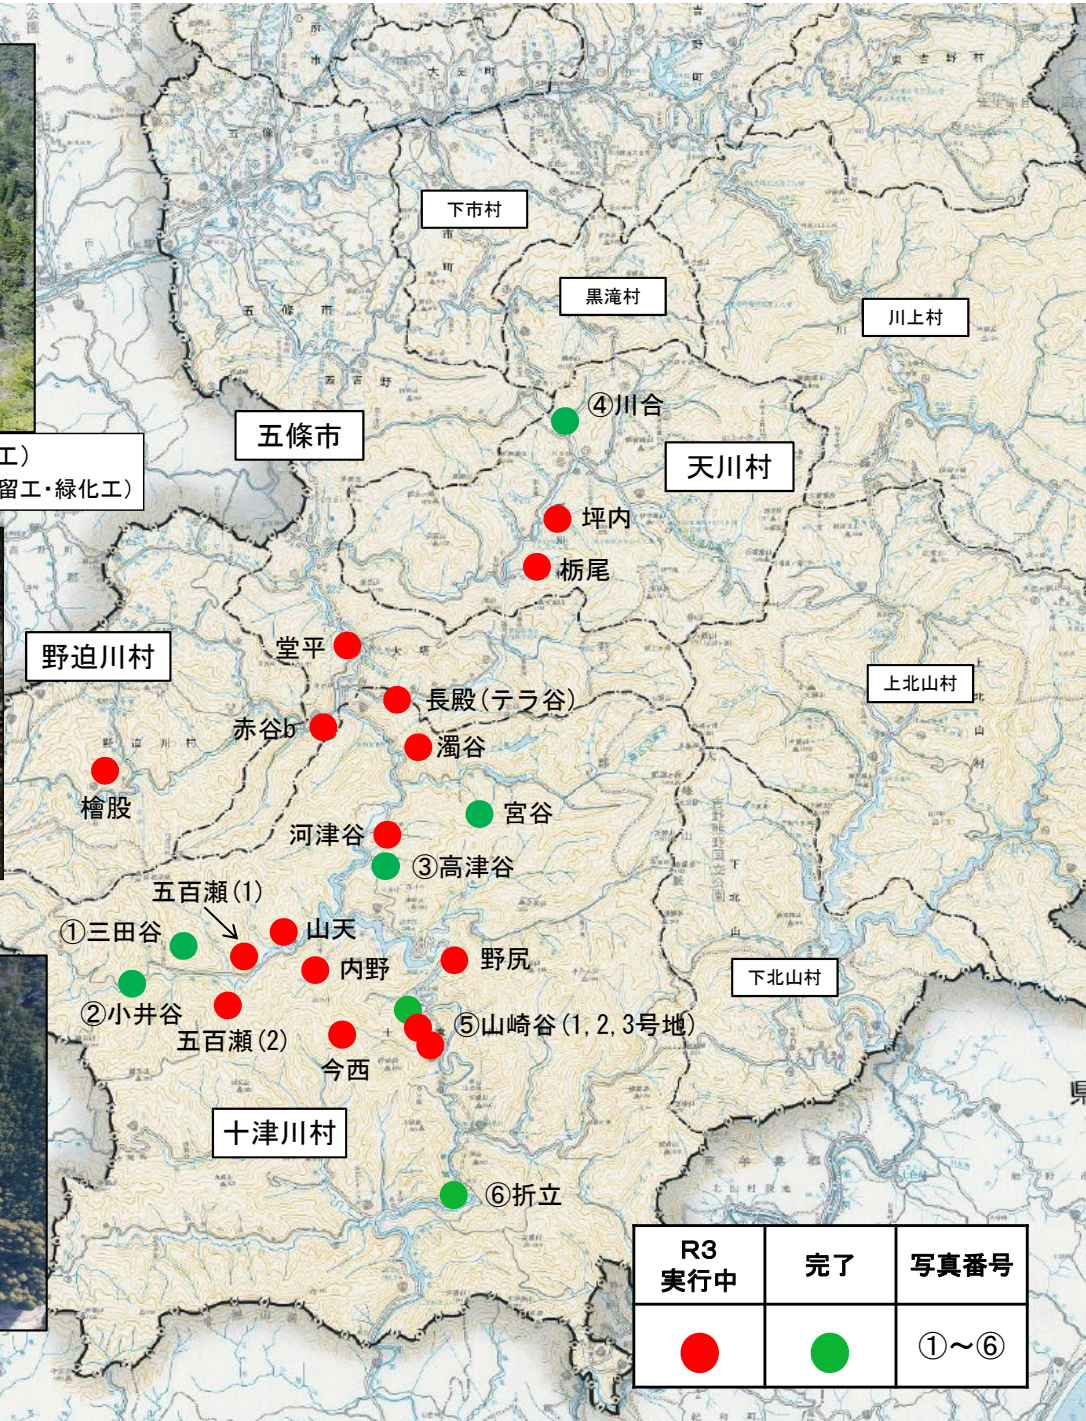

R3 実行中	完了	写真番号
●	●	①～⑥

紀伊田辺地区民有林直轄治山事業の取組状況①

- 本地区では平成23年9月の台風12号災により発生した荒廃箇所の早期復旧を図るため、平成24年度より、和歌山県田辺市内の6箇所において民有林直轄治山事業として事業着手。平成27年度に工事が完了した菖蒲谷区域を和歌山県へ移管し、平成29年度より上秋津区域を追加、令和3年度には八升前区域、愛賀合区域を和歌山県へ移管し、現在4箇所において事業を実施中。
- 令和3年度は4箇所において山腹工4箇所を計画しており、現在3箇所を実行中。

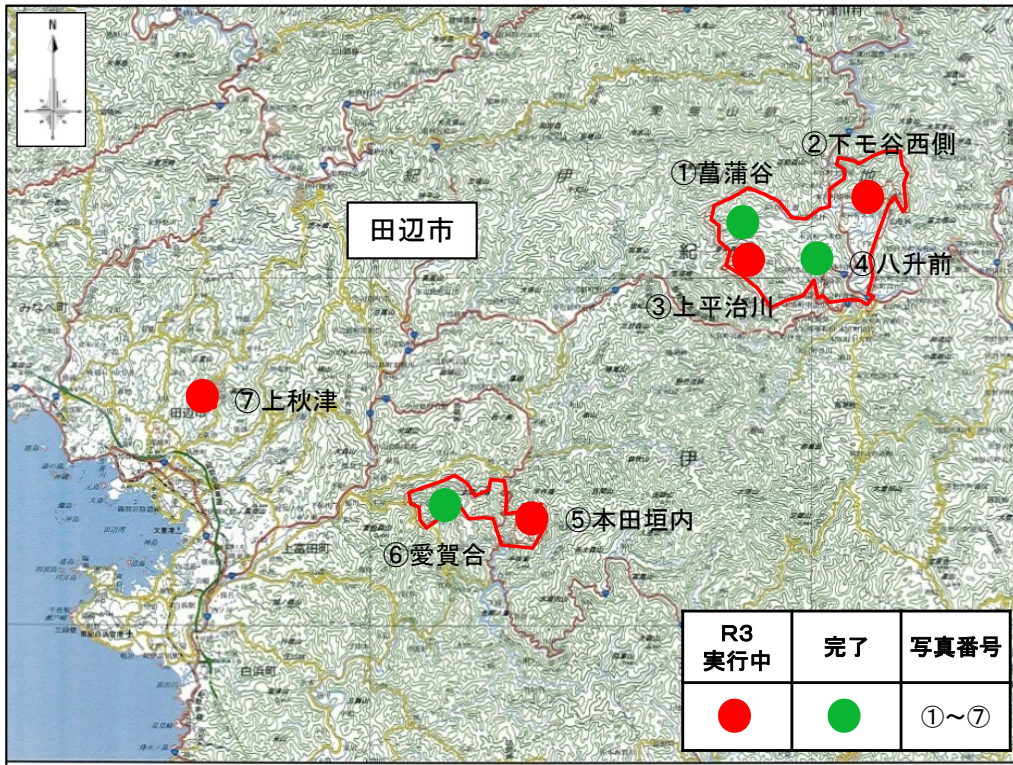

紀伊田辺地区民有林直轄治山事業の取組状況②

OR3 実行状況

