



河道内堆積土砂対応状況【和歌山県】

令和4年5月現在

資料2-4

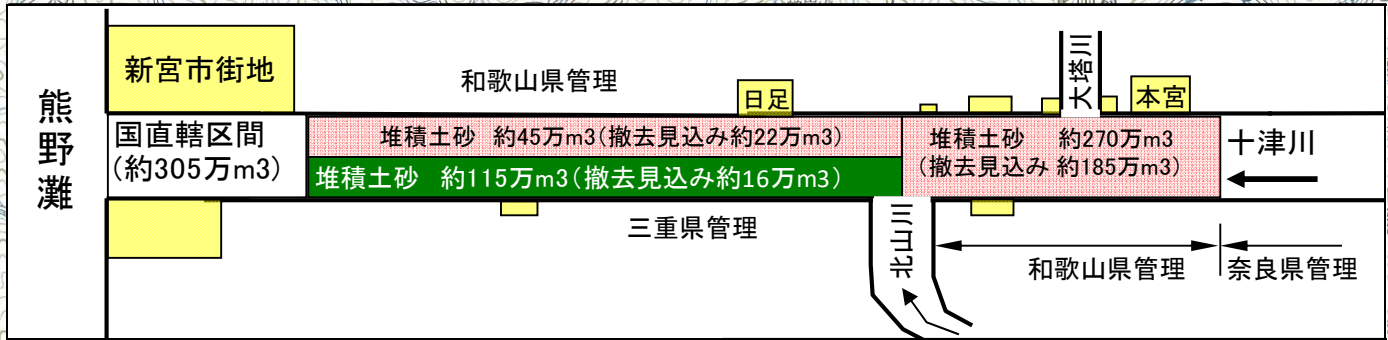

注1:堆積土砂量は、水面上0.5m以上の堆積土砂量であり、台風12号で堆積した土砂量とは異なる。
注2:撤去見込み量には、撤去済み量を含む

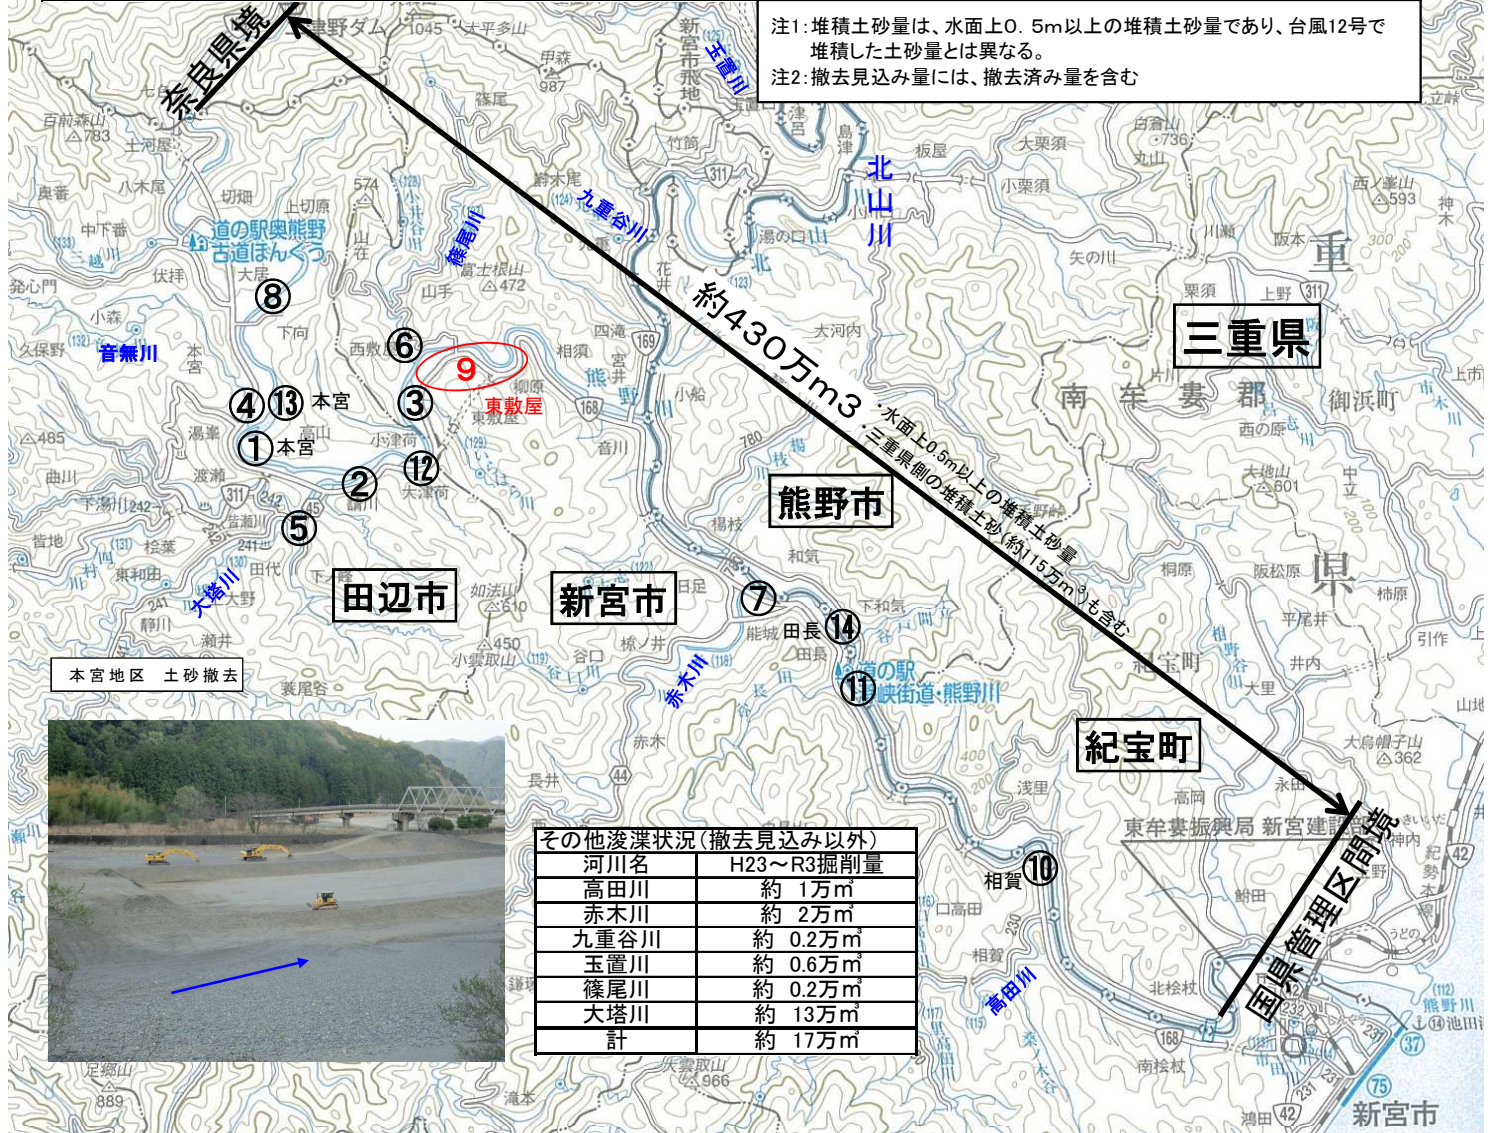

その他浸没状況(撤去見込み以外)

河川名	H23~R3掘削量
高田川	約 1万m ³
赤木川	約 2万m ³
九重谷川	約 0.2万m ³
玉置川	約 0.6万m ³
篠尾川	約 0.2万m ³
大塔川	約 13万m ³
計	約 17万m ³

土砂撤去状況								
NO	河川名	地区名	工事名	実施主体	R3まで	R4掘削予定量	総掘削量	計画年度
①	熊野川	田辺市 本宮	交付金	県	約 40万m ³	—	約 40万m ³	完了
②	熊野川	田辺市 請川	20条工事	市	約 44万m ³	—	約 44万m ³	完了
③	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 2万m ³	—	約 2万m ³	完了
⑦	熊野川	新宮市 日足	推進費	県	約 7万m ³	—	約 7万m ³	完了
⑧	熊野川	田辺市 大居	推進費	県	約 20万m ³	—	約 20万m ³	完了
⑨	熊野川	新宮市 東敷屋	一般採取	民間	約 24万m ³	約 4万m ³	約 40万m ³	H25~
⑩	熊野川	新宮市 相賀	一般採取	民間	約 2万m ³	—	約 3万m ³	H25~
⑪	熊野川	新宮市 日足	推進費	県	約 7万m ³	—	約 7万m ³	完了
⑫	熊野川	田辺市 小津荷	20条工事	市	約 14万m ³	—	約 14万m ³	完了
⑬	熊野川	田辺市 本宮	20条工事	市	約 5万m ³	—	約 17万m ³	H29~
⑭	熊野川	新宮市 田長	交付金	県	約 5万m ³	—	約 5万m ³	完了
熊野川合計					約170万m ³	約 4万m ³	約199万m ³	
④	音無川	田辺市 一本松	国災	県	約 1万m ³	—	約 1万m ³	完了
⑤	大塔川	田辺市 川湯	国災	県	約 6万m ³	—	約 6万m ³	完了
⑥	篠尾川	新宮市 西敷屋	国災	県	約 1万m ³	—	約 1万m ³	完了
支川合計					約 8万m ³	—	約 8万m ³	
全体					約178万m ³	約 4万m ³	約207万m ³	
