


大津信楽線付替工事ニュース

令和4年7月



バックナンバーはQRコードを眺込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
 工期：令和2年11月7日～令和4年8月31日

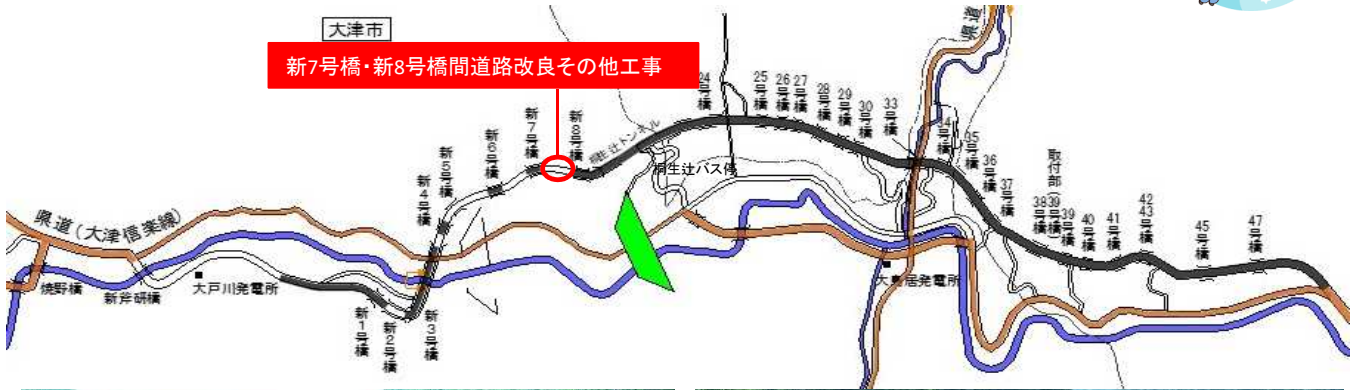

【現在の作業】 11号補強土壁擁壁部の支柱建込 → 壁面材設置 → 軽量盛土材設置を施工中です。
 【今後の予定】 11号補強土壁(今回施工部)を8月初旬に完成させる予定です。

工事現場の施工状況

監理技術者のコメント

施工状況 (5月末)

施工状況 (6月末)

軽量盛土
18段目まで施工

新7号橋 11号補強土壁(擁壁工事) 16号切土補強土(法面工事)

6月初旬より(左記図)の軽量盛土を開始しました。弊社の施工する(今回施工)範囲を1日でも工期短縮を図ることを目標に作業従事者全員で日々頑張っております。毎日暑い日が続きますが、作業員さんを増員し無理のない施工で安全に短縮を図り、早期完成を目指して進めて参ります。今後ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

OhYAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年7月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和4年10月31日

7月

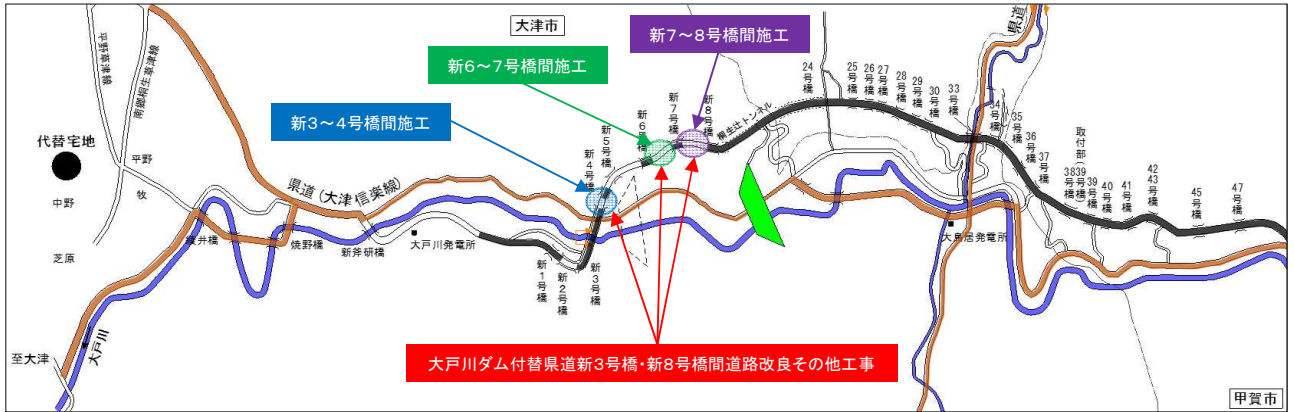

新3～4号橋間施工状況

令和4年6月 7号切土補強土工(切土済、盛土施工中)



新3号橋

新4号橋

令和4年7月 7号切土補強土工(盛土完成)



新3号橋

新4号橋

新6～7号橋間施工状況

11号切土補強土工(切土済)



令和4年6月

新6号橋

11号切土補強土工(水路施工中)



令和4年7月

新6号橋

10号補強土壁(盛土施工中)



新7号橋

10号補強土工(切土着手、盛土施工中)



新7号橋

新7～8号橋間施工状況

令和4年6月 基礎杭施工中



新7号橋

令和4年7月 基礎杭完了、基礎工施工



新7号橋

現場代理人：寺内 敬嗣

新3号橋～5号橋にかけ他現場に引き渡しをおこないました。新6号橋～新7号橋に於いては
法面掘削、排水構造物をメインに施工中です。新7号橋～新8号橋は6月よりルートパイルの打設に
続き鉄筋組立、型枠組立と順調に施工中です。引き続き無事故にて取り組みます。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年7月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工期：令和3年8月11日～令和4年11月30日

7月

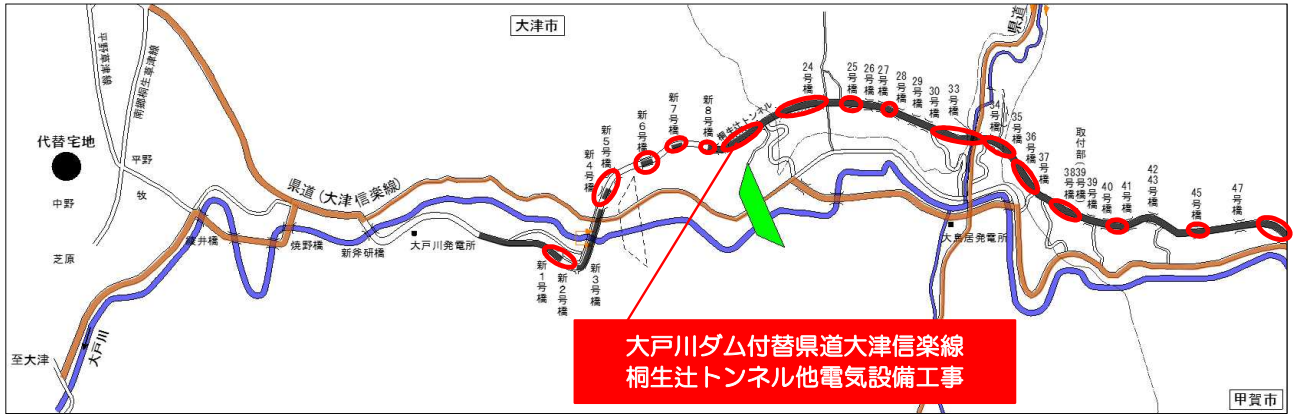

桐生辻トンネル(大津方面)から撮影



桐生辻トンネル(信楽方面)から撮影


【現在の作業】 照明柱の基礎工事を行っています。



トンネル照明分電盤に受電し、トンネル照明を点灯させ、すべての灯具の点灯を確認しました。今後トンネル内部の舗装工がありますので、トンネル照明を点灯して、安全に作業を行っていただけたと思います。

今月は道路照明柱建柱、接地工事を行っています。

熱中症対策、体調管理に気をつけ、安全第一に引き続き作業を行って参ります。今後もご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人
下矢 智一

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年7月



バックナンバーは
QRコードを讀込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事
工期：令和4年2月19日～令和4年9月30日

7月

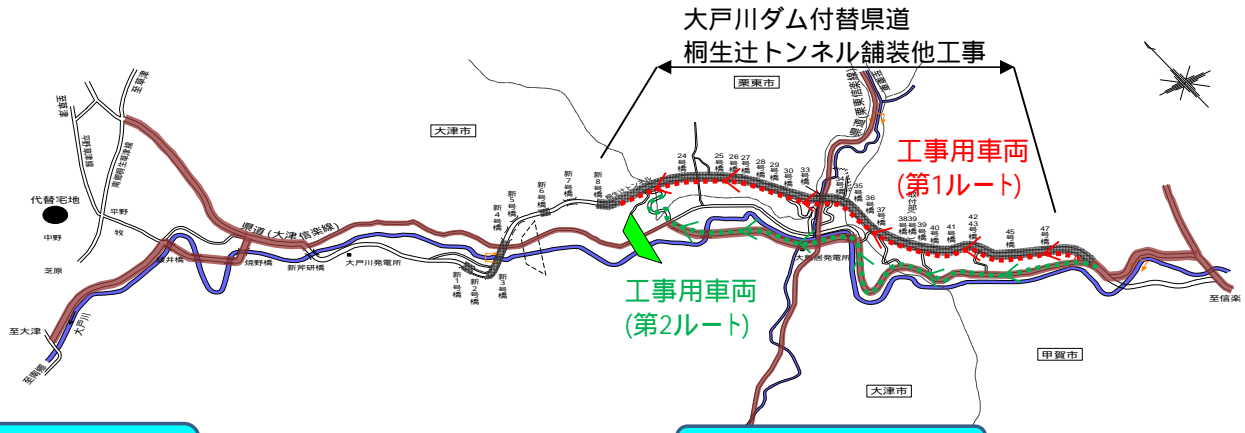

桐生辻トンネル
(大津側より)



トンネル工
(はく落・漏水対策)

舗装工
(コンクリート舗装)

24号橋 (大津側より)



防護柵工 (嵩上げ)

【現在の作業】防護柵工 (嵩上げ)・橋梁補修工を行っております。
【今後の予定】トンネル工(はく落・漏水対策)を行います。



橋梁補修工
(ひび割れ補修)

現場代理人コメント

暑い日が続きますが熱中症に注意して
頑張っております。
ご理解ご協力の程、宜しくお願い
いたします。

現場代理人
香水 達弥



DYNAMIC SHOKEN
株式会社 昭建

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1728
077-549-1728

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年7月



バックナンバーは
QRコードを隠込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事
工期：令和4年2月22日～令和4年10月21日

7月

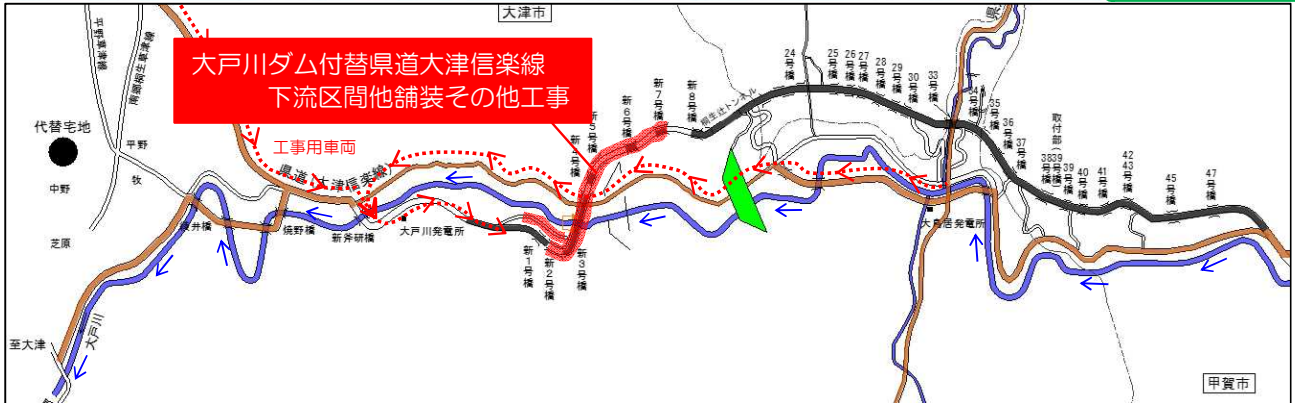

■現在の作業

市道(左岸線)において、側溝工、法面工、舗装工に向けて路床のすき取りを行っています。

■今後の作業予定

- ・市道(左岸線)で、引き続き側溝工、路床のすき取り、残土運搬を行います。
- ・県道部では、新3号橋～新6号橋間で踏掛版工を行います。

市道(左岸線) ブロック積工ほか 進捗状況

6月状況



7月状況



現場代理人のコメント

現在、市道(左岸線)の法面工、側溝工、道路の路床すき取りを行っております。引き続き「車両通行止め」によりご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。

現場代理人
大山 隆



未来につなぐ確かな道づくり
戸田道路株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上牧町斧研
050-5371-1865
050-5371-1866
