

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年4月18日

工事名:大津信楽線桐生地区進入路工事

〈工事の進捗〉

・施工を行うための計画を行っております。


〈今後の予定〉

・5月初旬より進入路(通路部)から着手予定です。

・新5号橋及び新6号橋への進入路設置の施工を行う、(株)金子工務店です。地域の方のご協力を得ながら進めて参りますので、よろしくお願いします。

【 平面図 】

【 断面図 】

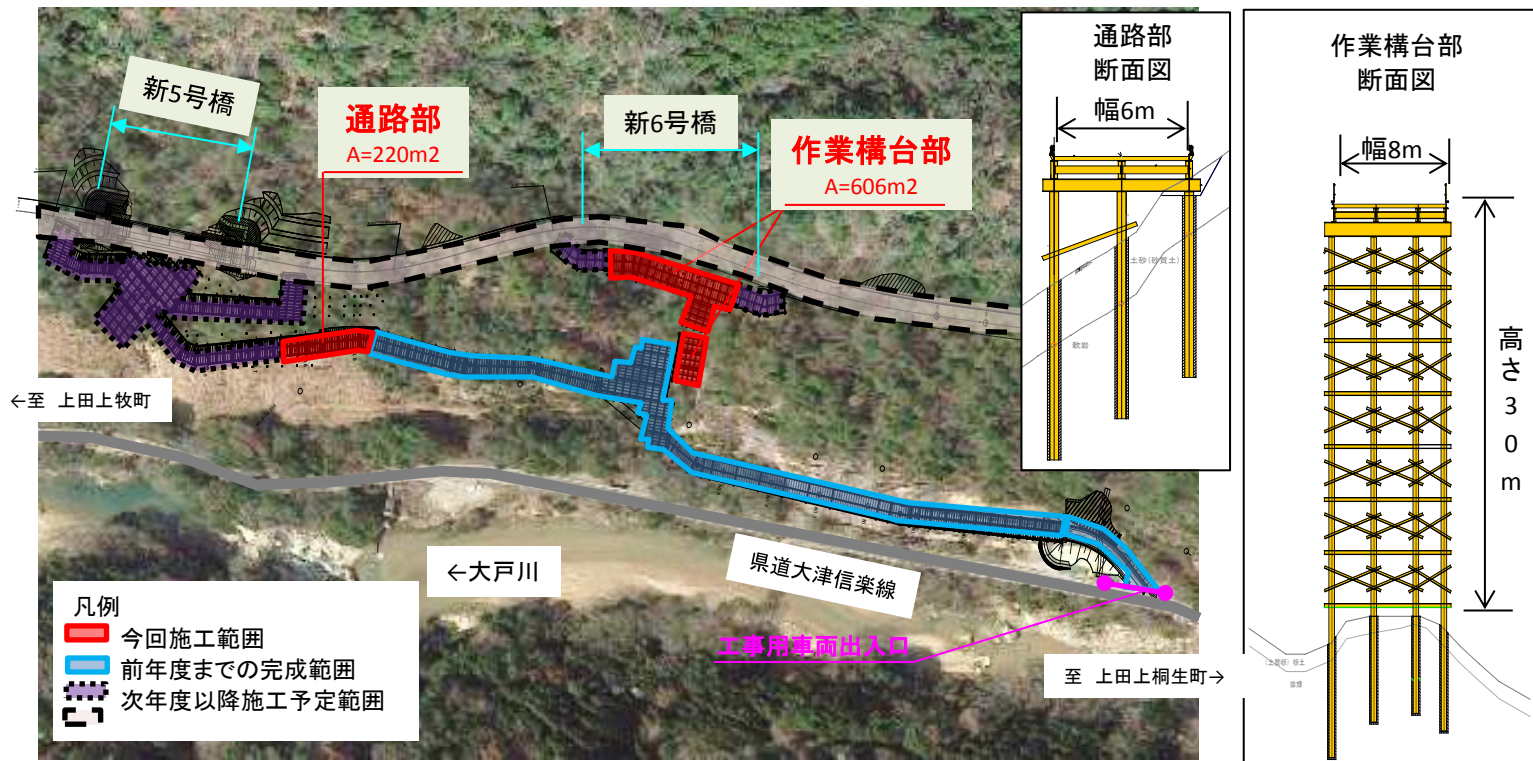

～ 現場代理人から一言 ～



2007年入社 33歳

工事の現場を担当する現場代理人の仁志出 徹です。よろしくお願いします。
今回の工事は、前年度までに完成した通路を利用し、作業用構台及び通路を延伸する工事となっています。工事期間中は、工事用車両出入口から工事に使用する重機及び資機材の搬入出を行います。搬入出車両は、主に10tトラックで、入口付近では徐行を行いながら、安全に作業を行います。

安全に早期完工を目指し努力いたしますので、何卒ご理解ご協力を頂ますようお願い致します。

【工程表】

	平成28年											平成29年		備考
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
準備工														
通路部														
作業構台部														
片付け工														

請負者:株式会社 金子工務店

現場事務所:滋賀県大津市上田上桐生町地先

現場担当者:仁志出 徹(現場代理人)

TEL: 077-549-1182

鷺坂 讓典(監理技術者)

FAX: 077-549-1182

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年4月18日

工事名:大津信楽線新2号橋下部工工事

〈工事の進捗〉

- ・施工を行うための計画を行っております。


〈今後の予定〉

- ・4月中旬より工事資材を運搬するための、モルールの設置に着手予定です。
- ・新2号橋 橋脚設置の施工を行います、(株)桑原組です。地域の方の御理解・御協力を得ながら進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

【施工箇所】



【側面図】

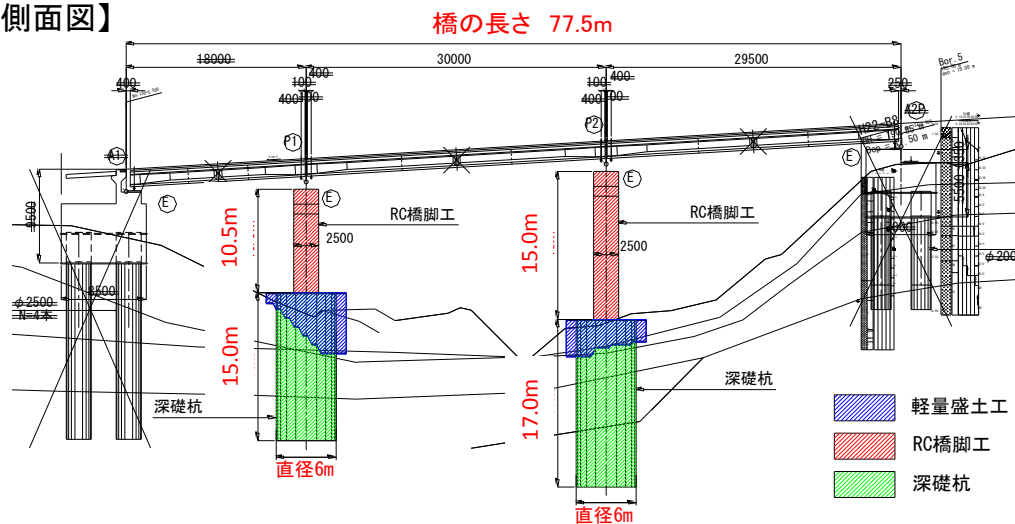

代理人の小林です。
この現場では、資材をモル
ールで運搬します。



使用するモルールです。
荷台には4tの資材を
積めます。



モルールのレールです。
ジェットコースターのような
最大傾斜約30度あります。

請負者: (株)桑原組
現場担当者: 小林 美良(現場代理人)
TEL: 090-3359-9975

現場事務所: 滋賀県大津市上田上桐生町地先
TEL: 077-549-1139
FAX: 077-549-1152

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年4月18日

工事名：大津信楽線新3号橋工事


〈工事の進捗〉

- ・【P1橋脚】 深礎杭の施工をしています。(鉄筋組立、コンクリート打設)
- ・【P2橋脚】 深礎杭の施工をしています。(岩塊掘削)
岩塊掘削の進捗を早めるため、発破を5日間に1回程度、1回あたり5分程度、1日1回(最大2回)の通行止めを行います。

平面図



側面図

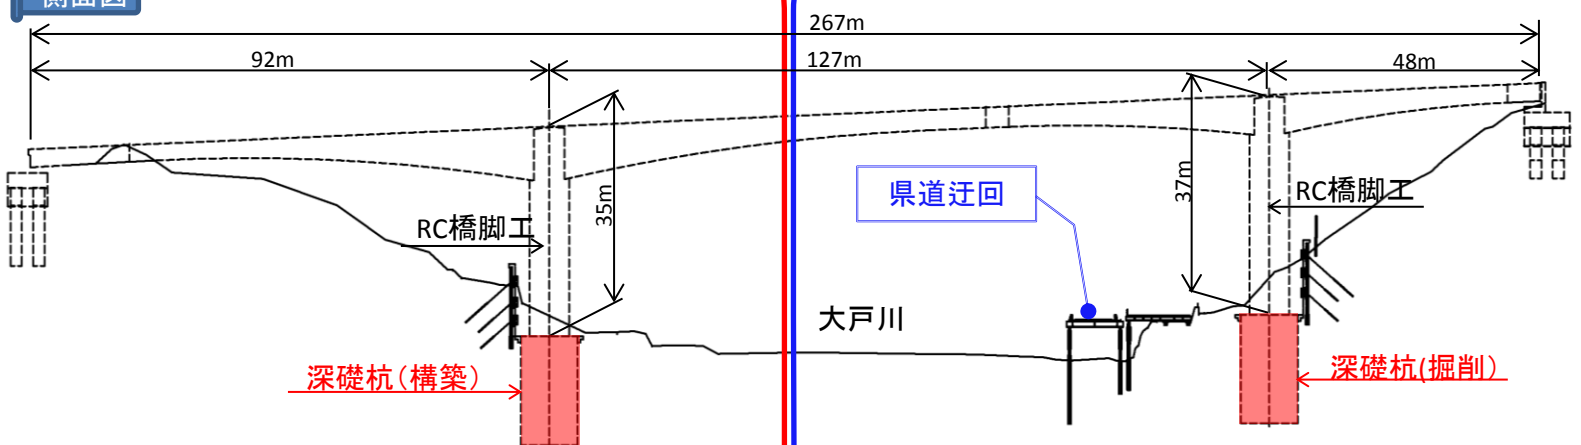

施工状況

(P1橋脚)

深礎杭の構築を行っています。



(P2橋脚)

深礎杭の掘削を行っています。



今月のトピックス



監理技術者 好田

今月は、発破工法についてご紹介します。発破は、爆薬と雷管から構成されており、削孔した穴に詰込・結線し、電気により爆発させます。映像は下記現場HPによりごらん頂けます。

<http://kawadaken.co.jp/construction/otsu/>



国家資格(発破技士等)を持ったスペシャリストが施工しています。

KAWADA 川田建設(株)

大津信楽線新3号橋工事事務所
〒520-2161
滋賀県大津市上田上桐生町地先
TEL : 077-549-0103
FAX : 077-549-0109
