


大津信楽線付替工事ニュース

令和3年12月15日



バックナンバーは
QRコードを眺込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工 期：令和2年11月7日～令和4年2月1日

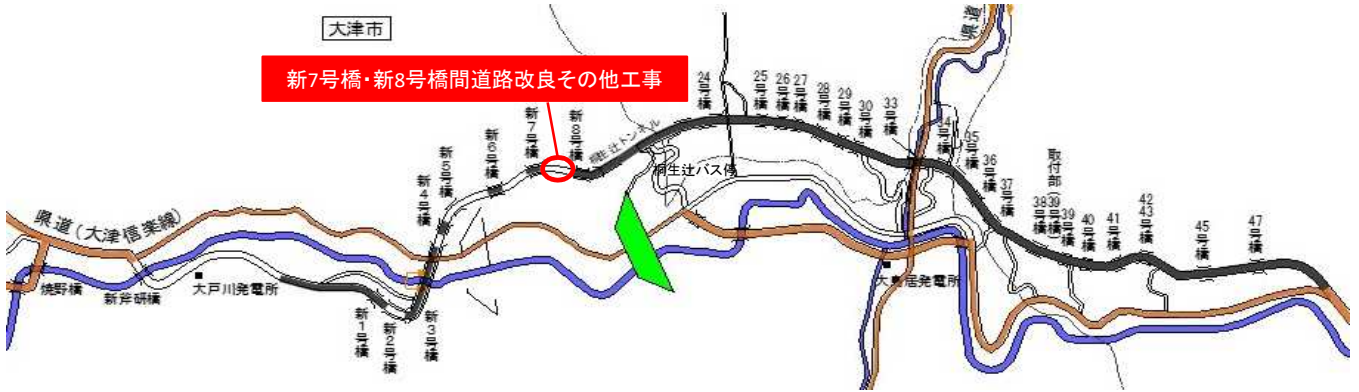


【現在の作業】11号補強土壁の基礎部のモルタル吹付と16号切土補強土の鉄筋挿入（法面補強）を行っています。
【今後の予定】16号切土補強土（法面補強工事）と11号補強土壁（擁壁）の基礎工事（足場の組立）を施工していきます。

工事現場の施工状況

監理技術者のコメント

施工状況
(10月末)

施工状況
(11月末)



11号補強土壁の掘削が完了し、鉄筋挿入を行う前のモルタル吹付を行っています。
16号切土補強土の鉄筋挿入も順調に進んでいます。
狭間で急峻な場所ですが、皆で意見を出しあって工夫しながら重複作業を行い、工期短縮に努めてまいります。
引き続きご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

OhYAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事
工期：令和3年1月8日～令和4年2月28日

12月



施工完了位置

施工完了写真



補強土壁工施工完了

施工状況位置

施工状況写真




重力式擁壁掘削状況

現場代理人コメント

寒さが身に染みる季節となり、信楽の寒さを肌身で痛感し、日々作業を行っております。さて、今後の施工としまして、補強土壁工は完了しましたので、重力式擁壁工および切土補強土工の施工を進めて参ります。県道（大津信楽線）も災害復旧工事が終わり開通しましたので、今まで以上に安全通行を心掛け、工事を施工して参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

現場代理人
佐野 邦生



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-0151
077-549-0155

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ


工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和4年3月20日

12月

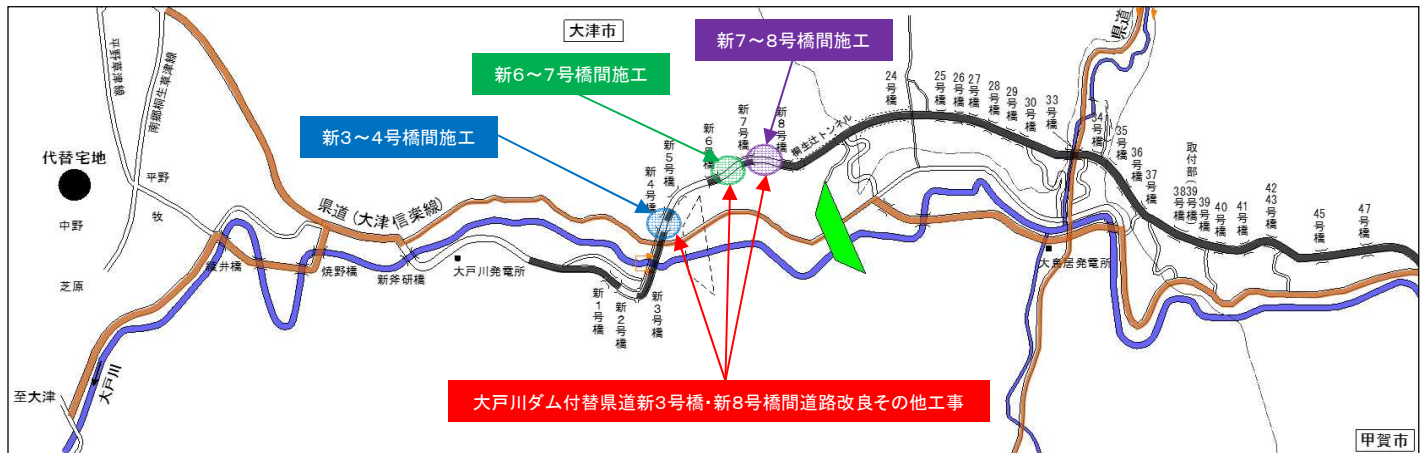

工事現場全景(新3号橋から新8号橋に向けて)

新3～4号橋間施工箇所

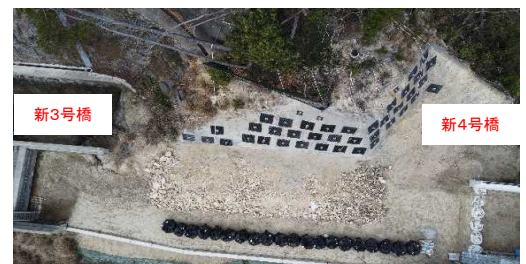

新6～7号橋間施工箇所



工事現場全景(新8号橋から新3号橋に向けて)



現場代理人：寺内 敬嗣

新6～7号橋間では山の掘削と転石を撤去し、圧縮補強土工施工を開始しました。
また、11号切土補強土壁の掘削に着手しました。
県道大津信楽線の通行止め解除に伴い一般車優先にて工事車両の通行をおこないます。
また、工程の短縮を図り早期完成を目指します。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010


大津信楽線付替工事ニュース

令和3年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新2号橋上部工事
工期：令和3年4月1日～令和4年3月10日

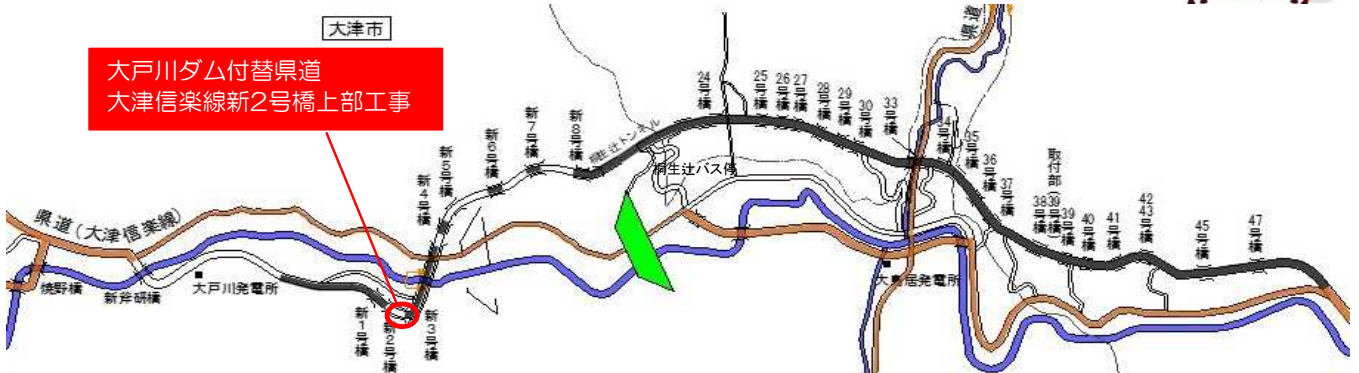

【現在の作業】 架設桁移動のための軌条設備の撤去作業を進めています。
【今後の予定】 12月中旬に、横組工のコンクリート打設を行い、1月(年明け)に床板コンクリート打設を予定しています。

工事現場の施工状況

施工状況（11月末）架設桁解体

PC桁架設後が完了したため、架設桁の解体・撤去作業を行っています。
11月末時点で、全ての架設桁の解体・撤去作業が完了しております。



施工状況（12月初旬）軌条設備解体

PC桁架設に使用した軌条設備の解体作業を行っています。
解体・撤去完了後、床板工の施工を進めていきます。



監理技術者のコメント

11月中旬に、PC桁架設作業を全て終了し、11月末には架設桁の解体作業が完了しました。
12月以降は、PCコンボ橋の施工を順次進めていきます。
吊足場上、主桁上での作業などで、引き続き高所作業が続きますので、墜落事故等ないように、安全設備等に常に気を配り、作業を進めていきます。
12月より、大津信楽線の災害復旧が終了し、通行止めが解除されましたので、通勤や搬入車両等の運行にも注意して作業を進めていきます。
今後ともご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。



監理技術者 稲葉 諒



大津信楽線付替工事ニュース


令和3年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新5号橋上部工事
工期：令和3年3月31日～令和4年3月10日

12月

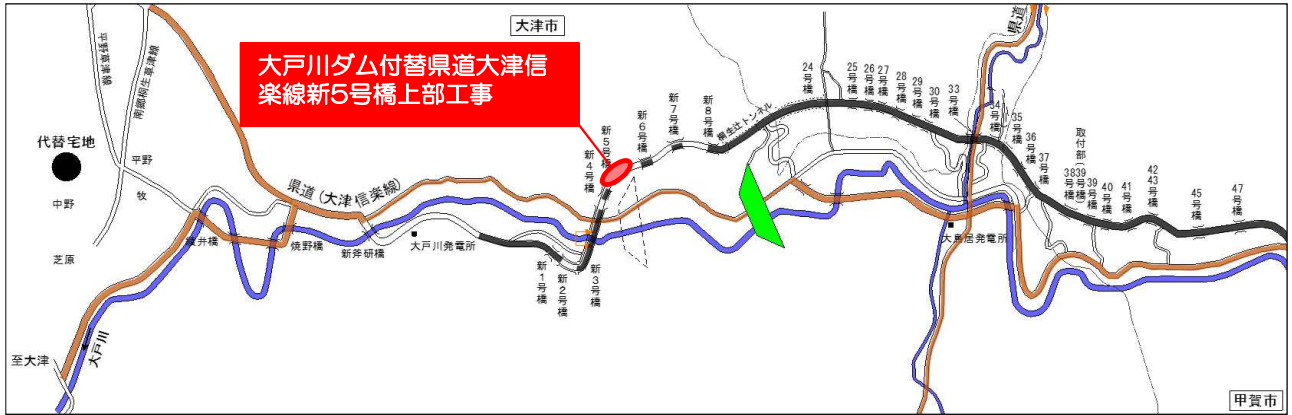

【現在の作業】 「合成床版」の架設・鉄筋組立等を行っています。



現在の施工状況

巻立コン打設

合成床版架設状況

現在、施工の方は合成床版の架設作業を行っておりまして、年末頃に床版コンクリートの打設を予定しております。

コンクリート打設日は生コン車による搬入を25台/日程度予定しておりますので、安全運転に努め、公衆災害等に十分気を付けて行いたいと思います。

寒さがより一層厳しくなっておりますのが安全第一にて作業を行って参りますので今後ともご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人
實 扇太郎

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事
工期：令和3年8月5日～令和4年3月10日

12月

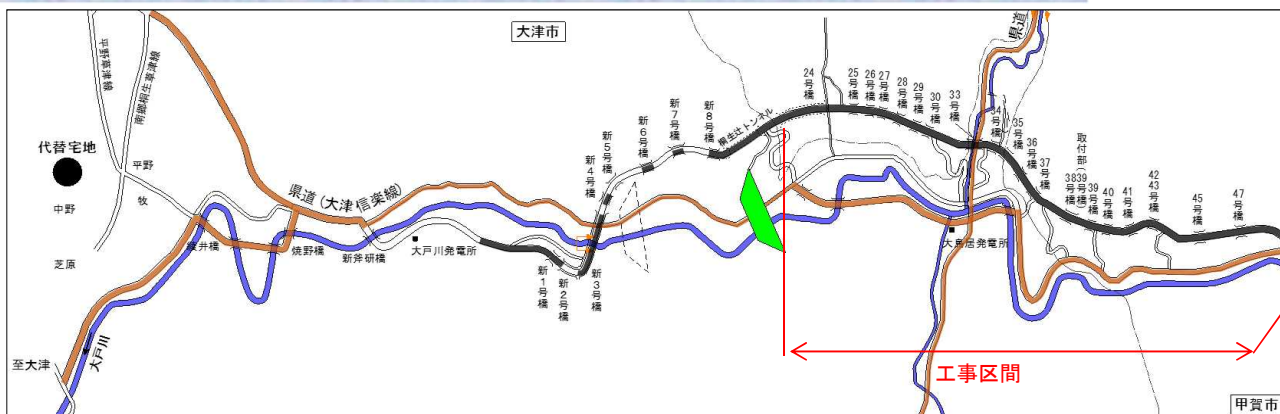

工事現場全景 (甲賀から大津に向けて)



車道表層予定箇所

工事現場全景 (大津から甲賀に向けて)



防草コンクリート

ガードレール設置予定

現場代理人：野々村英樹

11月度は防護柵工を中心に施工をしておりました。12月度は舗装工を中心に施工してまいりたいと思います。令和4年1月中頃から現道大津信楽線を片側交互通行規制で作業する予定です。今後とも安全第一に施工を進めていきますのでご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010
