

実施計画に係る
令和5年度実施状況および令和6年度実施予定

令和6年5月29日

長浜市未来創造部北部政策局

実施内容について（長浜市）

- **【実施中】** ②-4 市道上丹生摺墨線他（舗装修繕）
- **【実施中】** ②-5 市道西村線他（消雪用水取水施設整備）
- **【完了】** ⑥-2 生活関連施設等の整備（除雪機械整備）
- **【実施中】** ⑥-5 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援（余呉地域の「小さな拠点」づくり）
- **【完了】** ⑩-1 農林業の振興（余呉地域の特産品化）
- **【実施中】** ⑩余呉まちづくり研究会で提案・検討された地域の取組を支援
- **【実施中】** ⑪-1 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援（余呉湖荘跡地、農林漁業体験実習館跡地の利活用）
- **【実施中】** ⑪-4 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援（八田部発生土受入跡地利用計画策定業務、八田部堤外民地取得事業の実施）

【②-4】舗装修繕


【⑥-2】生活関連施設等の整備


【⑥-5】余呉地域の「小さな拠点」づくり


【⑩-1】余呉地域の特産品化（加工機械導入支援）


【⑪-1】余呉湖荘跡地 農林漁業体験実習館跡地の利活用


【⑪-4】八田部発生土受入跡地利用計画策定業務 八田部堤外民地取得事業の実施


【②-5】消雪用水取水施設整備


②-4 市道上丹生摺墨線他

・摺墨地区の舗装修繕を実施


市道上丹生摺墨線舗装修繕工事 R6.1月完成

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工

・R5施工延長 425m (舗装修繕 2,750m²)



標準断面図



施工済み



着工前

完成

R5年度実施箇所

②-5 市道西村線他

【実施中】

・消雪用水施設の整備を実施中

消雪用水取水施設整備工事 完成:R6.3月下旬

施設(集水埋渠)整備を実施(取水管φ600 L=20m 導水管φ600 L=36m)

その他、河川法等法手続きを実施

R6 消雪用水集水井等施設整備工事

R6 集水井1基・導水管φ600 L=1.4m・散水管布設(予定)

※R7～ 散水管布設、R8ポンプ据え付け(予定)



取水施設整備箇所



消雪施設整備予定路線

⑥-2 生活関連施設等の整備

【完了】

・除雪機械購入の支援を実施

元水没地内住民の移転先である東野北畑団地内の生活関連施設の整備

※消雪施設整備の代替事業：東野北畑地域支援限定事業として実施

除雪機械整備

除雪機械 1台(除雪仕様ミニホイールローダ バケット容量0.4m³)
の購入支援を実施 R5.5.26納車



東野北畑団地




⑥-5 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援

【実施中】

・余呉地域の「小さな拠点」づくり

小さな拠点施設整備事業(旧はごろもホールスペース活用備品整備) 事業実施年度: R5~
余呉地域の中心地にある、旧はごろもホールのスペースを活用することで地域の人々が集い、交流する場として利用促進を図る。また、地域内外の新たな人材の受け入れの場としての利用にも繋げていく。

- ・施設の集約に向けた庁内協議 余呉支所周辺施設各所管課との協議の開催
- ・施設活用のための備品整備
- ・コワーキングスペースの運営に係る協議の開始
- ・余呉地域づくり協議会、北びわこまち活研究所と活用策の検討・協議



はごろもホール・図書館



ロビーの人工芝化



キッズスペースの設置

10-1 農林業の振興

【完了】

・余呉地域の特産品化

余呉エゴマ生産振興交付金(エゴマ搾油機等 機械設備の導入支援) 事業実施年度: R5

余呉まちづくり研究会「北海道プロジェクト」に位置づけているエゴマの「特産品化」及び「6次産業化」を目指すため、余呉エゴマ生産組合による加工機械設備の導入を支援した。

支援内容

水洗機、選別機、搾油機の整備

交付決定: R5.7.24 完了: R6.1.15

設備配置場所: 長浜市余呉町下丹生

三星砒業(株) 余呉農園内



水洗機



選別機




搾油機



エゴマ油

余呉エゴマ生産組合 設立: 令和4年9月8日
 組合員数 10名 内法人会員3社 三星砒業 株式会社
 株式会社 ロハス長浜
 株式会社 リプテクス


エゴマ油生産工程 (6次産業化)

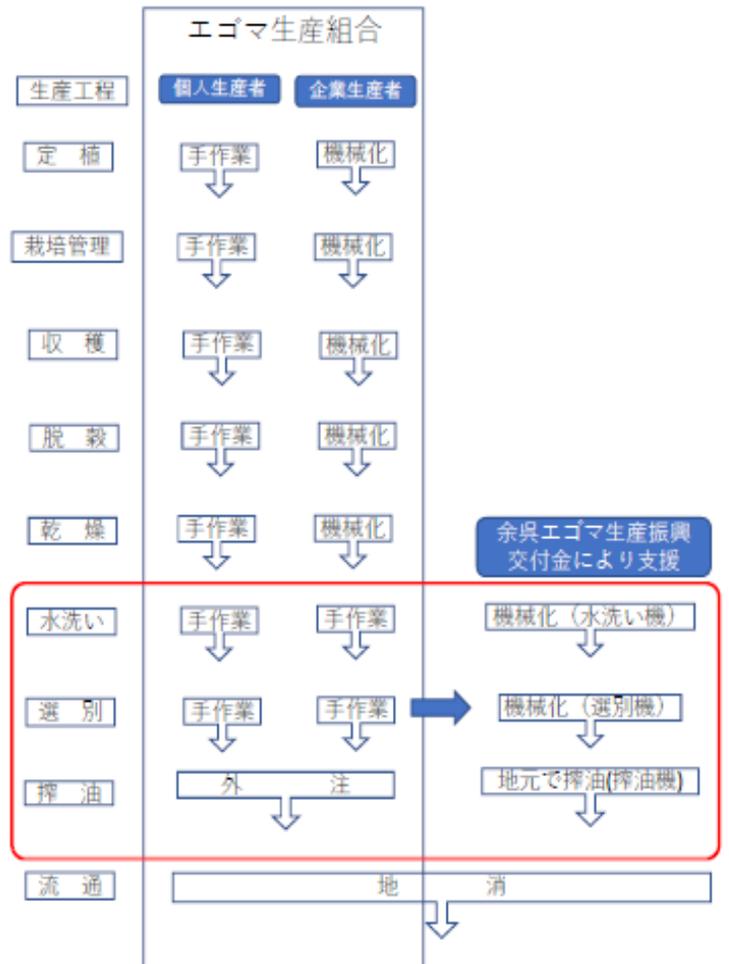

⑪ 余呉まちづくり研究会・地域の取り組みの支援

【実施中】

・余呉まちづくり研究会で提案・検討された地域の取り組みの支援

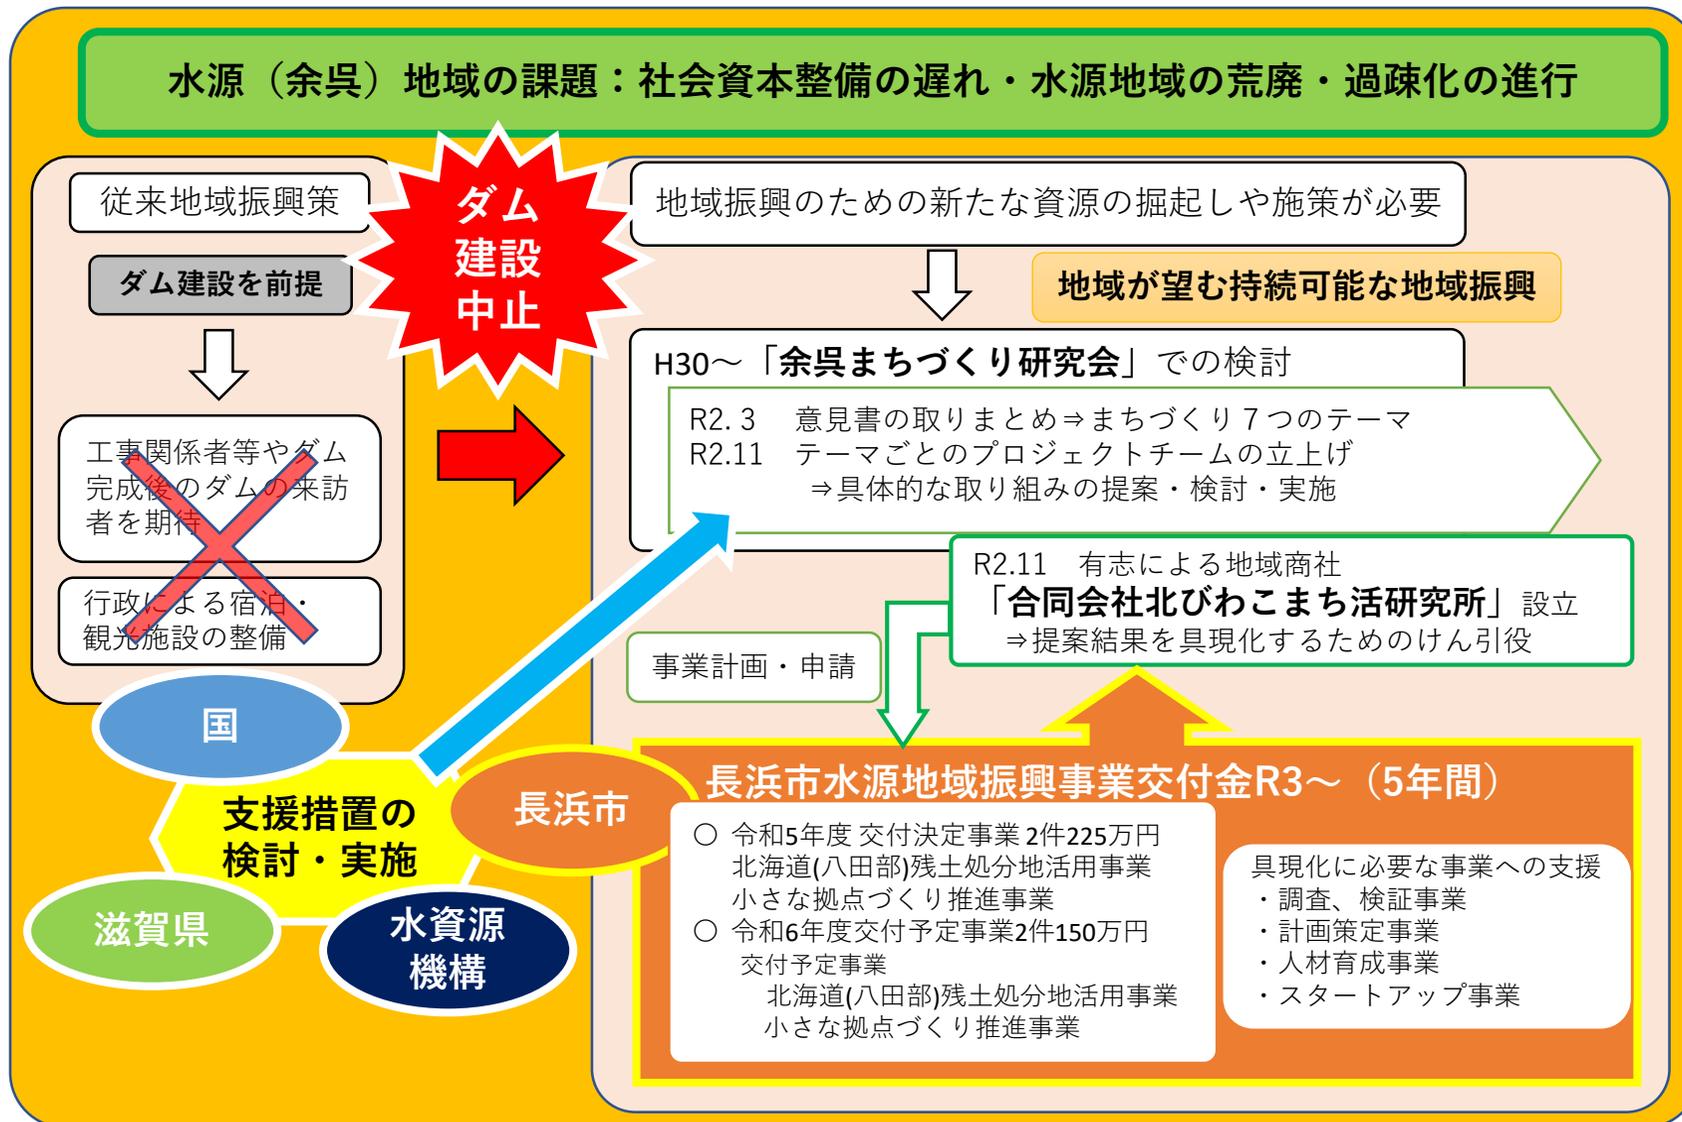

⑪-1 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援

【実施中】

・余呉湖荘跡地、農林漁業体験実習館跡地の利活用

余呉湖周辺公園施設等整備事業(県・市・民間事業者の官民連携事業) 事業実施年度: R5~
丹生ダム対策委員会、地元自治会・漁協等が支援する地元民間事業者が、余呉湖荘跡地(県有地)を活用したグランピング
宿泊施設の整備に合わせ、農林漁業体験実習館跡地(市有地)を芝生公園に整備する。

実施内容

① 余呉湖荘跡地(県有地)

滋賀県: 余呉湖周辺公園等整備工事

完成予定: R6.5月完成

整備内容: 舗装工1,384㎡ 張芝1,723㎡

進入路約100m

地元事業者: グランピング施設整備

整備内容: 宿泊施設2棟、管理棟1棟

② 農林漁業体験実習館跡地(市有地)

長浜市: 余呉湖周辺公園施設等整備工事

R5.12月完成


整備内容: 張芝A=1,810㎡ 園路(W=2m・3m・6m)L=130m



余呉湖荘跡地
農林漁業体験実習館跡地



①: 余呉湖荘跡地(県有地) 約6,000㎡
②: 農林漁業体験実習館跡地(市有地) 約1800㎡

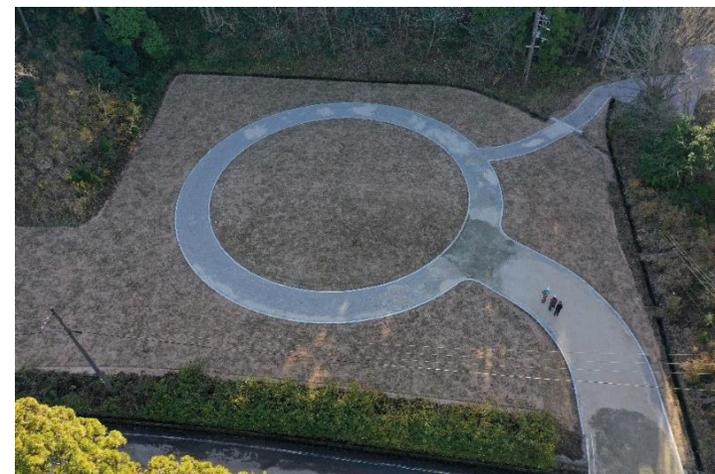

③: 完成写真

⑪-4 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援

【実施中】

・八田部発生土受入跡地利用計画策定業務および八田部堤外民地取得事業の実施

八田部発生土受入跡地利用計画策定業務 業務期間：R4.10.29 ~ R5. 9.30

市委託先：合同会社 北びわかまち活研究所
(協力支援先：(株)スノーピーク)

余呉町上丹生地先の八田部発生土受入跡地及び隣接する高時川護岸における地域振興を早期に実施するため、基本構想図・利用計画書作成、概算工事費算出、経済効果調査分析等、地域振興の拠点を整備するための利用計画を策定。



◇ 主な機能：管理棟(物販、軽食、受付、トイレ、洗い場、シャワー等)1棟、サニタリー棟(トイレ、洗い場)2棟

八田部堤外民地取得事業 事業実施年度：R4～

八田部発生土受入跡地利用計画の実現に向け、必要な事業用地取得のための調査を実施(滋賀県へ業務を引継ぎ)

R5.4.11、4.27、6.8、9.22、10.13、12.1、12.28、R6.1.19	合同会社北びわかまち活研究所(以下「まち活」という。)と今後の進め方について協議
5.15、5.31、7.6、9.1、5.23、7.13	まち活・株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング(以下「SP」という。)と今後の進め方について協議
5.25、6.7、6.15、6.22、7.5、9.4、9.13	滋賀県、長浜市、まち活、SPで堤外民地利用について河川協議
6.12、6.20、6.28、7.18、7.26、7.28、8.4、9.1、10.19、10.31、11.28	水資源機構と、八田部発生土受入跡地利用の基盤整備等について協議 SPと協議
6.19、9.6	近畿地方整備局と長浜市が、八田部計画に係る財源措置等について協議
6.26	丹生ダム対策委員会による近畿地方整備局、滋賀県へ要望活動
7.20、12.13	長浜市議会(総務教育常任委員会)において、SPとの包括連携協定及び八田部利用計画策定等について説明
7.31、8.22	近畿地方整備局、滋賀県と長浜市が財源措置等について協議
9.7	地元上丹生自治会説明会(まち活、SP)
9.11～12	八田部モニタリングキャンプ
9.21	近畿地方整備局、滋賀県、水資源機構と長浜市が財源措置等について協議
10.18、12.15	滋賀県長浜土木事務所木之本支所と長浜市が八田部堤外民地取得について協議
10.26～27	現地視察(スノーピークおち仁淀川キャンプフィールド・スノーピークかわの駅おち：高知県越知町)
11.8、11.22、12.5、12.11、12.21	滋賀県流域政策局と長浜市が地域振興に係る財源措置について協議
12.13	長浜市長とSP社長との面談
12.18～19	丹生ダム対策委員会による国土交通大臣政務官、水資源機構理事長へ要望活動
R6.1.17	近畿地方整備局、滋賀県、長浜市が八田部発生土受入地の利用について協議
3.29	近畿地方整備局、滋賀県、長浜市、丹生ダム対策委員会(まち活)、SPが八田部発生土受入地の利用について協議

R5
の
主
な
動
き
