

熊野川河道掘削の取り組み状況

- ・国の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去に加え、計画規模の洪水(19,000m³/s)を安全に流下させるための河道掘削(215万m³)を平成29年度9月に完了予定。引き続き、熊野川本川や支川相野谷川の更なる治水安全度の向上を図るため、概ね5年間で河道掘削を実施予定。
- ・和歌山県、奈良県、三重県の管理区間については、平成23年9月洪水で堆積した土砂の撤去を目的とした熊野川本川における掘削を平成29年度に概ね終了予定。和歌山県、三重県では、引き続き、熊野川本川や支川の更なる治水安全度の向上を図るため、近く策定予定の熊野川圏域河川整備計画に基づき、河道掘削を実施予定。
- ・河川整備計画については、現在検討中^{※注1}の河川整備基本方針が策定後、新規策定及び変更予定。

区間		予定量 (万m ³)	実施量 (万m ³)	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30~
①河口～相賀 【国交省】	熊野川	215	215	[Progress bar from H23 to H29]							(完了予定)
		90	0							[Progress bar from H29 to H30]	
①相賀～宮井 【和歌山県・三重県】	熊野川	23 (策定中)	21.7			[Progress bar from H25 to H29]				[Progress bar from H29 to H30]	(整備計画策定後着手)
	支川	11	9.7		[Progress bar from H24 to H29]					[Progress bar from H29 to H30]	
②宮井～二津野ダム 【和歌山県】	熊野川	159 (策定中)	119.1		[Progress bar from H23 to H29]					[Progress bar from H29 to H30]	(整備計画策定後継続) <small>※注2</small>
	支川	8	8	[Progress bar from H23 to H24]	(完了)						
③二津野ダム上流 【奈良県】	熊野川	173	173	[Progress bar from H23 to H27]	(完了)						
	支川	39	39		[Progress bar from H24 to H27]	(完了)					
④宮井～小森ダム 【三重県】	北山川	-	-								
	支川	1 (策定中)	1			[Progress bar from H25 to H26]	(完了)			[Progress bar from H29 to H30]	(整備計画策定後着手)
⑤小森ダム上流 【奈良県・三重県】	北山川	9	9		[Progress bar from H24 to H25]	(完了)					
	支川	4 (策定中)	3.2			[Progress bar from H25 to H29]				(完了予定)	[Progress bar from H29 to H30]

※注1：年度内に社会資本整備審議会での審議開催を目指す。

➡ (国管理区間)
熊野川本川や相野谷川の更なる治水安全度の向上を図るため、継続して河道掘削を実施

➡ (県管理区間)
熊野川本川や支川の更なる治水安全度の向上を図るため、継続して河道掘削を実施

(実施量はH29年4月現在 ダム管理区間は除く)

※掘削予定量は現時点での値で変動の可能性があります。

※注2：河川整備計画(H21和歌山県策定)に基づき実施中の河道掘削は、近く策定予定の同計画にも位置付け、継続して実施。

熊野川河道掘削の取り組み状況

H29.4月時点

今後、熊野川本川や支川の更なる治水安全度の向上を図るため、近く策定予定の熊野川圏域河川整備計画に基づく、新たな河道掘削が追加予定。


凡例

区間名

掘削予定量 (H28年度末掘削量)

【H29年度掘削予定量】

- : 流域界
- : 河川
- : 掘削範囲

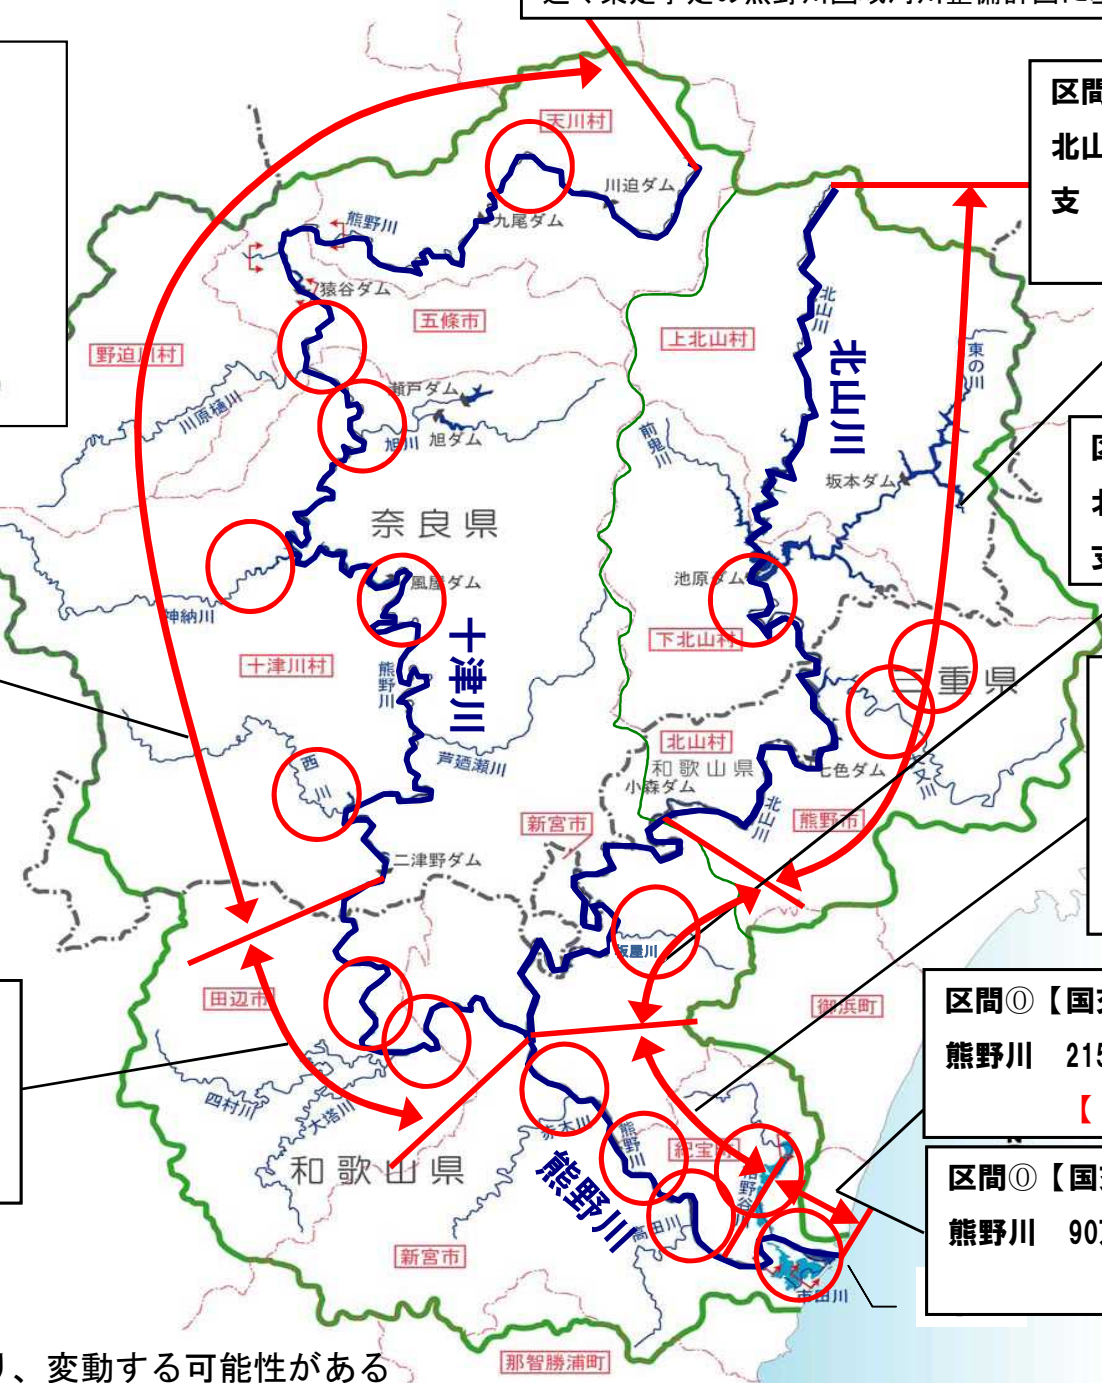

区間⑤【奈良県・三重県】

北山川 9万m³ (9万m³ : 完了)

支川 4万m³ (3.2万m³)

【 0.8 : H29完了予定】

区間④【三重県】

北山川 - 万m³

支川 1.2万m³ (1.2万m³ : 完了)

区間①【和歌山県・三重県】

熊野川 23万m³ (21.7万m³)

【0.6万m³】

支川 11万m³ (9.7万m³)

【 - 】

区間③【奈良県】

熊野川 173 万m³ (173万m³ : 完了)

支川 39 万m³ (39万m³ : 完了)

区間②【和歌山県】

熊野川 159 万m³ (119.1万m³)

【6万m³】

支川 8 万m³ (8万m³ : 完了)

区間①【国交省（激特対策）】

熊野川 215万m³ (170万m³)

【 42.5万m³ : H29.9完了予定】


区間①【国交省（緊特対策）】

熊野川 90万m³ (-)

【 48万m³ 】

※ 除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性がある

熊野川(区間①):直轄上流端～北山川合流点)における河道掘削の状況

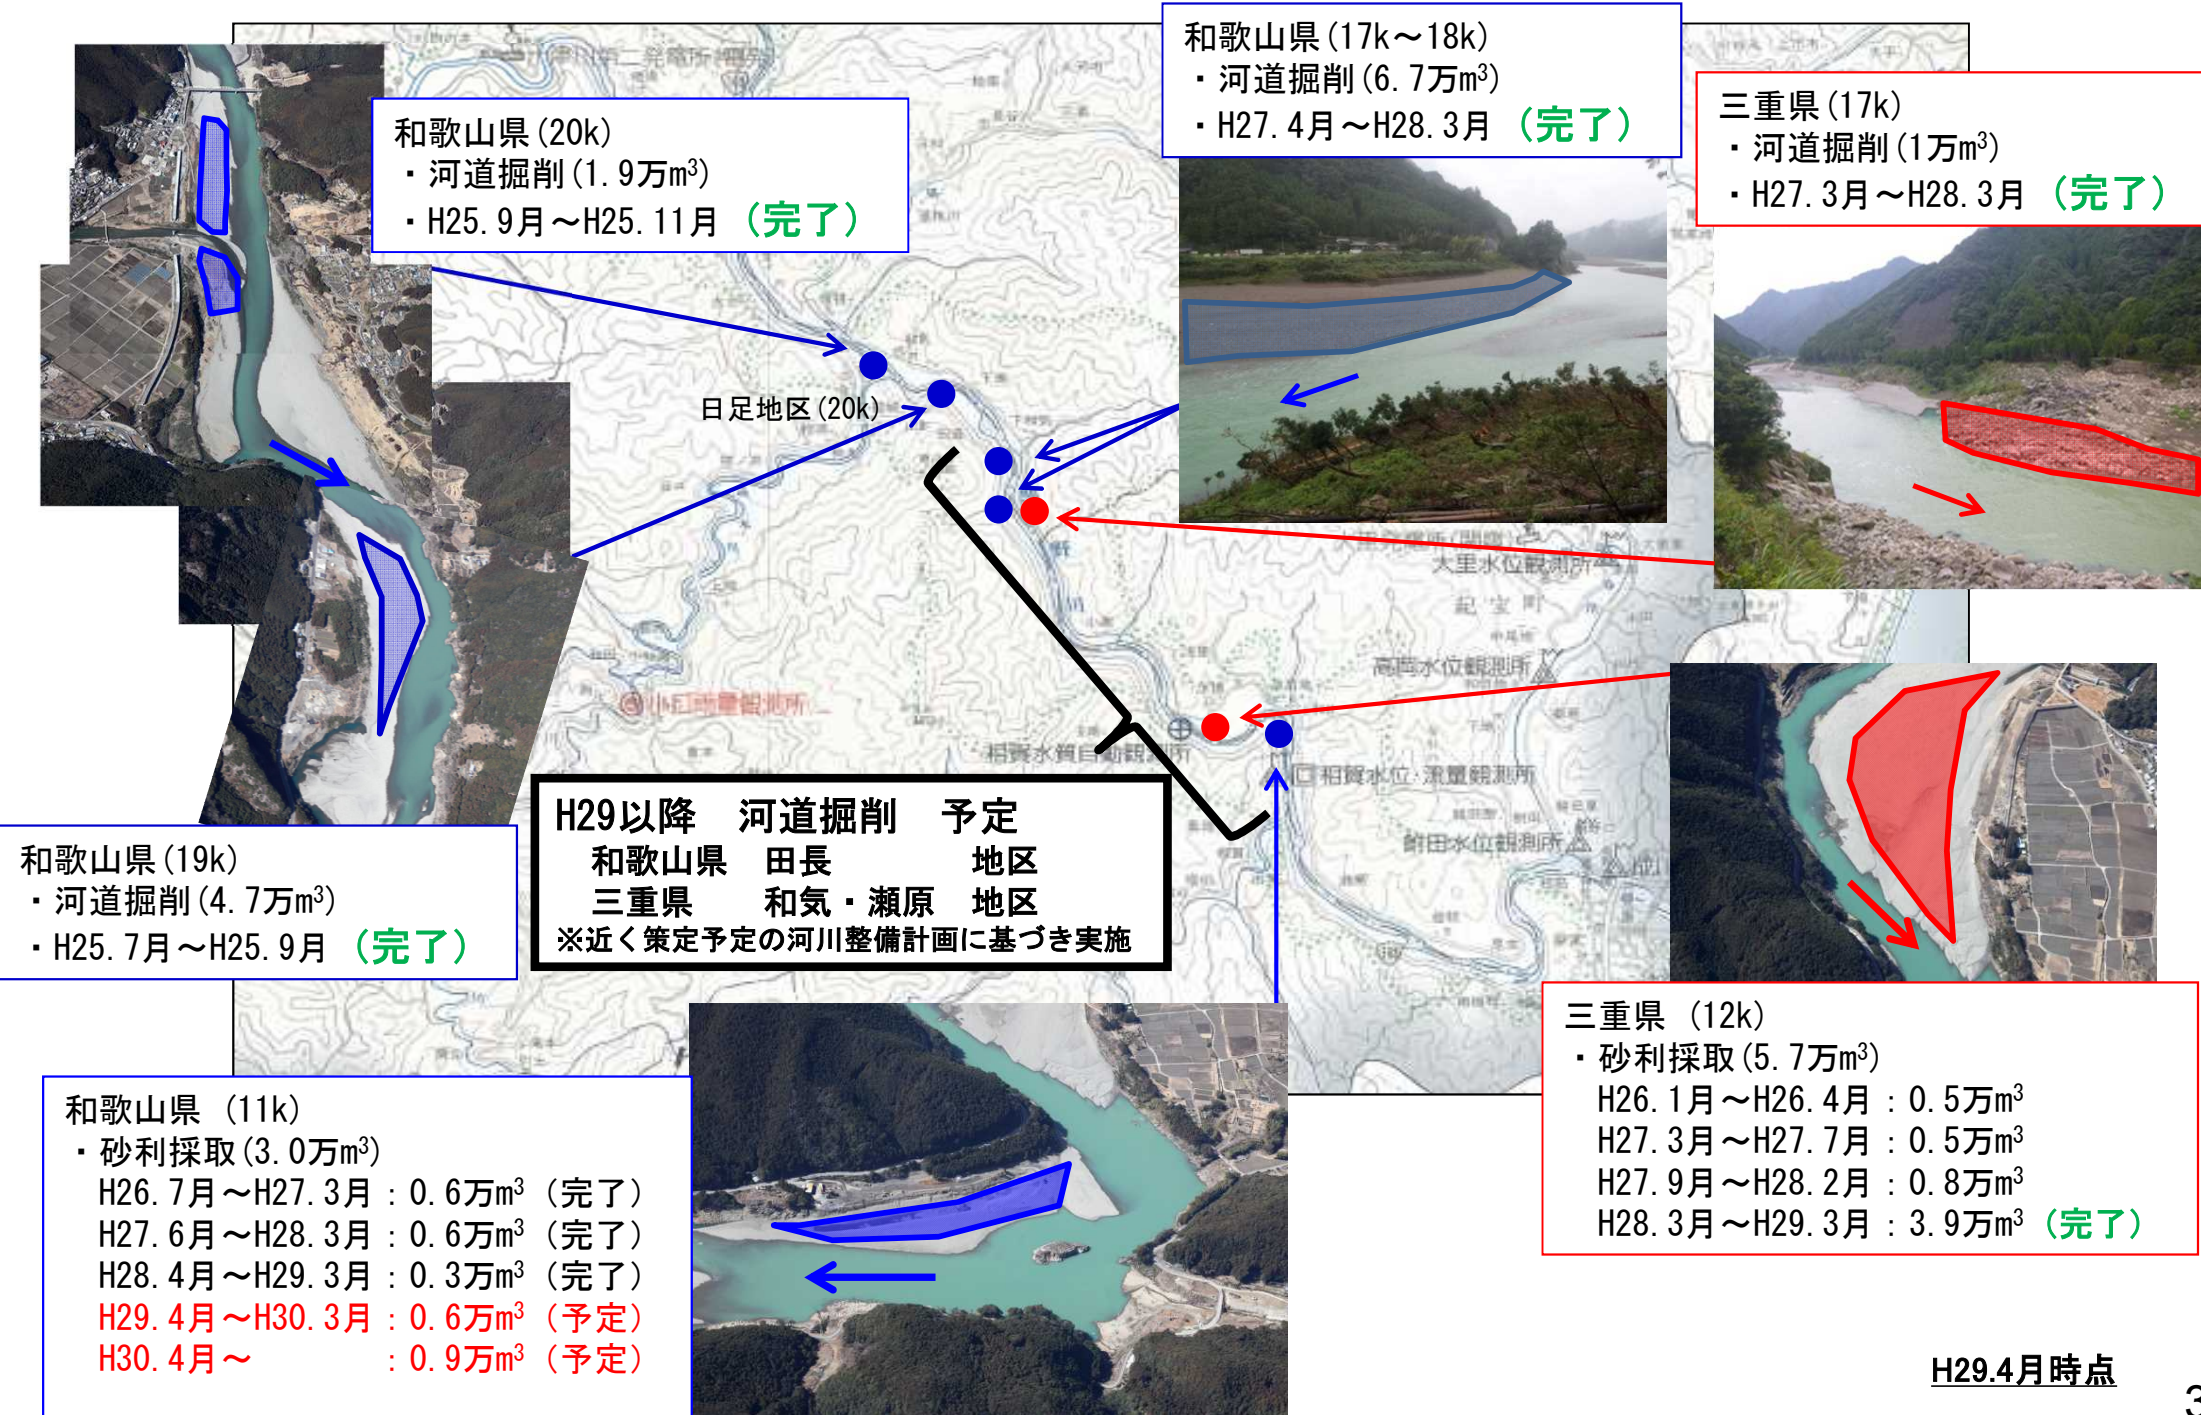

H29.4月時点
