


# 堆積土砂対策の状況について

奈良県 県土マネジメント部 河川課

# 1. 堆積土砂撤去の進捗状況

(奈良県・電源開発・関西電力・国土交通省)

## 全体図

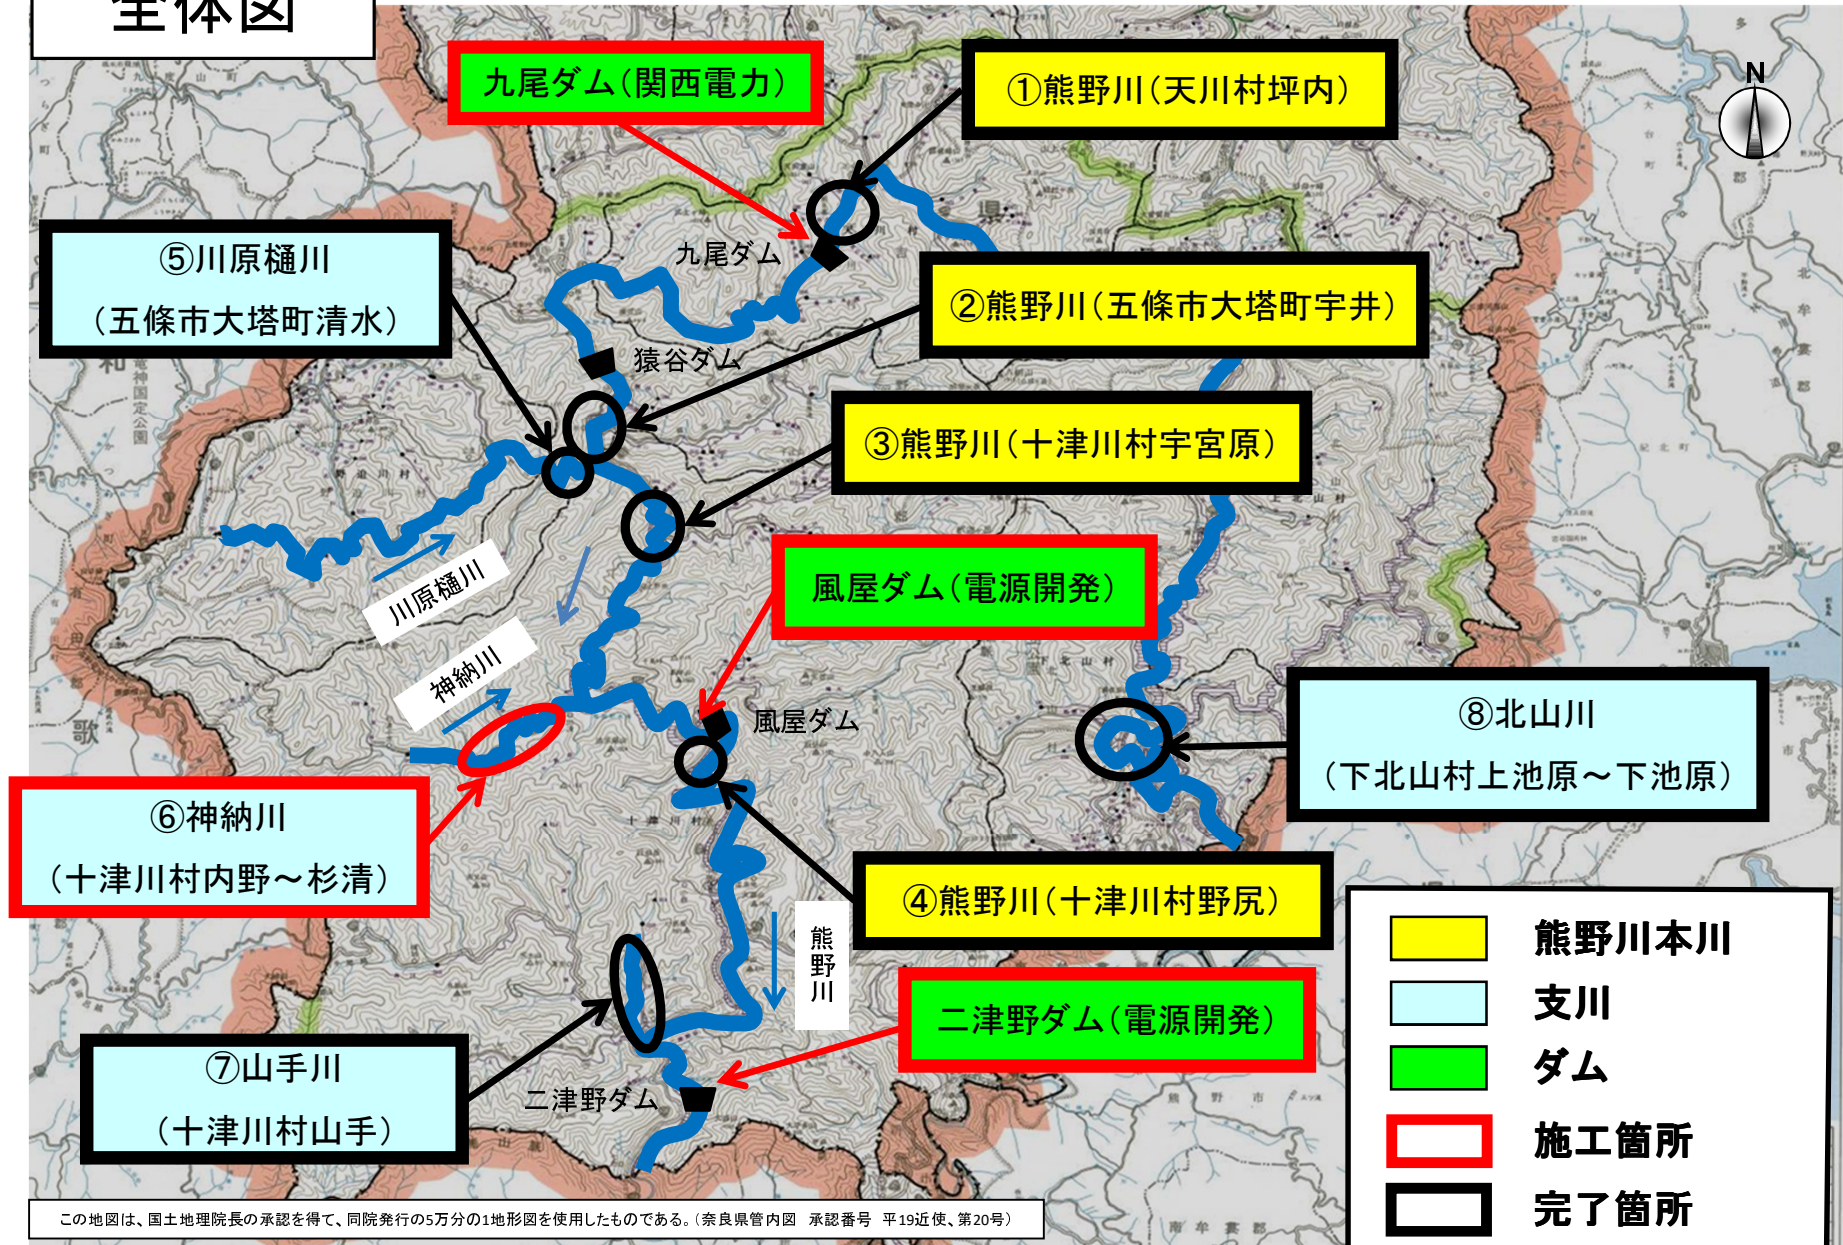

# 堆積土砂撤去(災害復旧事業分) 工程表(奈良県施行分)

河川名	箇所	撤去土砂量		H23	H24	H25	H26	H27	H28
熊野川 (くまのがわ)	① 天川村 坪内 <small>(つぼのうち)</small>	H23	8万m3	■	完了				
	② 大塔町 宇井 <small>(うい)</small>	H23	47万m3	■			完了		
	③ 十津川村 宇宮原 <small>(うくはら)</small>	H23	112万m3		■			完了	
		H25	台風18号分12万m3				■	完了	
④ 十津川村 野尻 <small>(のじり)</small>	H23	6万m3		■		完了			
川原樋川 (かわらびがわ)	⑤ 大塔町 清水 <small>(しみず)</small>	H23	14万m3		■		完了		
神納川 (かんのがわ)	⑥ 十津川村 内野～杉清 <small>(うちの) (すぎせ)</small>	H23	21万m3			■		完了	
		H25	台風18号分17万m3				■		完了
		H26	台風11号分10万m3					■	
山手川 (やまてがわ)	⑦ 十津川村 山手 <small>(やまて)</small>	H23	4万m3	■		完了			
北山川 (きたやまがわ)	⑧ 下北山村 下池原～上池原 <small>(しもいけはら) (かみいけはら)</small>	H23	9万m3	■	完了				

23年災害は26年度、25年災害は27年度、26年災害は28年度完了



# 2. 新宮川水系堆積土砂処分推進事業

## ・ 神納川(十津川村内野～杉清)

### 流域対策図

