

平成28年 11月10日


堆積土砂対応の状況について

奈良県 県土マネジメント部 河川課

1. 堆積土砂撤去の進捗状況

(奈良県・電源開発・関西電力・国土交通省)

全体図

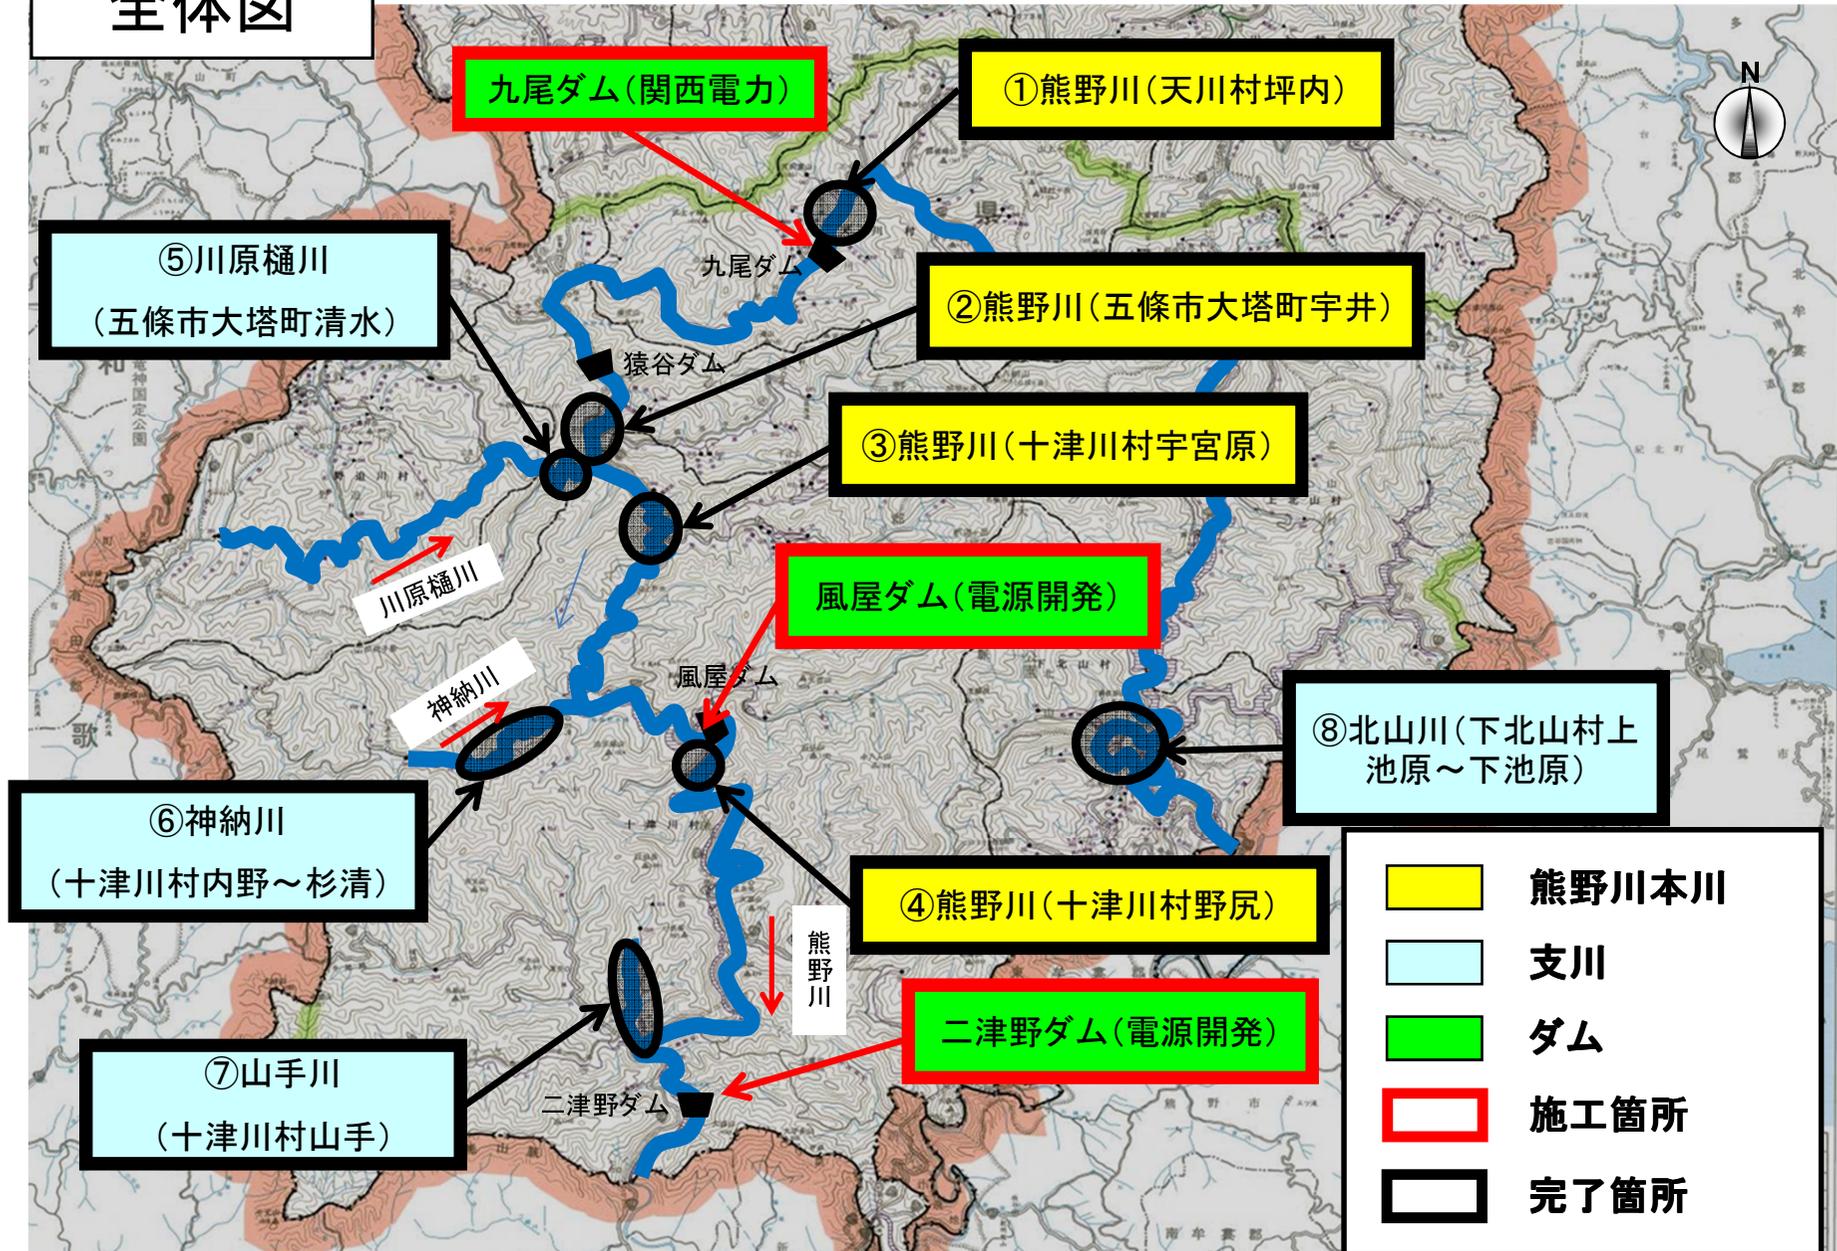

堆積土砂撤去 工程表(奈良県施行分)

河川名		箇所	撤去土砂量		H23	H24	H25	H26	H27	H28
熊野川 <small>(くまのがわ)</small>	①	天川村 坪内 <small>(つぼのうち)</small>	H23	8万m ³	■	完了				
	②	大塔町 宇井 <small>(うい)</small>	H23	47万m ³	■			完了		
	③	十津川村 宇宮原 <small>(うくはら)</small>	H23	112万m ³		■		完了		
			H25	台風18号分12万m ³			■	完了		
④	十津川村 野尻 <small>(のじり)</small>	H23	6万m ³		■	完了				
川原樋川 <small>(かわらびがわ)</small>	⑤	大塔町 清水 <small>(しみず)</small>	H23	14万m ³		■	完了			
神納川 <small>(かんのがわ)</small>	⑥	十津川村 内野～杉清 <small>(うちの) (すぎせ)</small>	H23	21万m ³			■		完了	
			H25	台風18号分17万m ³				■		
			H26	台風11号分10万m ³					■	
山手川 <small>(やまてがわ)</small>	⑦	十津川村 山手 <small>(やまて)</small>	H23	4万m ³	■	完了				
北山川 <small>(きたやまがわ)</small>	⑧	下北山村 下池原～上池原 <small>(しもいけはら) (かみいけはら)</small>	H23	9万m ³	■	完了				

23年災害は26年度、25年災害は27年度、26年災害は28年度完了

2. 神納川(十津川村内野～杉清)

