

熊野川堆積土砂除去の取り組み状況

除去スケジュール

区間		除去全体予 定量 (万m ³)	H23	H24	H25	H26	H27	H28～
①河口～相賀	熊野川	400	■					
	熊野川	17			■			
①相賀～宮井	支 川	11		■				
	※河川管理者等が連携してさらなる堆積土砂の除去及び民間による砂利採取を調整中。							
②宮井～二津野ダム	熊野川	159	■					
	支 川	8	■					
③二津野ダム上流	熊野川	173	■					
	支 川	39		■				
④宮井～小森ダム	北山川	—						
	支 川	1			■			
⑤小森ダム上流	北山川	9		■				
	支 川	4			■			

(ダム管理区間は除く)

- ※ ①の区間以外においても各県独自に民間による砂利採取の適用について実施もしくは調整が進められている区間がある。
 ※ 除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性がある。

熊野川堆積土砂除去の取り組み状況


H27.6月末時点

凡例

区間名

本川 除去予定量 (H26年度末迄除去量)
【H27年度除去予定量】

支川 除去予定量 (H26年度末迄除去量)
【H27年度除去予定量】

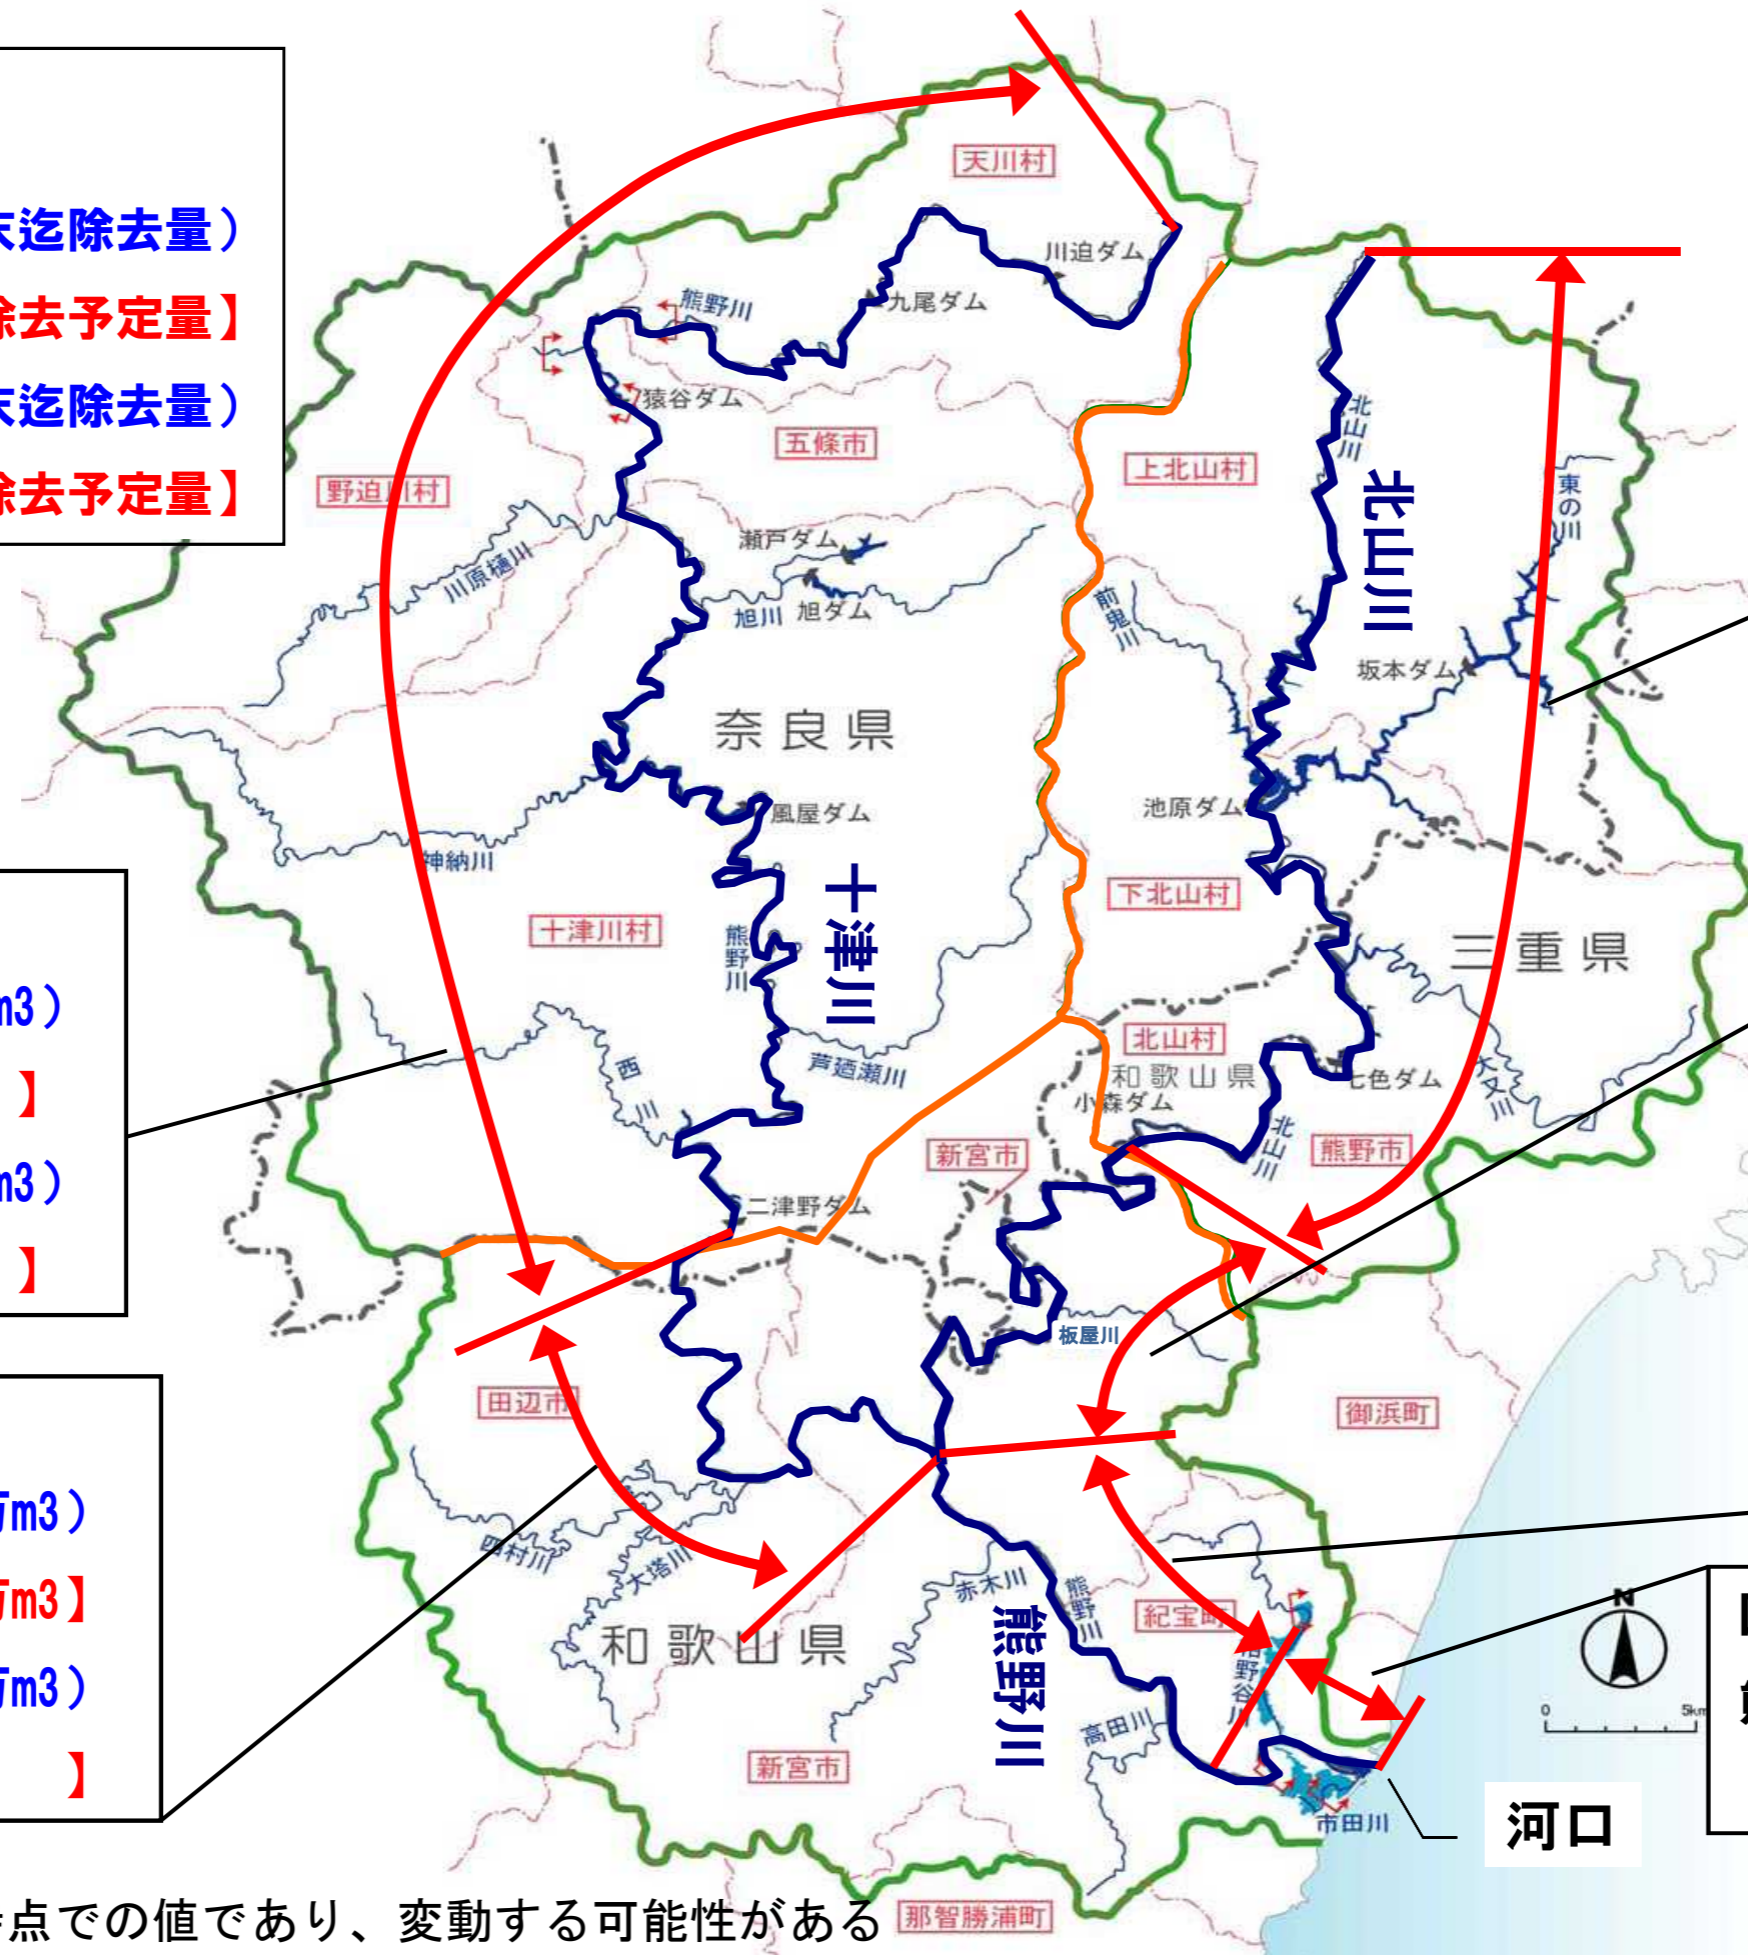

区間⑤

北山川 9万m³ (9万m³)
【 - 】

支川 4万m³ (3万m³)
【 0.2万m³ 】

区間④

北山川 - 万m³

支川 1.2万m³ (1.2万m³)
【 - 】

区間①

熊野川 17万m³ (7.8万m³)
【 7.4万m³ 】

支川 11万m³ (9.3万m³)
【 0万m³ 】

区間①

熊野川 400万m³ (137万m³)
【 85万m³ 】

区間③

熊野川 173 万m³ (173万m³)
【 - 】

支川 39 万m³ (39万m³)
【 - 】


区間②

熊野川 159 万m³ (90.3万m³)
【 17.1万m³ 】

支川 8 万m³ (8万m³)
【 - 】

※ 除去予定量は現時点での値であり、変動する可能性がある (ダム管理区間は除く)

熊野川(直轄上流端～北山川合流点)における堆積土砂の対応状況

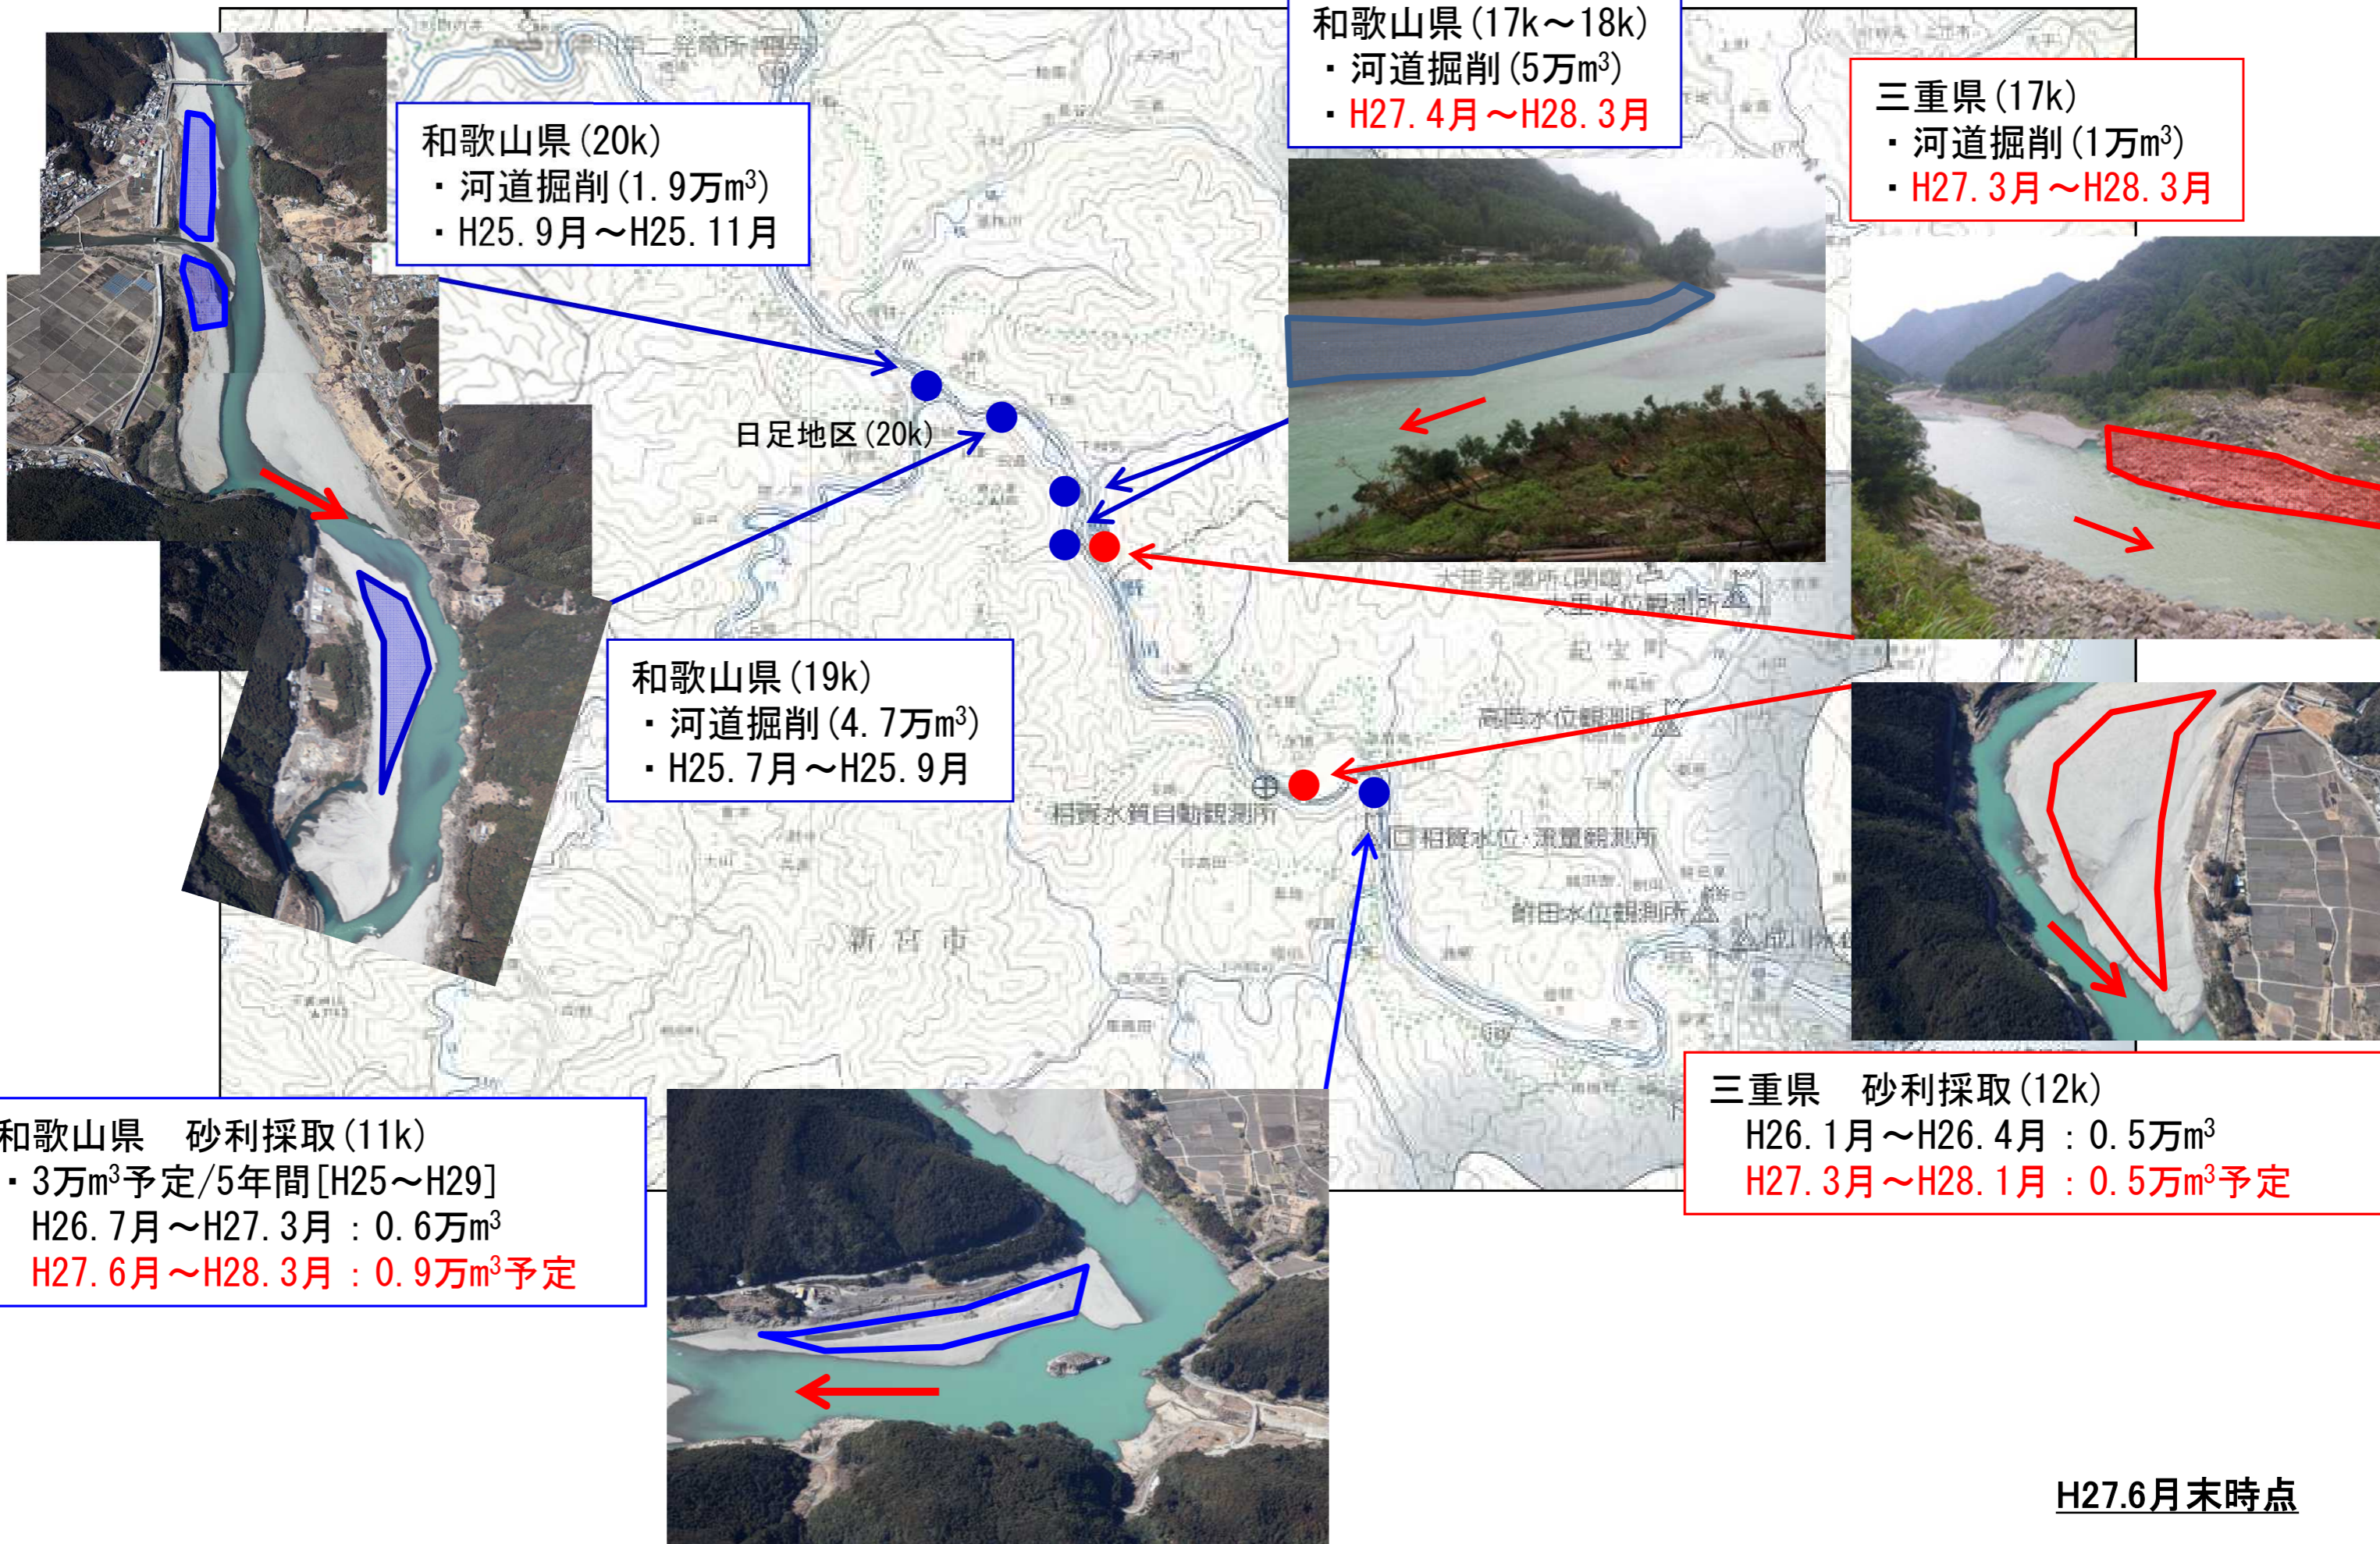

和歌山県 (20k)
 ・河道掘削 (1.9万m³)
 ・H25. 9月～H25. 11月

和歌山県 (17k～18k)
 ・河道掘削 (5万m³)
 ・H27. 4月～H28. 3月

三重県 (17k)
 ・河道掘削 (1万m³)
 ・H27. 3月～H28. 3月

和歌山県 (19k)
 ・河道掘削 (4.7万m³)
 ・H25. 7月～H25. 9月

和歌山県 砂利採取 (11k)
 ・3万m³予定/5年間 [H25～H29]
 H26. 7月～H27. 3月 : 0.6万m³
 H27. 6月～H28. 3月 : 0.9万m³予定

三重県 砂利採取 (12k)
 H26. 1月～H26. 4月 : 0.5万m³
 H27. 3月～H28. 1月 : 0.5万m³予定

H27.6月末時点
