



窪田遊水地工事ニュース

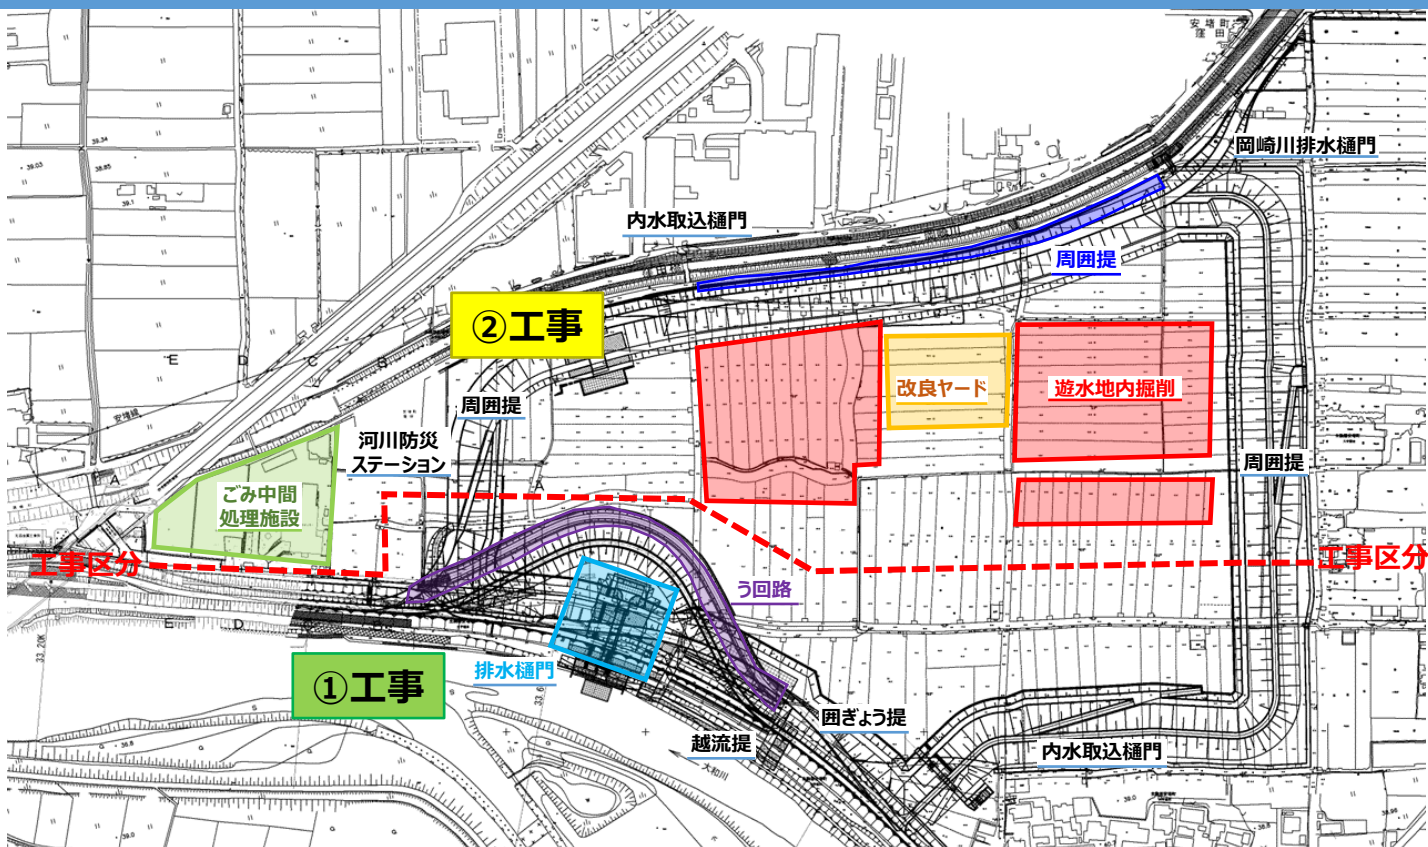

6月末時点

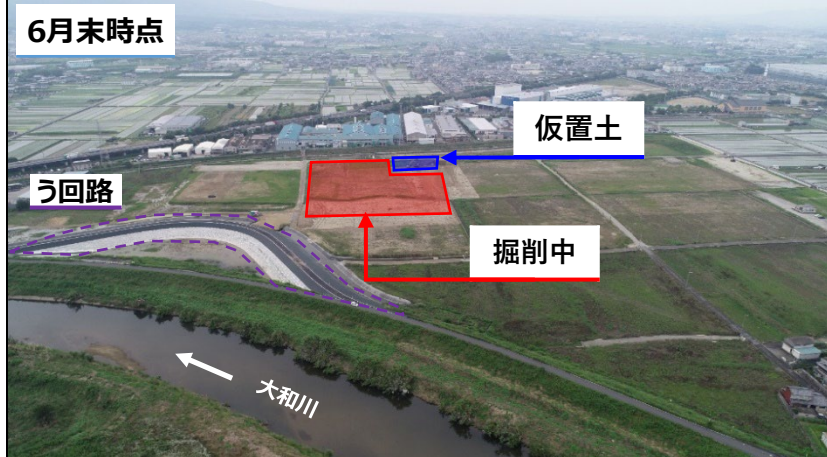

事務所コメント

○工事期間中に急な降雨があっても、遊水地内に水を貯められるよう遊水地内の掘削工事を進めています。

○仮置きしている掘削土は、周囲堤の一部整備、安堵町から奈良県への開発申請が承認され次第、ゴミ中間処理施設の造成に再利用します。

完成予想図



【整備状況(R5.6月末時点)】

- ・周囲堤 : 残り1,400m / 全長1,400m
- ・囲ぎよう堤 : 残り180m / 全長180m
- ・越流堤 : 残り80m / 全長80m
- ・樋門 : 残り3基 / 4基
- ・水路工 : 残り780m / 全長1100m
- ・遊水地内掘削 : 残り282,000m³ / 310,000m³
- ・コンクリート張工 : 残り120,000m² / 約120,000m²
- ・防災ステーション : 残り1式 / 1式

【用地状況(R5.4月末時点)】

- ・用地取得 : 未完了 (防災ステーション用地取得中)
- ・物件補償 : 未完了 (電柱 (関電、NTT)、水道補償中)

(注意) 記載内容は、今後変更されることがあります。

①工事：大和川窪田遊水地樋門築造工事【(株)本間組】




工事概要



- 遊水地内の貯留水を大和川に出すための排水樋門を築造する工事です。
- 大和川の堤防を開削するので、築造前には仮堤防（う回路）の拡幅も行い、現道機能を確保します。

う回路を6mに拡幅することで、安全に対面通行できるように工事を行っています。

9月下旬にはう回路拡幅完成予定であり、う回路への切り替え後、10月より排水樋門を工事していく予定です。



現状



工事車両通行のための坂路整備を行っています。



拡幅工事のために、防草シートを撤去しています。



②工事：大和川窪田遊水地掘削築堤工事【(株)城内組】



工事概要




- 遊水地内を掘削(約40,000m³)します。そのうち表面から15cmの表土(約5,000m³)は再利用できないので有料投棄しますが、その他の掘削土(約35,000m³)は、リテラ※を用いて改良し、周囲堤の一部整備や、ゴミ中間処理施設の造成に再利用します。

※リテラ(自走式土質改良機)とは…

盛土等に使用出来ない土を改良し、使用できる土にするための機械です。改良材が直接混合機に供給されるため、飛散の懸念が少なく、自走式なので設置や撤収作業が簡便です。

なお、リテラの意味は「リ」は、リサイクルと同様に再び使用出来る土質、「テラ」は英語で土、地面という意味があります。



リテラ

8月より、リテラを用いて改良予定です。

イメージ

現状



遊水地内で掘削を行っています。

【問い合わせ先】

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571
