

## 窪田遊水地工事ニュース

## 大和川窪田遊水地樋門築造工事【(株)本間組】



## 工事概要

令和6年4月以降も継続

- 地盤改良工を行った地盤の上に、均しコンクリートを打設して樋門本体に着手しました。
- 2月からは大型土のう仮締切が完了した箇所（川表側）の掘削にも着手します。



## お知らせ

引き続き、迂回道路を通行する際は、安全面でのご協力をお願いします。

現在施工中の川表側仮締切が完了した後、川表側の堤体掘削を行います。掘削完了後は川裏側と同様に地盤改良工を行い、順次樋門本体に着手します。

置換状況（12月14日時点）






均しコンクリート型枠組立完了（1月22日時点）



## 工事の流れ

樋門本体コンクリート打設順序のイメージは下図の通りです。

均しコンクリートの上に樋門本体の位置確認を行いながら鉄筋・型枠・コンクリート打設を順次行います。



工事の状況を  
動画で公開！

1月19日時点





# 西名阪高架下の施工について



(注意) 記載の期間は、今後変更することがあります。

- 西名阪高架下の拡幅工事に伴い、下記図のとおり一部通行止めを予定しております。
- 通行止めは、1月31日10時より行います。
- 通行止め期間中は、下図に示す迂回ルートをご協力をお願いします。



## 迂回路案内看板イメージ



工事期間中、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご協力のほどよろしくお願い致します。



# 大和川窪田遊水地掘削築堤工事 【(株)城内組】

令和6年2月完了予定

## 工事概要



- 遊水地の貯水容量を確保するための掘削・改良、**周囲堤整備**の一部（岡崎川沿川）、**ゴミ中間処理施設の造成**の本工事实施分を終了、2月中に撤去を完了します。
- 今後は次工事にて引き続き実施していきます。

## ○周囲堤整備の状況

1月22日、本工事分の築堤が完了しました。



盛土材敷均し




盛土材締固め



盛土法面整形

12月25日、本工事分の掘削、約57,000m<sup>3</sup>が完了しました。

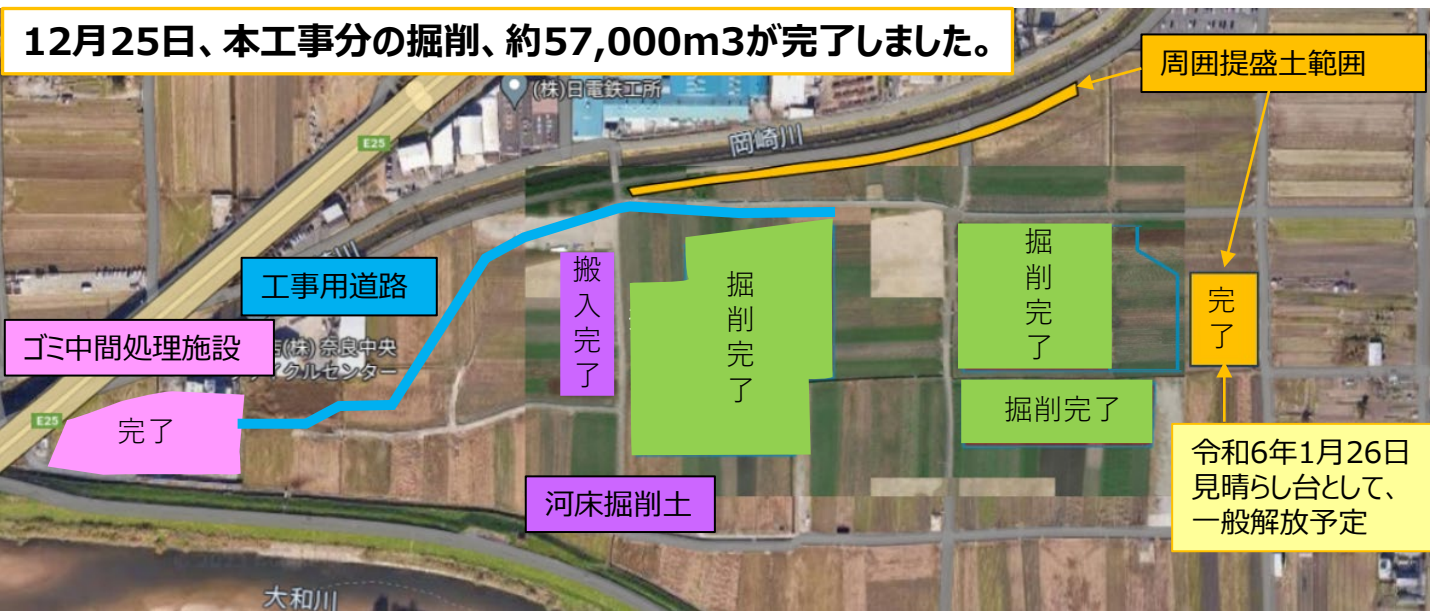

## ○ゴミ中間処理施設の造成の状況

1月20日、本工事分の盛土、約16,000m<sup>3</sup>が完了しました。



令和6年1月20日時点

## 【問い合わせ先】

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課  
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号  
TEL / 072-971-1381 (代)

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所  
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8  
TEL / 0745-73-6571
