

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年3月12日



バックナンバーは  
QRコードを読み  
込み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事  
工 期：令和3年1月8日～令和3年10月31日

3月

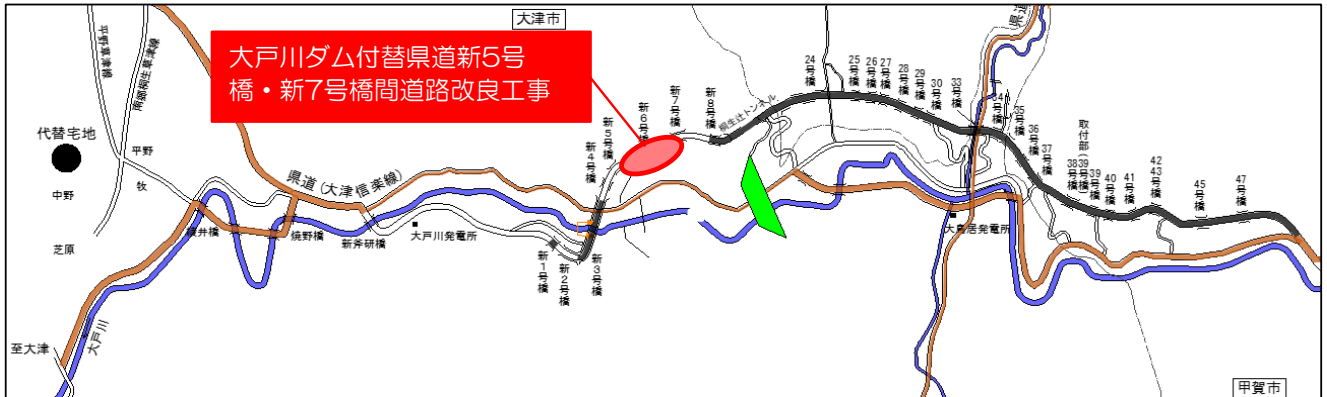

現在の施工位置



今後の予定：  
3月初旬頃より掘削を開始。4月から落石対策工を実施し順次掘削して参ります。

現場代理人コメント

日ごとに暖かさを感じられるようになりましたが朝夕はまだまだ冷え込みが厳しく体調管理の難しい季節となりました。  
現場は3月初めから工事に取り掛かり、岩石の多い地山に苦戦しておりますが作業員一丸となって知恵を絞り、安全第一で作業して参ります。  
今後も工事用車両等の出入りが多くなります。ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。



現場代理人  
佐野 邦生

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年3月12日



バックナンバーは  
QRコードを読み  
込み大戸川ダム工事  
事務所HPへ



工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事  
工期：令和2年11月7日～令和3年11月19日

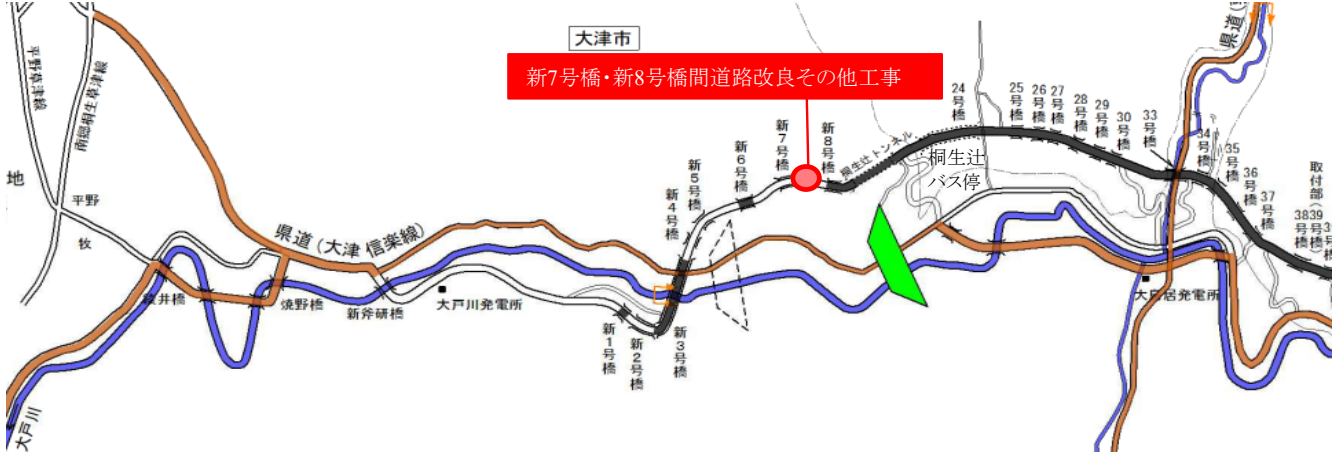


【現在の作業】11号補強土壁のコンクリートパネルを大津方面へ下段から積上げています。

【今後の予定】11号補強土壁—5月中に左下写真の足場の先端までコンクリートパネルを積み、クレーンを前方に移動します。移動後、前方の樹木の伐採と搬出を行います。

## 工事現場の施工状況

## 監理技術者のコメント

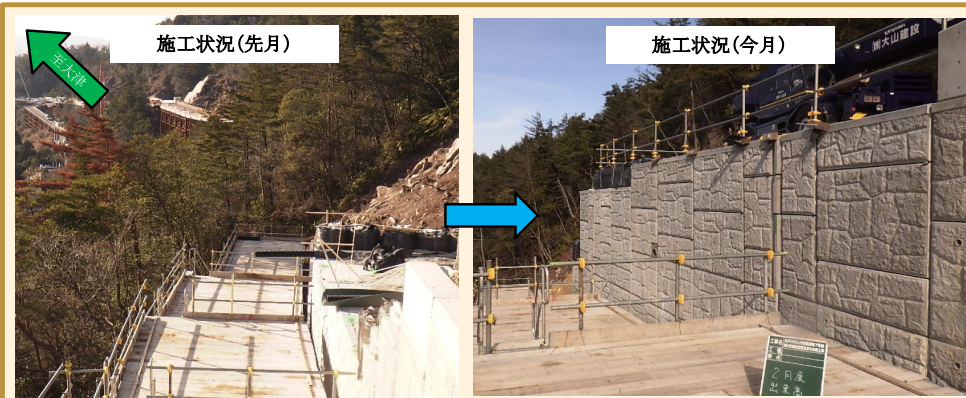

寒波の到来や寒暖の差が大きい毎日ですが、健康管理に気をつけています。  
引き続き安全第一で頑張ります。

監理技術者  
米田 剛



**Ohyama (株) 大山建設**

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-1700  
077-549-1705

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年3月12日



バックナンバーは  
QRコードを読み  
取り大戸川がM工事  
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事  
工期：令和2年1月16日～令和3年4月30日

3月

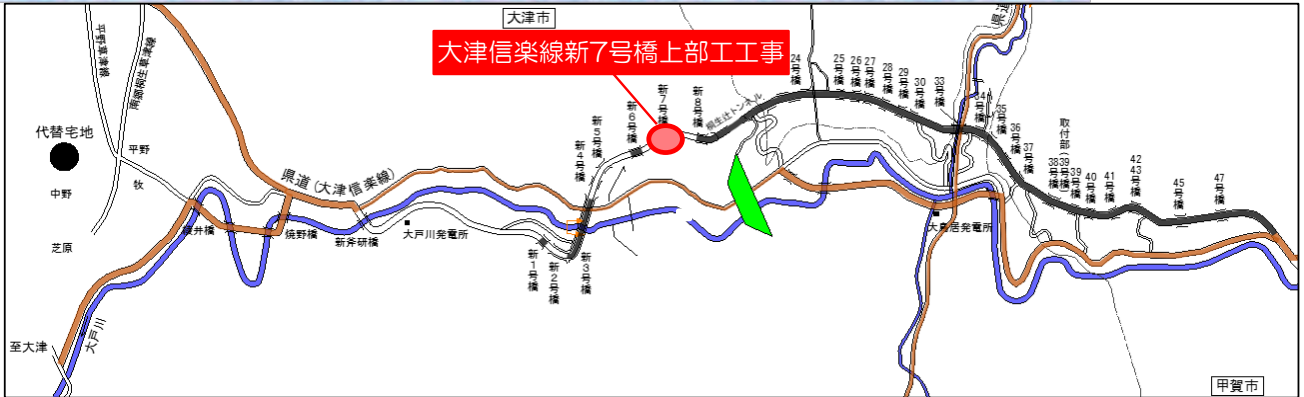

## 現在の状況


### 現場代理人コメント



今月の10日、16日と床版コンクリートの打設が完了しました。 今月は、いよいよ最終段階の施工となります。引き続き壁高欄コンクリートの打設、伸縮装置の据付を予定しています。月末からは足場の解体作業に取り掛かります。朝夕と冷え込みがまだ厳しい日々が続きますが、健康管理に留意し安全第一で進めてまいります。

現場代理人 鶴田 政宏

現在の作業：壁高欄ほか橋梁付属物取付の施工を進めています。  
今後の予定：壁高欄工、伸縮装置工、転落防止柵工、足場解体工を予定しています。

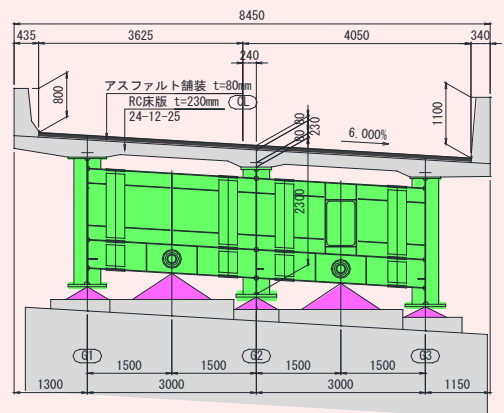

**KH** 株式会社 駒井ハルテック  
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-2546  
077-549-2547

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年3月12日



バックナンバーは  
QRコードを読み  
込み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流道路改良工事  
工期：令和2年7月7日～令和3年3月26日

3月

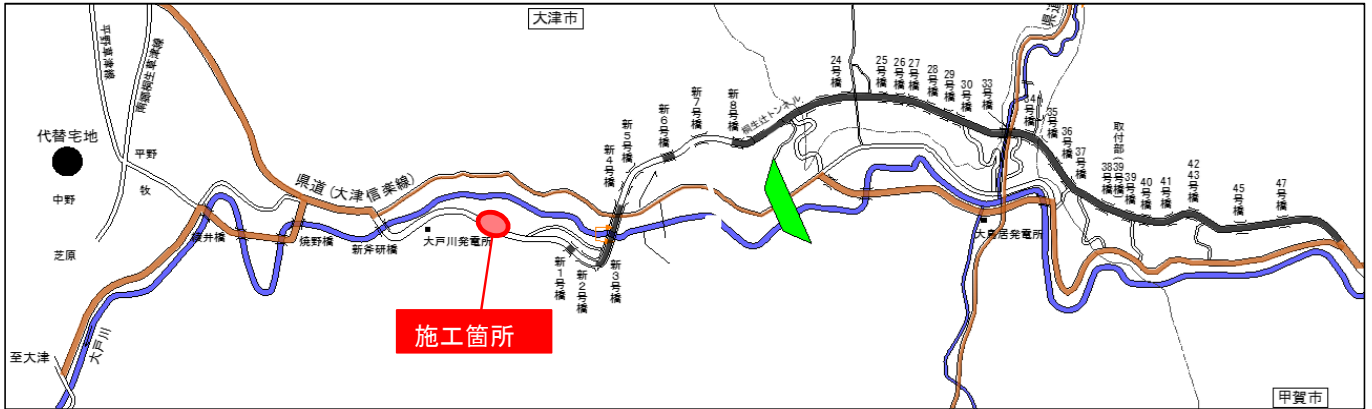

排水構造物工 側溝設置完了。転落防止柵設置中です。

現場代理人のコメント



転落防止柵設置状況



排水構造物 側溝設置完了

工期も残り1ヶ月となりました。  
転落防止柵、ガードレール設置、  
舗装とまだまだ現場は慌ただしく  
動きます。最後まで安全作業で現  
場を進め、工事完成を目指ます。

現場代理人  
山口 博孝



**OhyAMA** 株式会社 大山建設

【現場事務所】  
【電話】  
【FAX】

滋賀県大津市上田上牧町1131  
077-549-0583  
077-549-0583

# 大津信楽線付替工事ニュース

令和3年3月12日



バックナンバーは  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ


工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事

当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日

(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

3月

工事箇所位置図

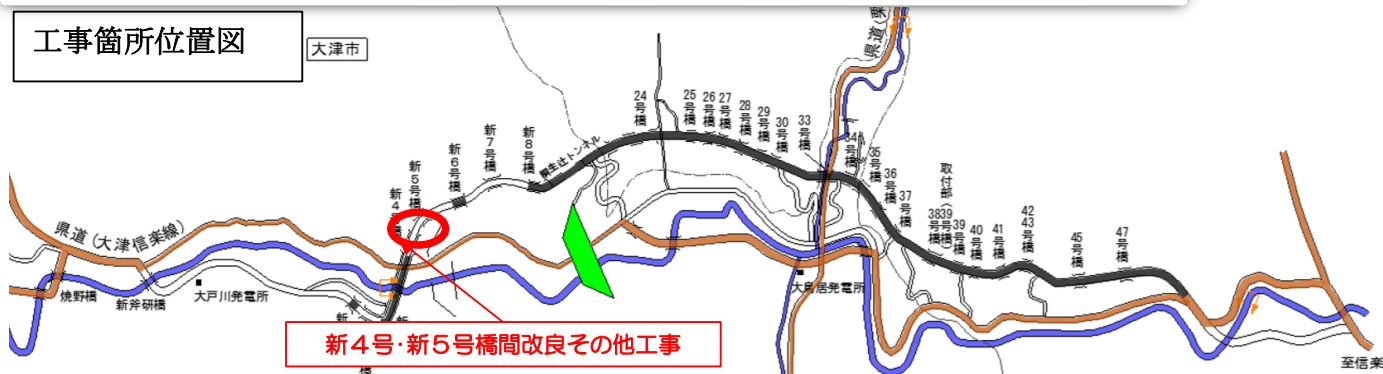

新4号・新5号橋間改良その他工事

着工前



新4号橋

新5号橋

完成



新4号橋

新5号橋

着工前



着工前



完成





完成



## 現場代理人コメン

この度、無事工事完成を迎えることができました。工事着手時は、写真の通り転石がゴロゴロ見えている状態で、どのように事故無く円滑に工事を進めるかが課題でした。工事中は表面以外にも転石が多くあり、大変苦勞しましたがなんとか事故無く、工事を完成させる事ができました。約1年間お世話になり、ありがとうございました。

現場代理人  
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0151

【FAX】 077-549-0155

# 大津信楽線付替工事ニュース

令和3年3月12日




ハックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事  
工期：令和2年2月18日～令和3年7月30日

3月

工事箇所位置図

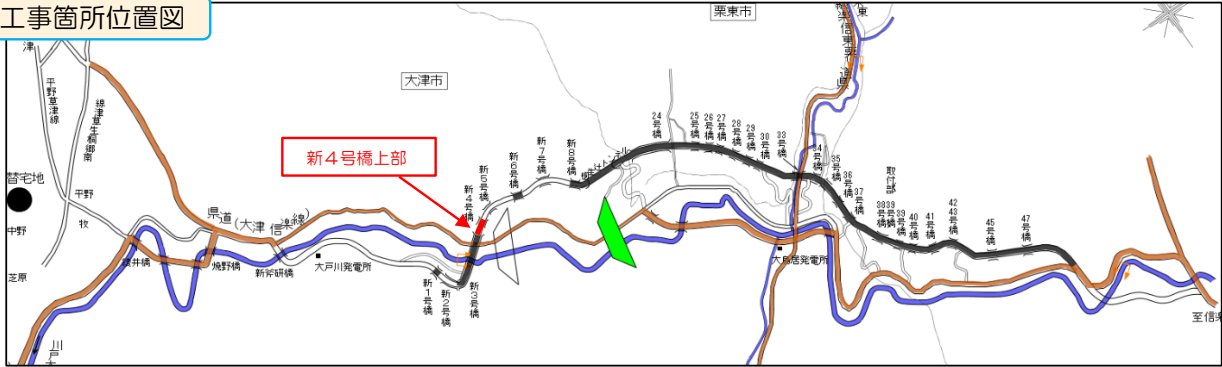

現場位置図



現場の進捗状況

PC箱桁製作工の2次施工範囲のコンクリート打設が無事完了し、橋梁本体としての形が出来上がりました。今後、緊張・グラウト工が完了した後は、型枠・支保工の解体が始まります。場内の整理整頓に努め、周囲に十分気を付けて施工を行います。



## 現場代理人のコメント

現場作業は予定通り進行しています。今月作業予定は、PCケーブルの緊張、グラウト充填、型枠支保工の解体作業を予定しています。資機材の搬出の大型車両が多くなります。一般車両最優先で運行管理を行ってまいります。安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。



請負者：昭和コンクリート工業(株)  
現場代理人：渡邊泰全  
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先  
事務所TEL：077-549-2370

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年3月12日



バックナンバーは  
QRコードを讀込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線上流区間他舗装その他工事  
工期：令和2年11月18日～令和3年3月31日

3月

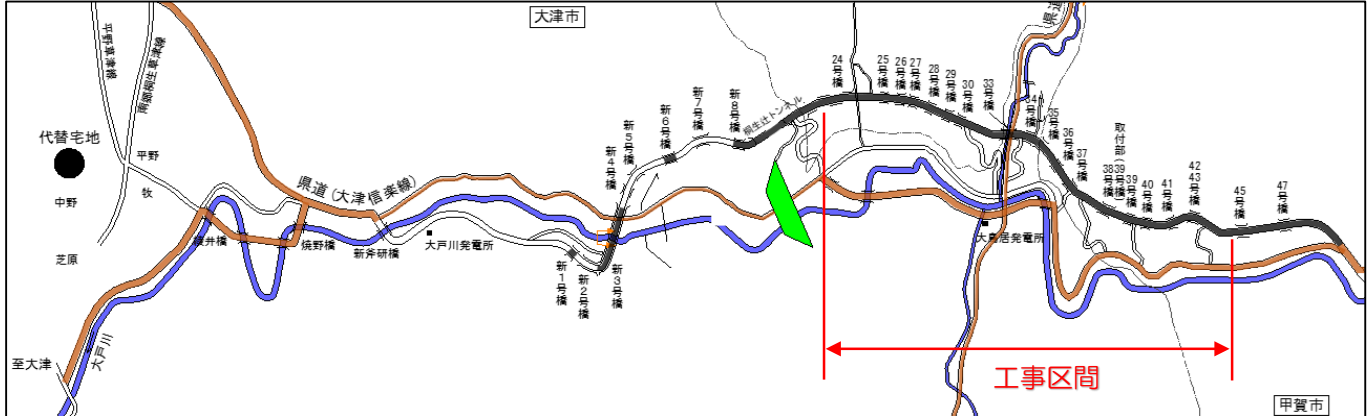

## 現在の状況



## 現場代理人コメント

3月となり、本工事もメインの舗装工事が8割完了しました。当作業所では、引き続き新型コロナウイルス対策を行い、安全第一で快適な道路づくりに取り組んでまいります。県道大津信楽線を通行される皆様方には、大型車両の往来で一時的にご迷惑をお掛けしますが、交通には十分配慮して通行いたしますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。



請負者：近江道路土木(株)  
現場代理人：増田 晋一

現場事務所：甲賀市信楽町黄瀬3315番地  
電話 0748-60-6747
