

大津信楽線付替工事ニュース



令和4年6月



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ



工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工 期：令和2年11月7日～令和4年8月31日

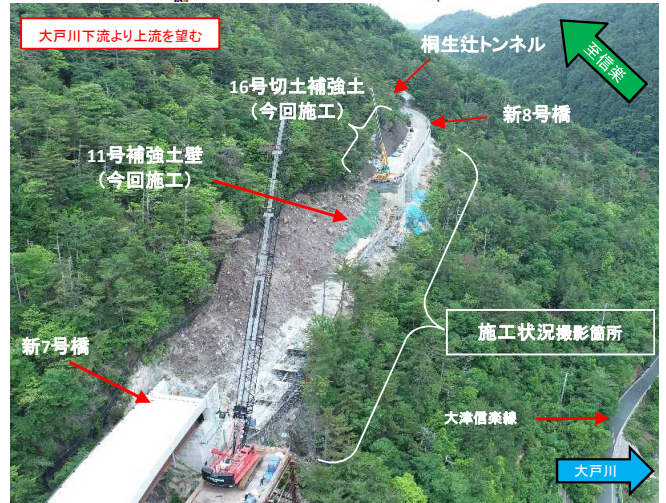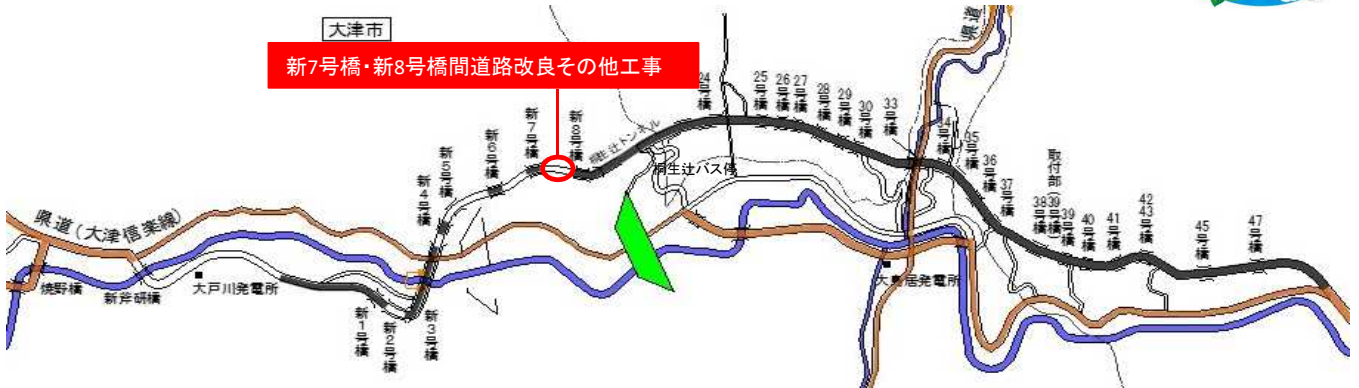


【現在の作業】11号補強土壁基礎部のコンクリート打設完了→ 型枠脱型。
【今後の予定】11号補強土壁擁壁部の支柱建込 → 壁面材設置 → 軽量盛土材設置を行って行きます。

工事現場の施工状況


施工状況
(4月末)


→



施工状況
(5月末)

→





軽量盛土

基礎コンクリート

監理技術者のコメント

擁壁の土台となる基礎コンクリートの生コン打設が完了しました。6月初旬より、擁壁本体の施工を開始します。今後は更に作業員さんを増員し無理のない施工で安全に工期短縮を図り、早期完成を目指して進めて参ります。今後ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

OhYAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年6月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和4年10月31日

6月

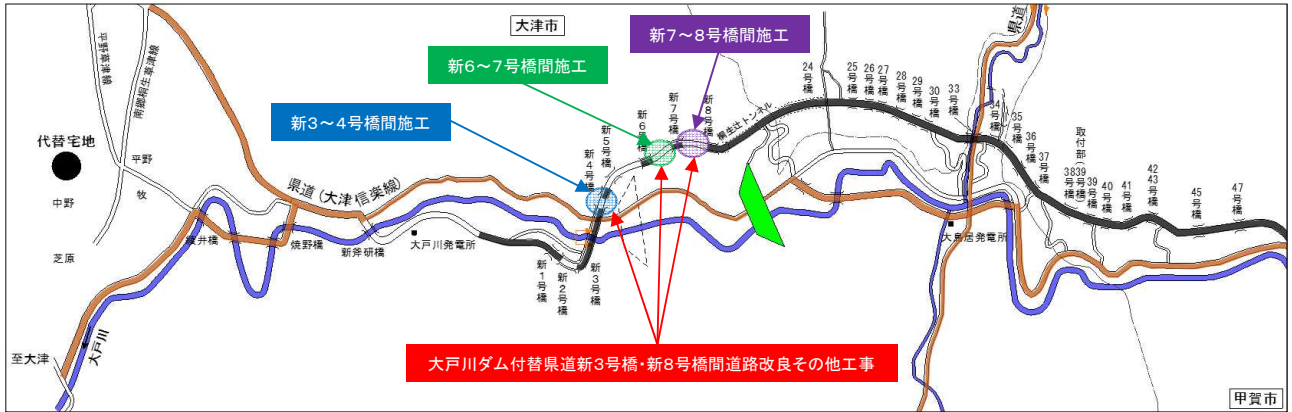

新3～4号橋間施工箇所

令和3年6月



新3号橋

新4号橋

令和4年6月



新3号橋

新4号橋

新6～7号橋間施工箇所

令和3年6月



新6号橋

令和4年6月



新6号橋



新7号橋



新7号橋

新7～8号橋間施工箇所

令和3年6月



令和4年6月



作業内容: 11号補強土壁

現場代理人：寺内 敬嗣

工事開始から約1年が経ち、その進捗写真を掲載しています。崖のような山を切り開き、道路を作る工事ですので思うように進みませんが、これからも関連・協力業者さまと共に安全に事故の無いように工事完成を目指します。引き続きご協力のほど、よろしくお願い致します。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース

令和4年6月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事
工期：令和3年8月5日～令和4年6月15日

6月



33号橋付近工事現場全景(甲賀から大津に向けて)



路肩舗装施工前

33号橋付近工事現場全景(甲賀から大津に向けて)



路肩舗装施工完了

現場代理人：野々村 英樹

現場作業は5月末に無事故で全工程を終了することができました。6月に完成検査をもって、工事完成を迎えます。工事期間中は、地域の皆様のご理解・ご協力をいただきありがとうございました。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年6月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工期：令和3年8月11日～令和4年11月30日

6月

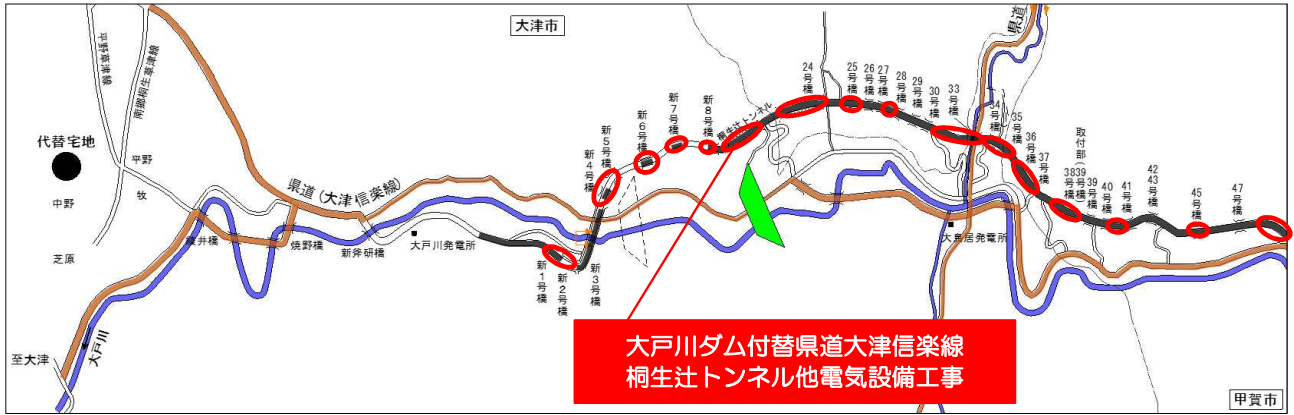

桐生辻トンネル(大津方面)から撮影



桐生辻トンネル(信楽方面)から撮影

凡例： 取付箇所

【現在の作業】 トンネル照明用ケーブル配線作業を行っています。



トンネル照明用ケーブルの配線作業が完了し、灯具との接続も完了しました。
受電がまだですが、点灯するのがとても待ち遠しいです。
来月は照明柱基礎設置箇所の岩盤掘削工事、基礎設置工事等を行ってまいります。

近畿地方も梅雨入りし湿度も高くなってきましたので熱中症対策をし、安全第一に引き続き作業を行って参ります。



現場代理人
下矢 智一

Dewey 株式会社デューイテクニカル

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0007

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年6月



バックナンバーは
QRコードを眺込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事
工期：令和4年2月19日～令和4年9月30日

6月

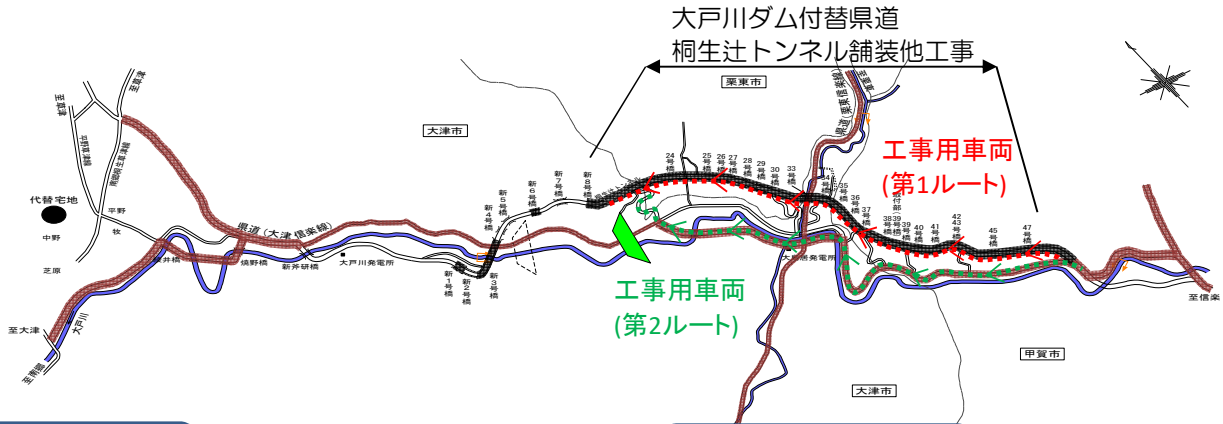

桐生辻トンネル
(大津側より)



トンネル工
(はく落・漏水対策)

舗装工
(コンクリート舗装)

24号橋 (大津側より)



防護柵工 (嵩上げ)

【現在の作業】 現地測量及び防護柵工（嵩上げ）の工場製作を行っております。
【今後の予定】 防護柵工（嵩上げ）・トンネル工・橋梁補修工を行います。

24号橋
(着工前)



橋梁補修工
(ひび割れ補修)

現場代理人コメント

早期完成を目指し安全第一で進めてまいります。
ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

現場代理人
香水 達弥



DYNAMIC SHOKEN
株式会社 昭建

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1728
077-549-1728

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年6月



バックナンバーは
QRコードを隠込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事
工期：令和4年2月22日～令和4年10月21日

6月

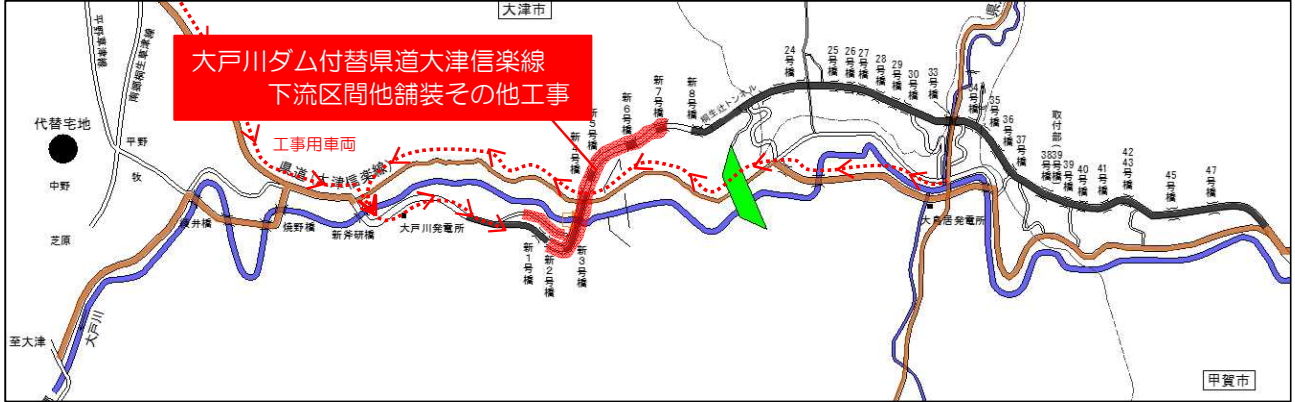

付替県道（新7号橋から新2号橋間）



■主な工事内容

ブロック積工、排水構造物工、橋梁付属物工、防護柵工、アスファルト舗装工、区画線工他

■現在の作業

市道(左岸線)でコンクリートブロック積工を行っています。

■今後の作業予定

引き続き市道(左岸線)でコンクリートブロック積工、排水構造物工、道路土工を行います。

市道(左岸線) コンクリートブロック積 施工中



(市道(左岸線))



監理技術者のコメント

現在、市道(左岸線)で作業を進めております。道路幅が狭く重機やダンプも数多く動いており大変危険です。車両通行止となっておりますので、御用の方は現場の職員にお声を掛けていただければ幸いです。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

監理技術者
岸 純一郎



未来につなぐ確かな道づくり
戸田道路株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上牧町斧研
050-5371-1865
050-5371-1866
