

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年12月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和5年2月17日

工事完了

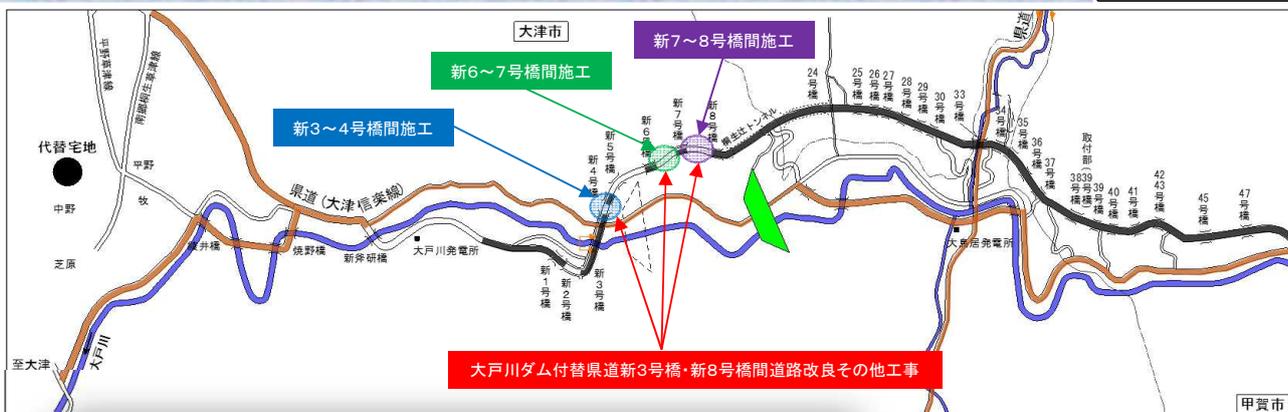

着工前



完工



現場作業は11月30日に無事故で全工程を終了することが出来ました。
工事期間中は、地域の皆様のご理解・ご協力を頂きまして誠にありがとうございました。



現場代理人：寺内 敬嗣



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース

令和4年12月




バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工期：令和3年8月11日～令和5年3月31日

12月




新4号橋起点から撮影

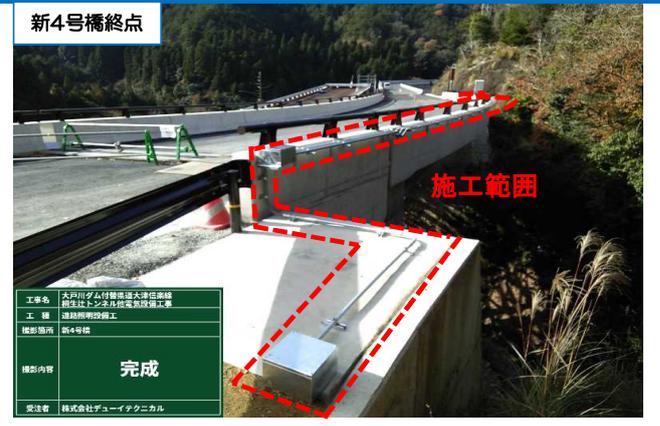

新4号橋終点側から撮影

【現在の作業】 橋梁照明の配管敷設作業を行っています。




- 現在の作業
道路照明：6号橋、7号橋、8号橋
(いずれも起点側) 建柱
- 今後の作業予定
道路照明：6号橋、7号橋
(いずれも終点側) 建柱
- 橋梁照明：45号橋
凍結表示板：4基

新4号橋の橋梁配管工事が完了しました。橋が少しカーブしていますので、配管を微妙に曲げて敷設しました。露出用の配管は厚みがあるため、油圧ベンダーで曲げても少し元になるので、その分を考量しながら微妙な力加減で配管を曲げています。

来月は、トンネル上流側の橋梁配管を予定しています。

気温も低くなり、冬らしくなってきました。体調管理、安全作業で引続き作業を行ってまいります。



大津信楽線付替工事ニュース


令和4年12月



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事
工 期：令和4年2月19日～令和5年3月31日

12月

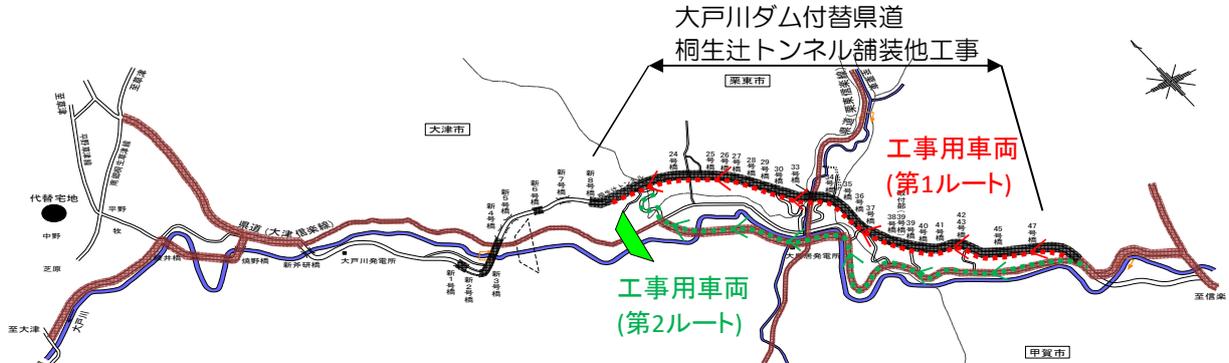

桐生辻トンネル



トンネル坑口 補修完了

トンネル下流側



橋梁下部の法面保護施工中

新7号～新8号橋



法面に切土補強土工、
防護柵工の施工中

トンネル上流側



24号橋、33号橋、五本松
交差点の溝(グレーピング)の
設置完了

【現在の作業】

アクトから引き継いだ、トンネル下流側の軽量盛土を完成させ、法面の切土及び切土補強土工・防護柵工と各橋梁の下の法面保護工を施工中です。

【今後の予定】

引き続き新7号～新8号間の舗装工及びトンネル上流側の法面工、防護柵工を施工します。

寒くなってまいりましたが天候には恵まれて順調に工事進んでおります。体調に気を付けて引き続き早期開通を目指し頑張っております。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

監理技術者
香水 達弥



現場事務所
電話 077-549-1728
FAX 077-549-1728

大津市上田上桐生町地先
077-549-1728
077-549-1728

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年12月



バックナンバーは
QRコードを隠込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事
工期：令和4年2月22日～令和5年3月31日

12月

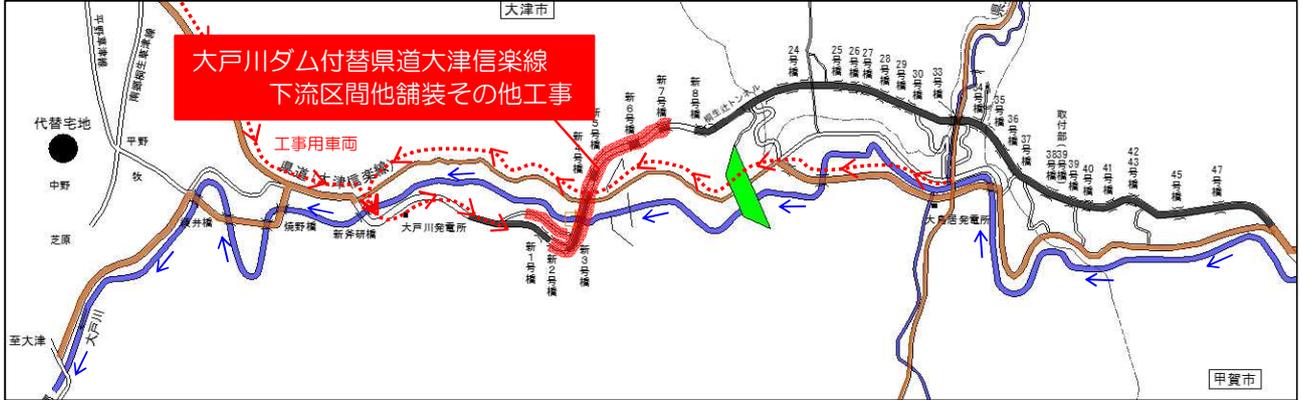

付替県道（新7号橋から新2号橋間）



- 現在の作業
市道(左岸線)-----工事用取付道路の撤去
付替県道-----軽量盛土工及び防護柵
- 今後の作業予定
市道(左岸線)-----工事用取付道路の撤去
付替県道-----小型標識等の基礎工、舗装工

■ 付替県道 現在の施工状況
これまで、付替県道施工箇所への出入りに使用しておりました仮橋・仮栈橋の進入箇所をいよいよ塞ぐ工事に着手しました。1月中旬より新2号橋～新7号橋間の舗装工を開始していく予定です。



(市道(左岸線))



■ 監理技術者のコメント
工事は最終の舗装工開始に向けて順調に進んでいます。年末年始を目前にして気を緩めることなく、安全には十分注意・配慮していきます。今後ともご理解、ご協力の程宜しくお願いします。

監理技術者
岸 純一郎



未来につなぐ確かな道づくり
戸田道路株式会社

現場事務所 大津市上田上牧町斧研
電話 050-5371-1865
FAX 050-5371-1866
