

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年6月16日


工事名: 大津信楽線左岸部道路整備工事

工事の進捗


- ・[高盛土部]: 仮置き場での積込 運搬 盛土作業と、排水工を施工しています。
- ・[3号切土補強部]: 法面補強工を施工しています。
- ・[4号切土補強部]: 法面補強工を施工しています。

今後の予定

- ・7月も継続して、大鳥居信号付近の仮置き場より、高盛土部へ土砂運搬し盛土施工します。
- ・7月より、3号補強土壁及び5号補強土壁の施工に着手します。

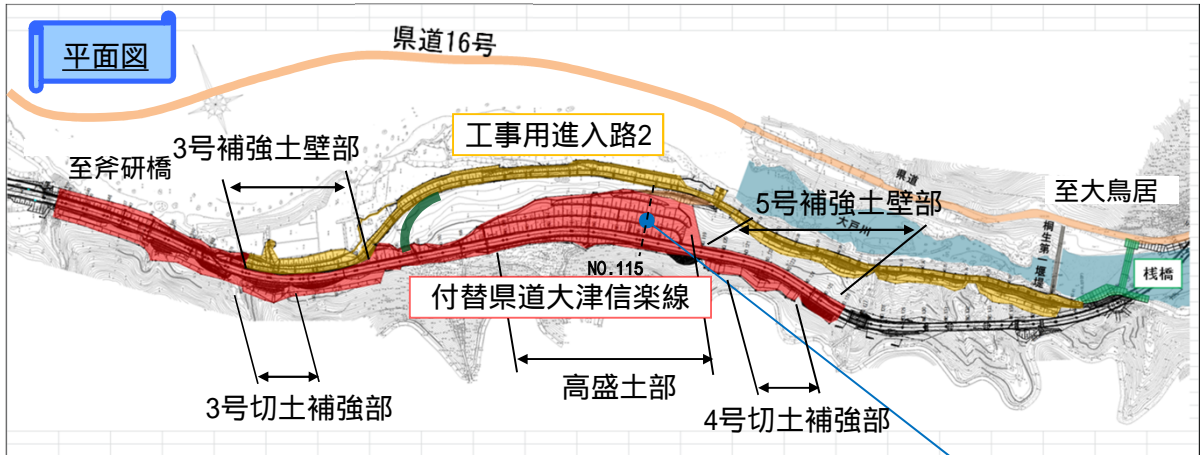

横断面図 (Cross-section Diagram)

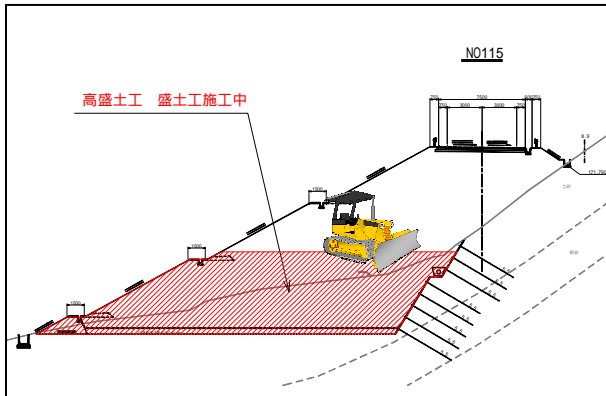

付替県道現況写真(6月14日)
(No.115付近)
搬入土により高盛土部の盛土を施工しています。



工程表 (Gantt Chart)

作業内容	6月			7月			8月			9月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31
4号切土補強土工	██████████			██████████								
3号補強土壁工				██████████			██████████			██████████		
5号補強土壁工							██████████			██████████		
高盛土工	██████████			██████████			██████████			██████████		

高盛土部 全体写真 (Overall Photo of High Embankment Section)



奥村組
 大津信楽道路工事務所
 〒520-2161
 滋賀県大津市上田上桐生町地先
 TEL 077-549-2032
 FAX 077-549-2052

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年6月16日

工事名:大戸川ダム管内護岸補修工事

〈工事の進捗〉

- ・【7工区】:4月21日(火)に区画線を設置し、工事規制を解除しました。
- ・【2工区】:5月中旬より法面コンクリート擁壁工のコンクリート打設が完了しました。

〈今後の予定〉



- ・【7工区】:作業予定はありません。
- ・【2工区】:工事用道路の撤去作業を行います。
※工事用道路の土砂撤去のため、6月22日頃より7日間程度夜間通行止め(桐生町～大鳥居町)を予定しています。ご不便をおかけしますが皆様のご協力をお願いします。

【2工区(桐生地区)の作業状況】



(上の写真)

法覆護岸工(コンクリート擁壁)のコンクリート作業が完了しました。

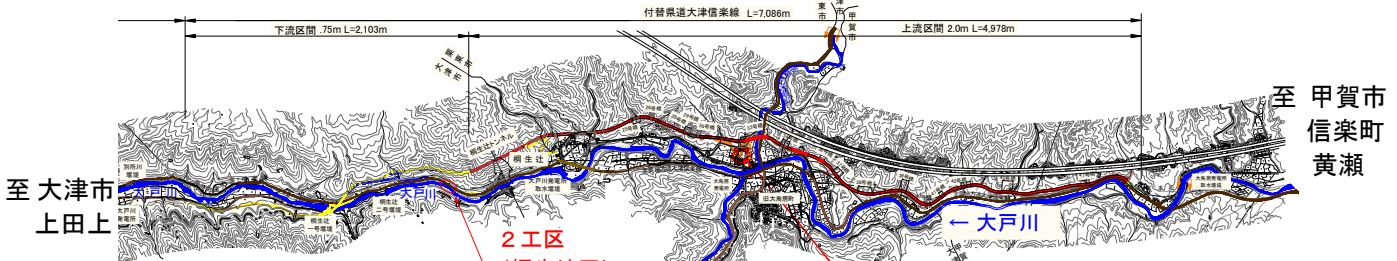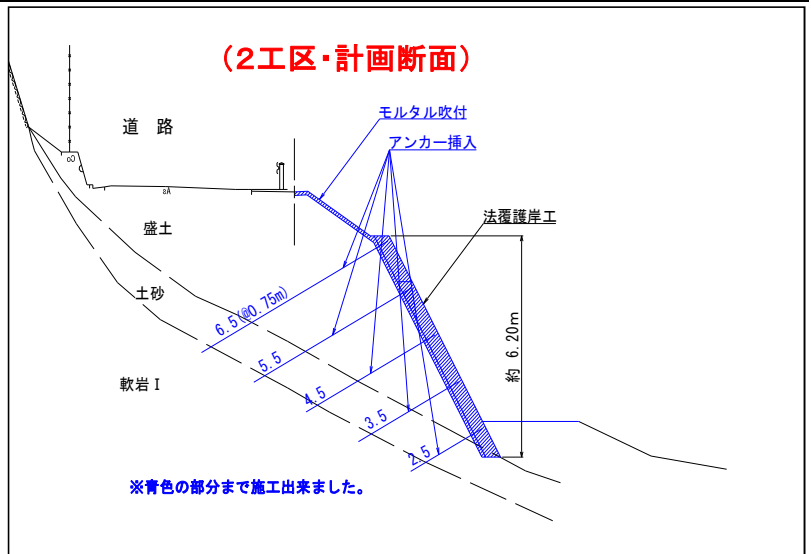

(2工区:上の写真)

工事用道路(赤丸の部分)の土砂撤去を行います。

【工程表】

	6月	7月	8月	備考
(2工区)				
準備工				
仮設工	■			
法覆護岸工	■			
後片付け		■		
(7工区)				

【7工区(大鳥居地区)の進捗状況】



(左の写真) 完成しました。

請負者:(株)大同
 現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)
 TEL: 090-8932-7433

現場事務所: 滋賀県大津市上田上大鳥居地先
 TEL: 077-549-2703
 FAX: 077-549-2703

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年6月16日

工事名：大津信楽線新3号橋工事


〈工事の進捗〉

- ・【県道】5月20日(水)迂回路仮栈橋に切り替えました。
- ・【P1橋脚】基礎掘削のための土留めH鋼杭を打設しています。
- ・【P2橋脚】作業ヤードとなる仮栈橋工の基礎コンクリートの施工を行っています。



〈今後の予定〉

- ・【P1橋脚】7月も継続して土留め工の施工を行います。
- ・【P2橋脚】7月より、落石防止柵工の施工に着手します。

平面図

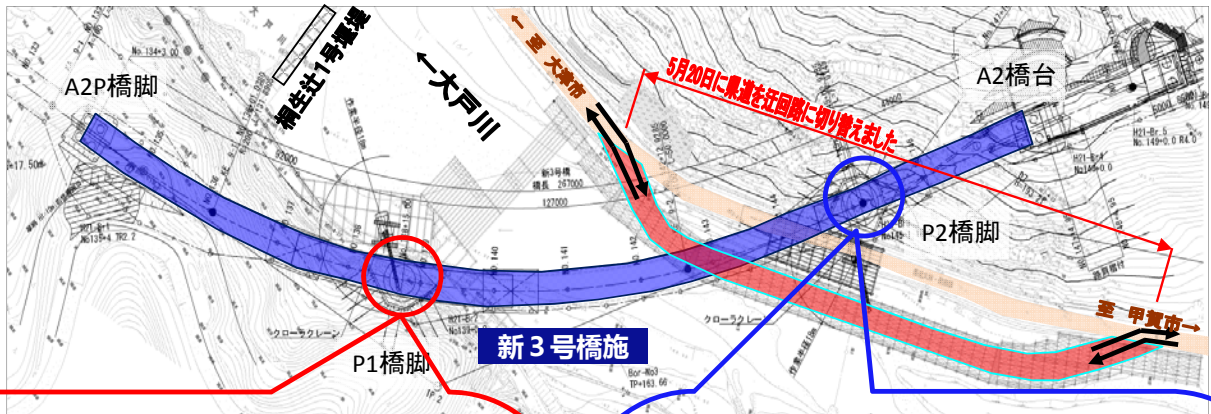

側面図

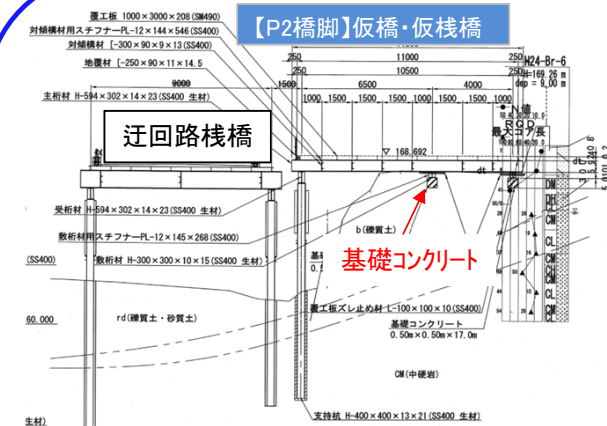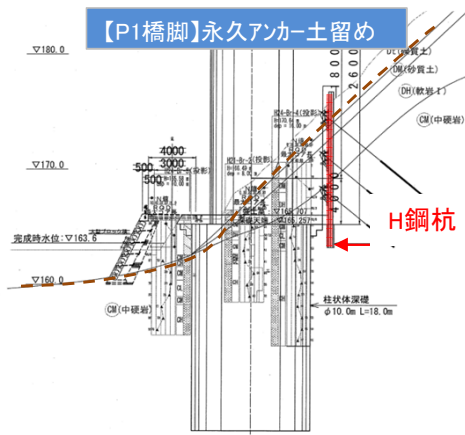

施工状況

(P1橋脚)



(P2橋脚)



工程表

作業内容	6月			7月			8月			9月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
【P1橋脚】 永久アンカー土留め	■■■■■			■■■■■			■■■■■			■■■■■		
深礎工	■■■■■			■■■■■			■■■■■			■■■■■		
【P2橋脚】 仮橋・仮栈橋工	■■■■■			■■■■■			■■■■■			■■■■■		
落石防止柵工	■■■■■			■■■■■			■■■■■			■■■■■		
擁壁撤去工	■■■■■			■■■■■			■■■■■			■■■■■		
永久アンカー土留め	■■■■■			■■■■■			■■■■■			■■■■■		

KAWADA 川田建設(株)

大津信楽線新3号橋工事事務所

〒520-2161

滋賀県大津市上田上桐生町地先

TEL : 077-549-0103



FAX : 077-549-0109

工事名： 桐生地区工事用進入路整備工事
施工者： 株式会社 桑原組

【 平面図 】

凡例

- 本工事施工進入路
- (前年度)施工済進入路

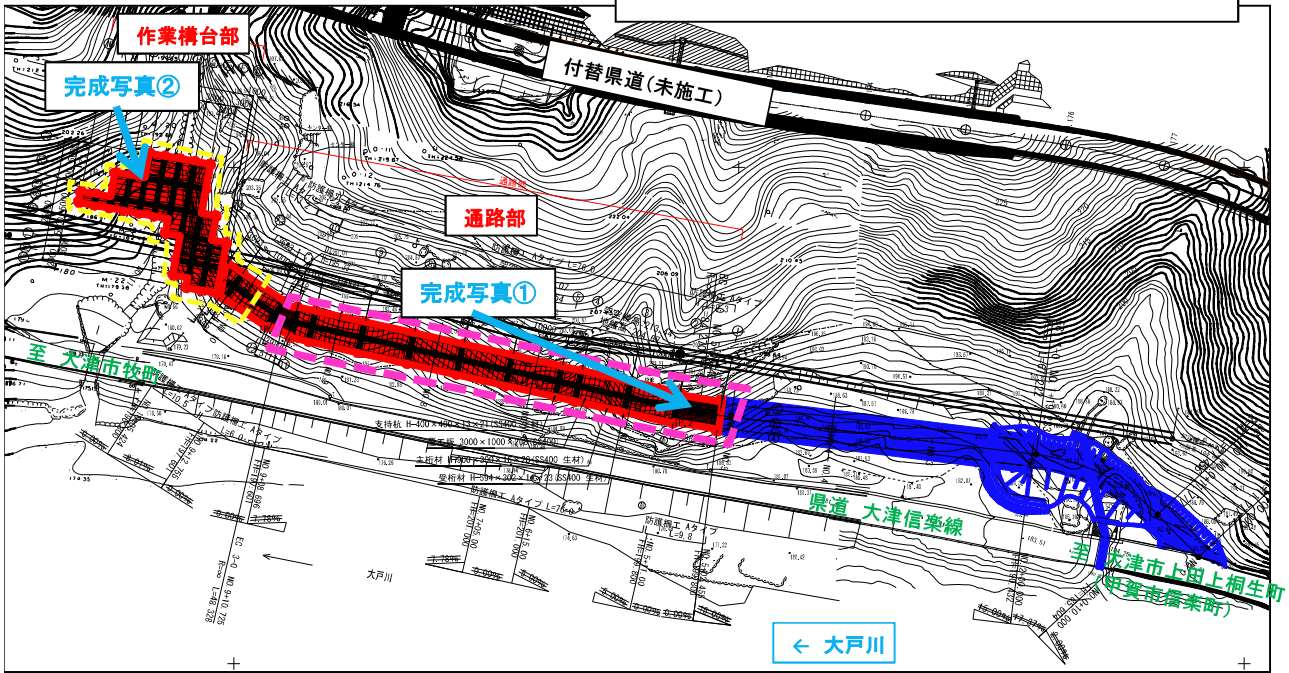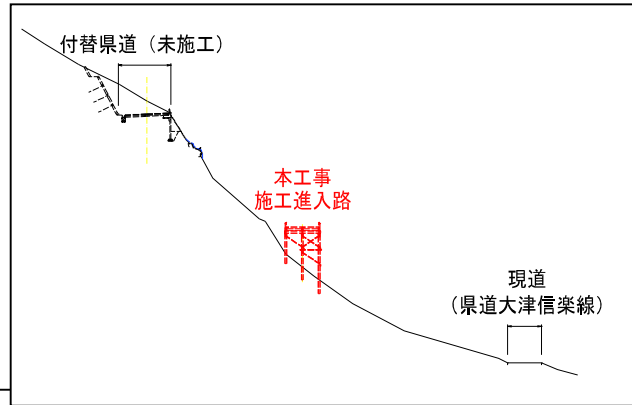

● 工事が完成しました。

完成写真① 通路部



完成写真② 作業構台部




工事期間中は、片側交互通行規制や仮囲いの設置などで、ご通行の際には大変ご迷惑をおかけしました。この度無事故で工事完了を迎えることができ、皆様方のご理解とご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

※ ホームページで工事の状況等を配信しています。

<http://ntamamura.wix.com/daidogawakiryuu>

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

- 平成 27年 3月 30日を持ちまして、工事を完成することができました。

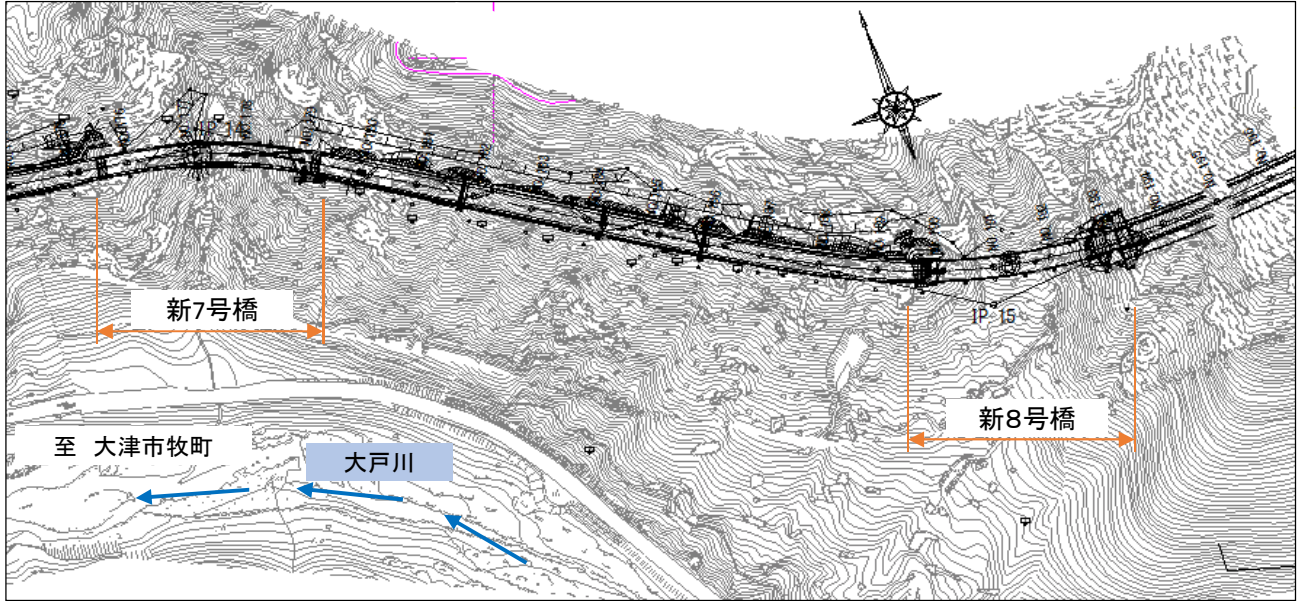

【新8号橋】 橋台が完成しました。



【新7号橋】 基礎施工作業台が完成しました。



大津信楽線付替工事ニュース

完成済み


平成27年4月16日

工事名：大津信楽線落石対策工事

工期：平成26年10月23日～平成27年3月30日


工事概要：落石雪害防止工 ワイヤネット被覆工 97㎡、落石防止網工 ロープ伏 614㎡ ロープ掛 111㎡
落石防止柵工 542m、小割除去工 29m³、仮設工 落石防止柵工 88m モルレル工 1,657m

【施工位置図】

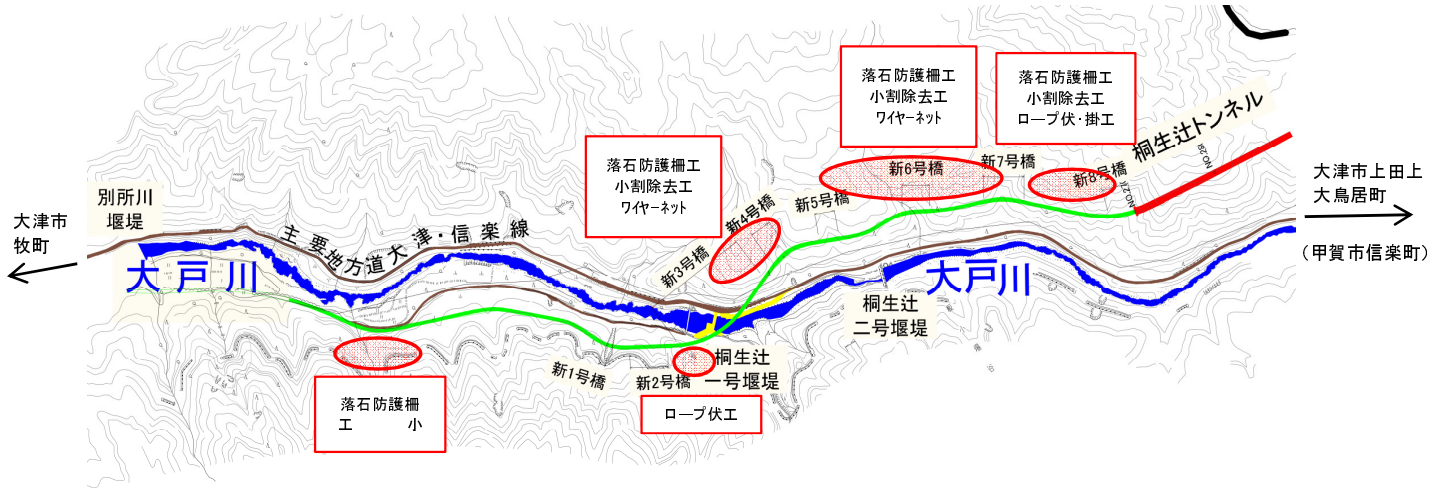

落石対策工 施工概要図

ロープ掛工 施工完了

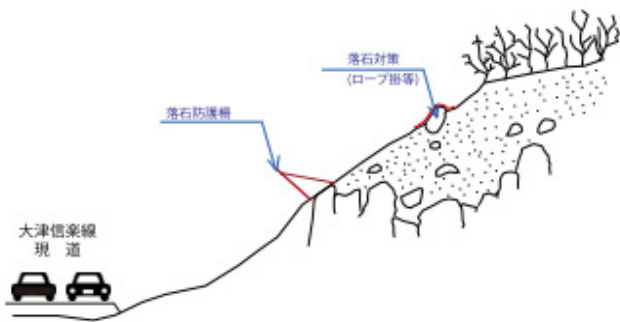

ワイヤネット被覆工 施工完了

落石防護柵工 施工完了



【工事説明】

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

上記写真は、当工事の落石対策の各工種(ロープ掛工・ワイヤネット被覆工・落石防護柵工)の施工完了状況写真です。

3月30日(月)を持ちまして、当工事は全て完了いたしました。

工事中は何かとご不便をお掛けいたしました。皆様のご理解・ご協力のもと、無事工事を完了できましたこと、お礼申し上げます。

施工者
会社住所
電話番号

イビデングリーンテック(株)関西支店
神戸市中央区脇浜町2-11-14
TEL 078-291-5585
