

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年10月16日

工事名: 大津信楽線左岸部道路整備工事

## 工事の進捗


- ・[2号切土補強部]: 植生基材吹付施工が終了し、法面補強が完了しました。
  - ・[5号補強土壁部]: 掘削法面の鉄筋挿入工による補強は完了しました。
  - ・[5号補強土壁部]: 補強土壁の基礎の掘削～均しコンクリートを施工しています。
- 今後の予定
- ・11月は断続的に、大鳥居信号付近の仮置き場より、補強土壁部へ土砂運搬し補強土壁盛土を施工します。
  - ・11月より、5号補強土壁の構築を行います。

**奥村組**  
 大津信楽道路工事所  
 〒520-2161  
 滋賀県大津市上田上桐生町地先  
 TEL 077-549-2032  
 FAX 077-549-2052


2号切土補強部状況写真



3号補強土壁部状況写真

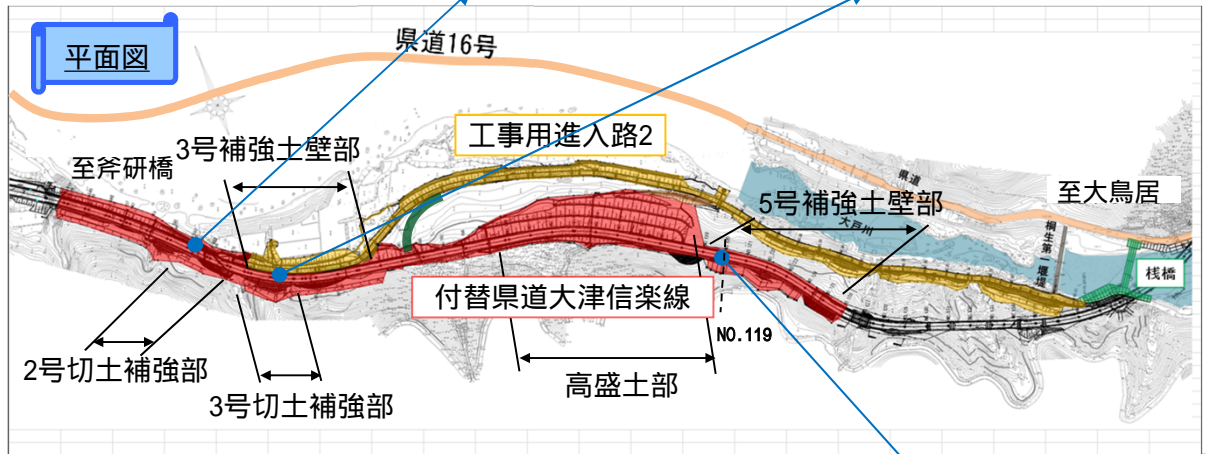

横断面図

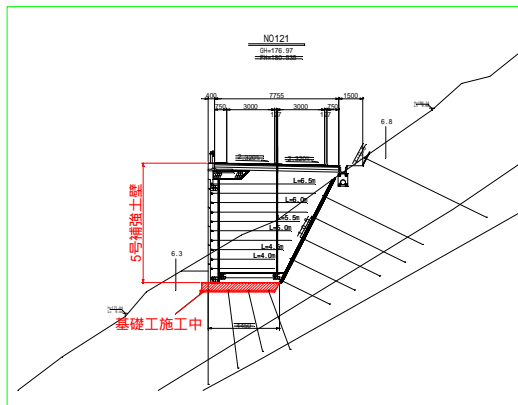

付替県道現況写真(10月15日)  
(No.121付近)  
5号補強土壁の基礎工を施工しています。



工程表

作業内容	10月			11月			12月		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31
2号切土補強土工	████████████████████								
3号補強土壁工	████████████████████			████████████████████					
5号補強土壁工				████████████████████			████████████████████		
高盛土工							████████████████████		

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年10月16日

工事名：大津信楽線新3号橋工事


## 〈工事の進捗〉

- ・【P1橋脚】 深礎杭の施工をしています。  
発破による岩盤掘削に伴い、5日間に1回程度、1回あたり10分程度、1日最大2回の通行止めを行います。
- ・【P2橋脚】 土留め杭の施工をしています。

## 〈今後の予定〉

- ・【P1橋脚】 10月も引き続き深礎杭の施工を行います。
- ・【P2橋脚】 10月も引き続き土留め杭の施工を行います。


### 平面図

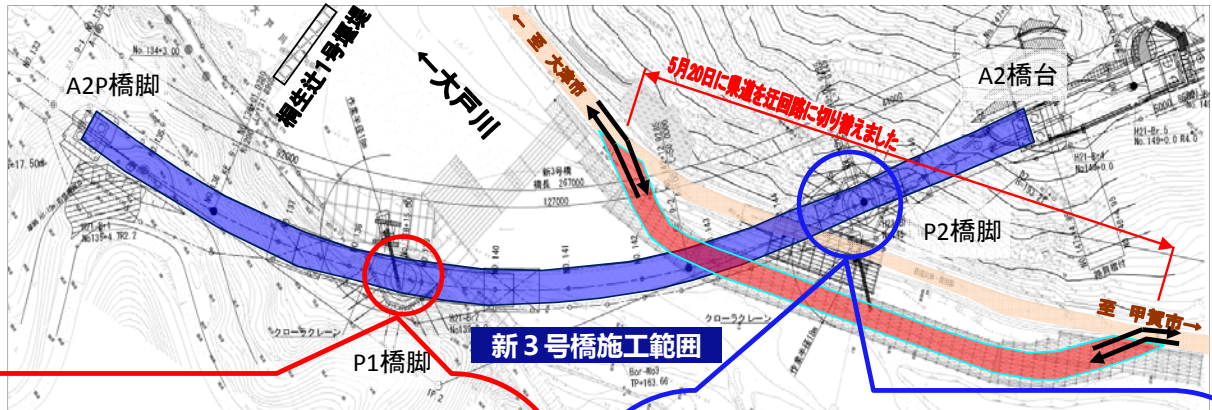

### 側面図

#### 【P1橋脚】 深礎工

#### 【P2橋脚】 永久土留め工

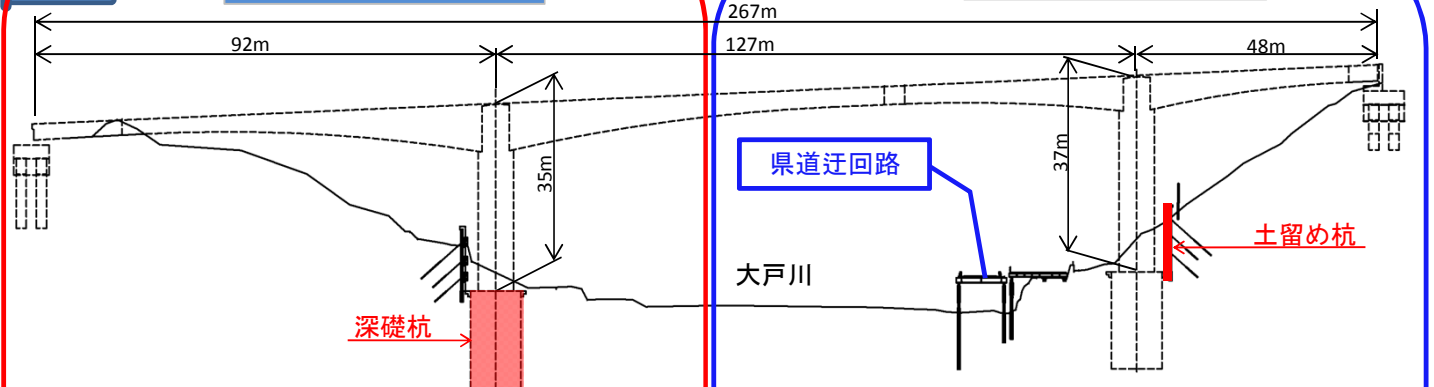

### 施工状況

(P1橋脚)

深礎杭の掘削を行っています。



(P2橋脚)

土留め杭を施工しています。



### 工程表

作業内容	10月			11月			12月			1月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
【P1橋脚】 深礎工												
【P2橋脚】 永久土留め工												

**KAWADA** 川田建設(株)

大津信楽線新3号橋工事事務所

〒520-2161

滋賀県大津市上田上桐生町地先

TEL : 077-549-0103

FAX : 077-549-0109

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年10月16日

工事名：大津信楽線工事用仮橋整備工事

## 〈工事の目的〉

- ・新しい大津信楽線の工事箇所まで進入するための栈橋設置工事です。

## 〈今後の予定〉

- ・仮橋部の切土法面整形を行った後、やぐら式杭打ち機を設置する足場を設置します。

## 位置図・平面図



## 〈今月の作業状況〉

作業構台部の栈橋の施工を行っています。




仮橋部の支持杭のうち、一次施工分の5箇所が完了しました。



## 〈今後の作業予定〉

仮橋部の法面を整形し、さらに足場を設置します

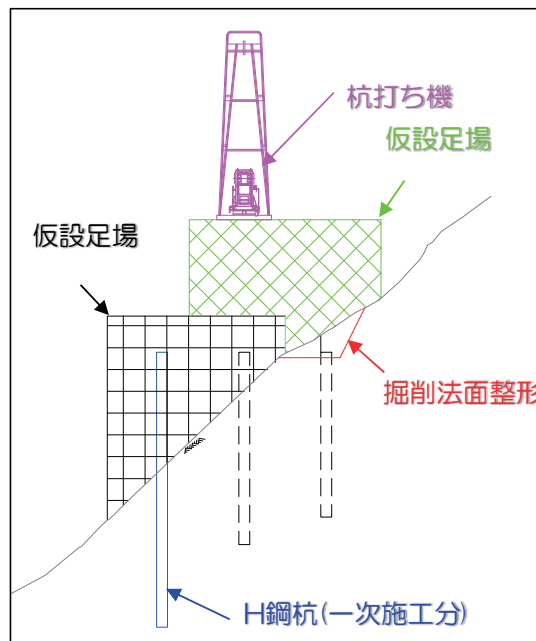

## 工程表

作業内容	平成27年							平成28年	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工			▶						
作業構台			▶						
仮橋部									
法面工									
後片付工									

請負者：西村建設株式会社  
 現場担当者：辻孝(現場代理人)  
 TEL / FAX：077-549-1900

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年10月16日

工事名:大津信楽線新3号橋橋台設置工事

## 〈工事の進捗〉

【A2橋台側】:切土補強土工(鉄筋挿入工)及び法面部の掘削作業を行っています。


【A2P橋脚側】:切土上部への登坂路及び除根作業を行っています。下部では、仮橋・仮栈橋工を施工しています。

## 〈今後の予定〉


【A2橋台側】:引き続き切土補強土工(鉄筋挿入工)及び切土部の掘削作業を行います。

【A2P橋脚側】:10月中旬より切土部の掘削作業を開始します。

新3号橋 全体側面図

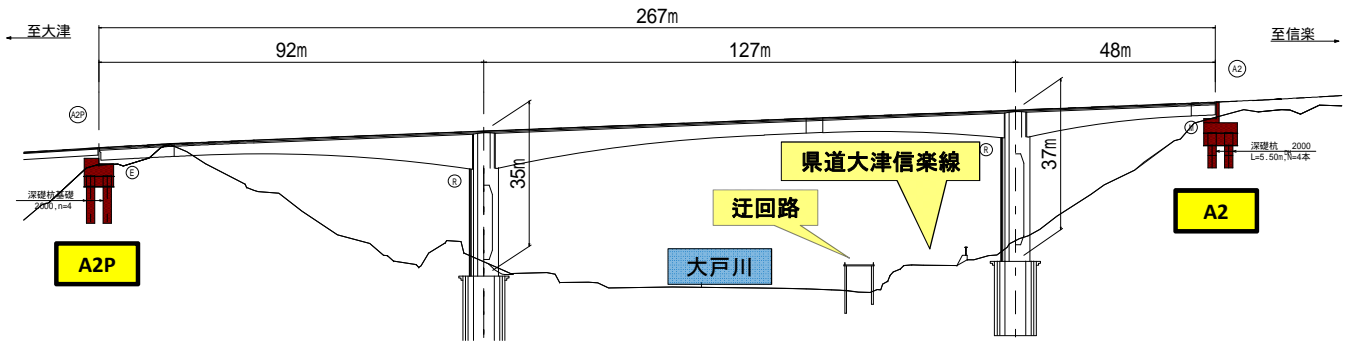


全体平面図

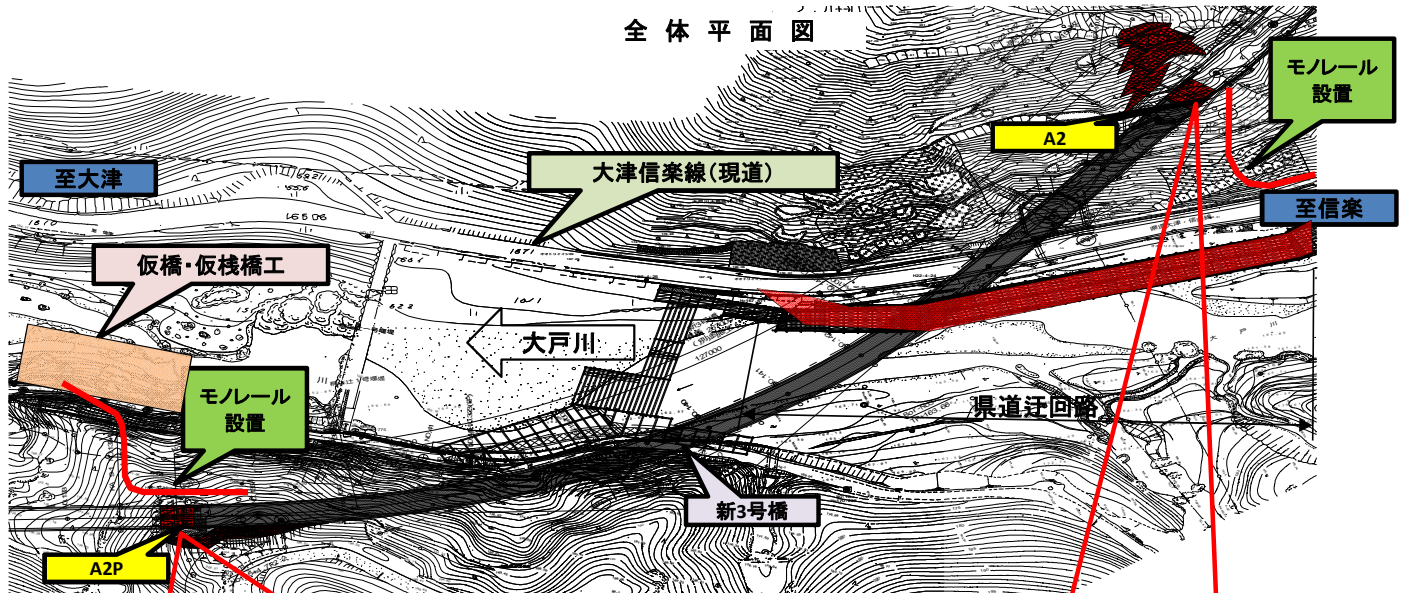


【A2P橋脚】(大戸川左岸部)



【山の斜面を掘削しています。】

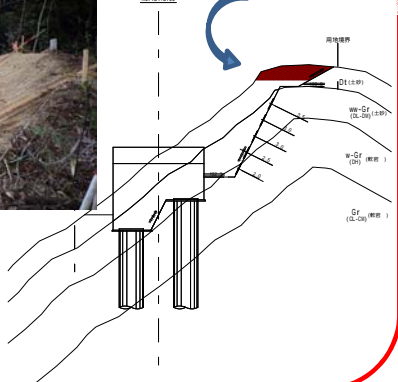

【A2橋台】(大戸川右岸部)

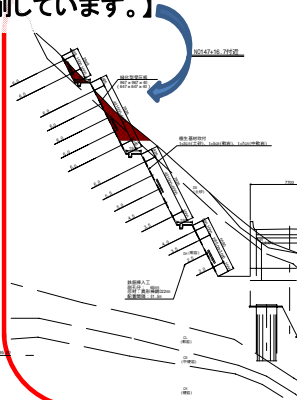

工程表

	9月	10月	11月
準備工			
A2橋台側掘削		■	■
A2P橋脚側掘削		■	■
切土補強土工(A2)		■	■
仮橋・仮栈橋	■		

受注者: 株式会社 松浦組

現場担当者: 高田 博(現場代理人)

TEL: 080-8348-9135

現場事務所: 大津市上田上桐生町地先

TEL・FAX: 077-549-0322

**完成済み**

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成27年7月16日

工事名:大戸川ダム管内護岸補修工事

・2工区及び7工区の工事が完成しました。  
工事中、ご通行の皆様にはご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

【2工区(桐生地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(コンクリート擁壁)が完成しました。


【7工区(大鳥居地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(大型ブロック積擁壁)が完成しました。

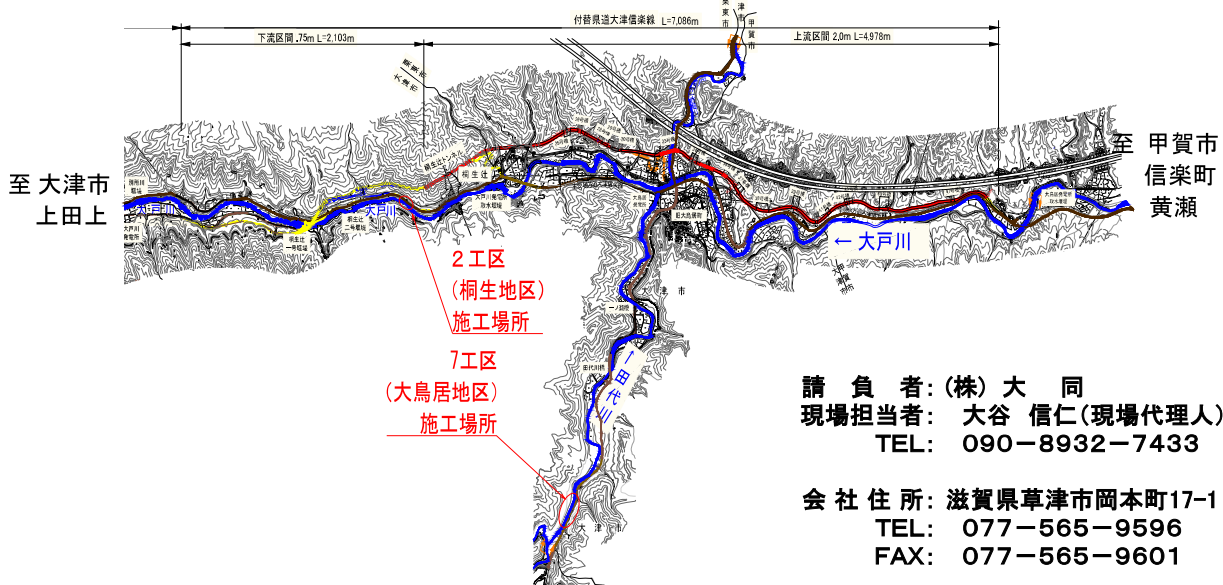


請負者: (株) 大同  
現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)  
TEL: 090-8932-7433

会社住所: 滋賀県草津市岡本町17-1  
TEL: 077-565-9596  
FAX: 077-565-9601

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

- 平成 27年 3月 30日を持ちまして、工事を完成することができました。

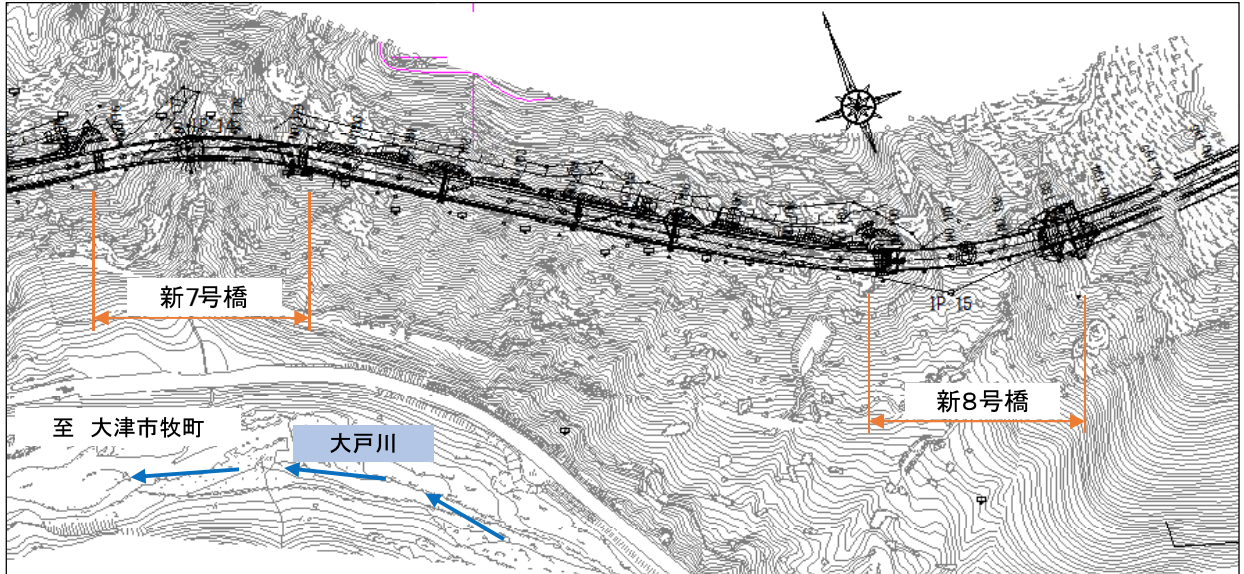

【新8号橋】 橋台が完成しました。



【新7号橋】 基礎施工作業台が完成しました。



