

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年12月16日

工事名：大津信楽線新3号橋工事


〈工事の進捗〉

- ・【P1橋脚】 深礎杭の施工をしています。
岩塊掘削の進捗を早めるため、発破を5日間に1回程度、1回あたり5分程度、1日1回(最大2回)の通行止めを行います。
- ・【P2橋脚】 アンカー土留めの施工をしています。

〈今後の予定〉

- ・【P1橋脚】 12月も引き続き深礎杭の施工を行います。
- ・【P2橋脚】 12月も引き続きアンカー土留めの施工を行います。


平面図

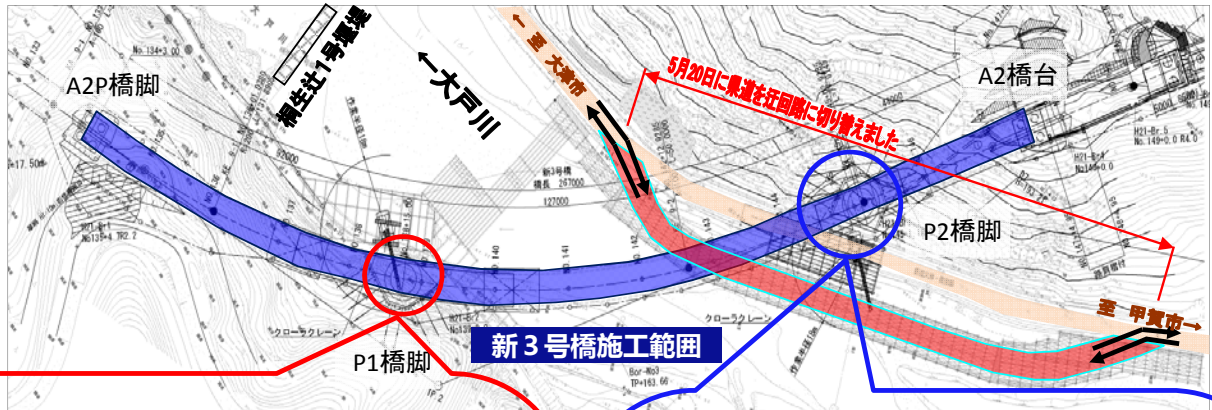

側面図

【P1橋脚】 深礎工

【P2橋脚】 永久アンカー土留め工

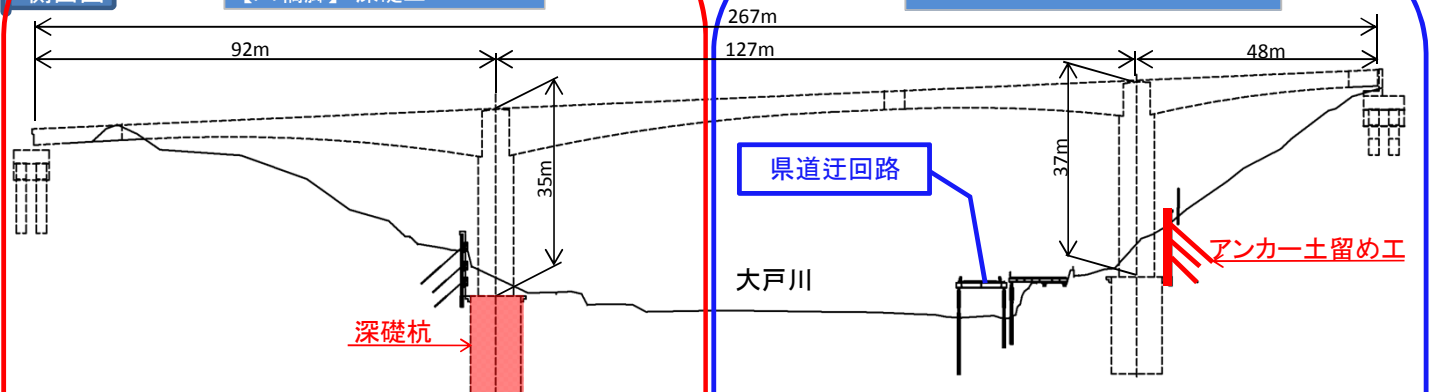

施工状況

(P1橋脚)

深礎杭の掘削を行っています。



(P2橋脚)

アンカー土留め杭を施工しています。



工程表

作業内容	12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
【P1橋脚】 深礎工												
【P2橋脚】 永久アンカー土留め												
深礎工												

KAWADA 川田建設(株)

大津信楽線新3号橋工事事務所

〒520-2161

滋賀県大津市上田上桐生町地先

TEL : 077-549-0103

FAX : 077-549-0109


大津信楽線付替工事ニュース

平成27年12月16日

工事名:大津信楽線工事用仮橋整備工事

工事の目的
 ・新しい大津信楽線の工事箇所まで進入するための棧橋設置工事です。
 今後の予定
 仮設足場の撤去を行った後、仮橋部の上部工の施工を行います。

位置図・平面図

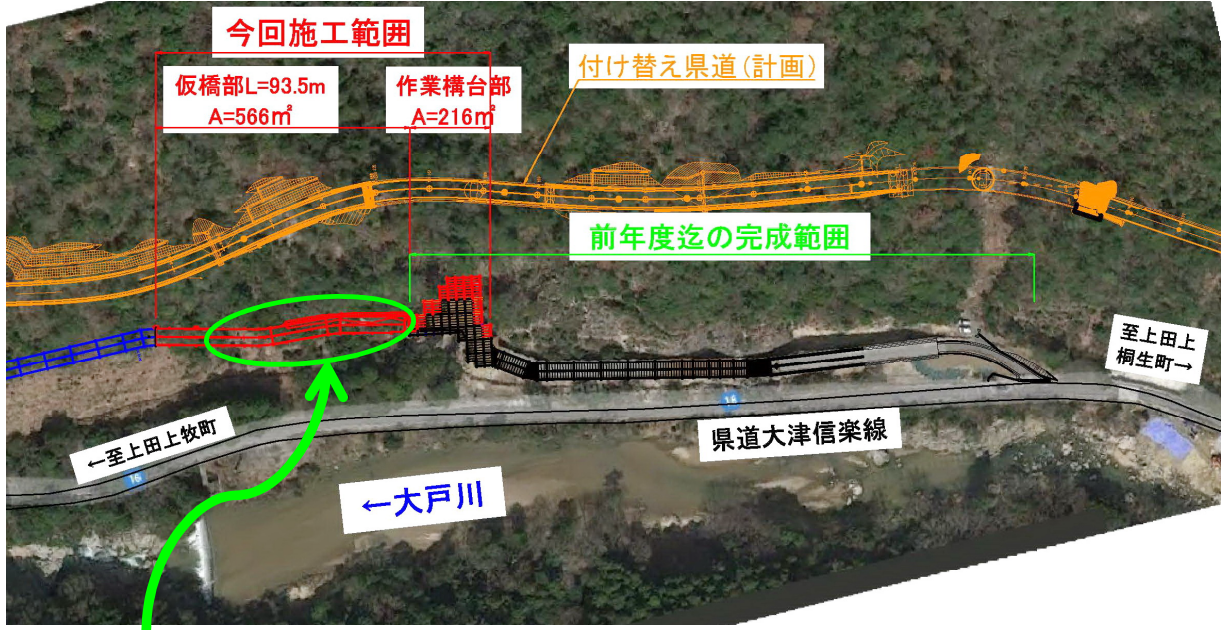

今月の作業状況


仮橋部支持杭が63本のうち51本の施工が完了しました。



(支持杭施工状況)

今後の作業予定

仮設足場解体後、上部工の施工を行います。

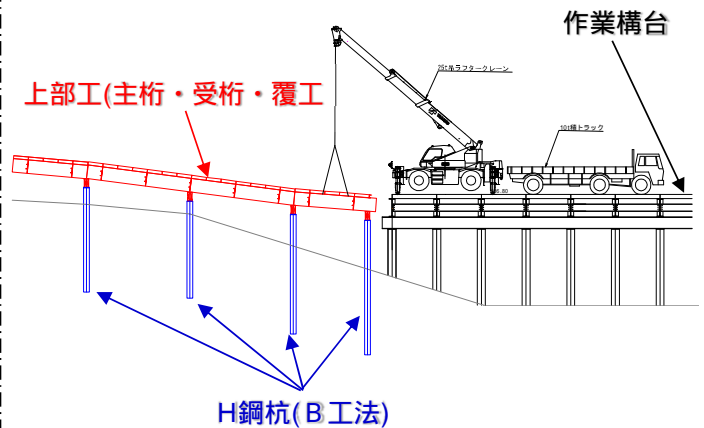

工程表

作業内容	平成27年							平成28年	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工			→						
作業構台				→					
仮橋部					→				
法面工								→	
後片付工									→

請負者: 西村建設株式会社
 現場担当者: 辻孝(現場代理人)
 TEL / FAX: 077-549-1900

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年12月16日

工事名:大津信楽線新3号橋橋台設置工事

〈工事の進捗〉

【A2橋台側】:切土補強土工(鉄筋挿入工)及び深礎工の掘削を行っています。


【A2P橋脚側】:切土補強土工(鉄筋挿入工)及び深礎工の掘削を行っています。

〈今後の予定〉


【A2橋台側】:引続き切土補強土工(鉄筋挿入工)及び、年内に深礎掘削完了予定。

【A2P橋脚側】:切土補強土工(鉄筋挿入工)及び、深礎工の掘削を行います。


新3号橋 全体側面図

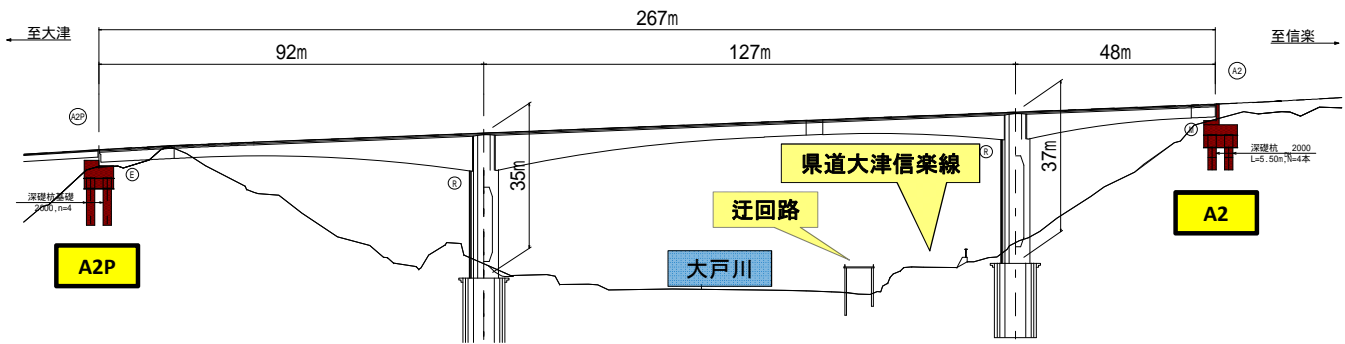


全体平面図

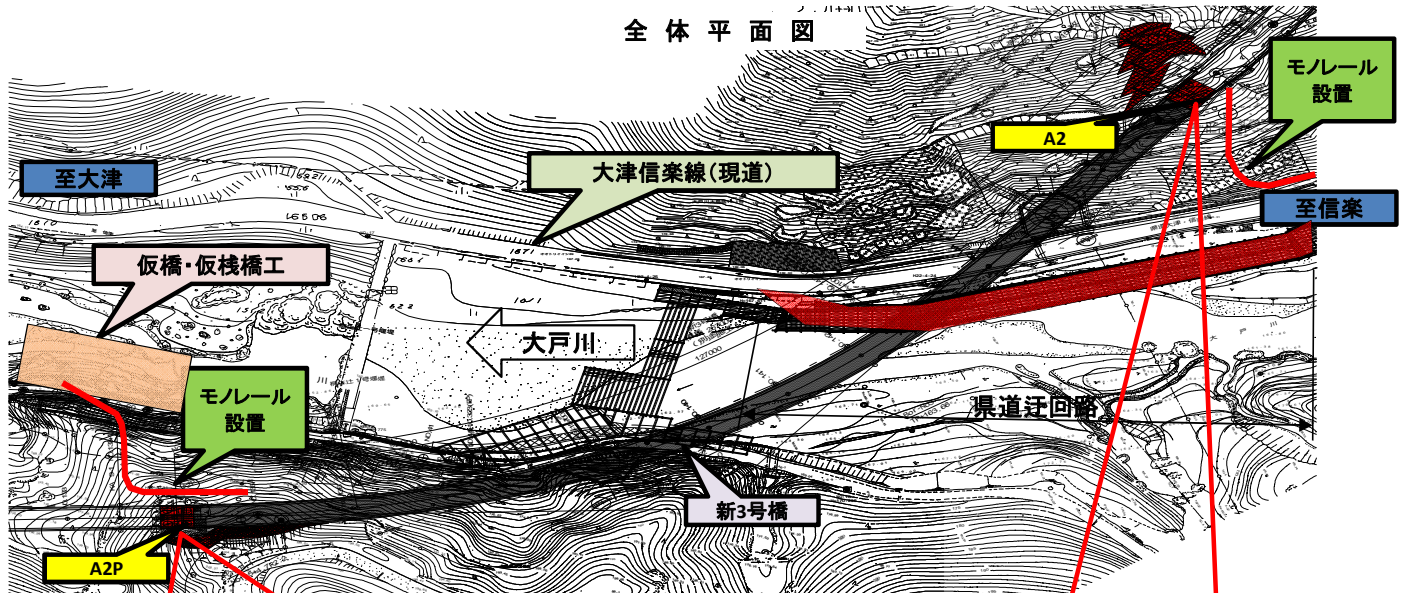

【A2P橋脚】(大戸川左岸部)

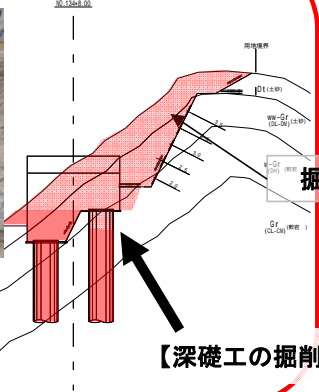

【A2橋台】(大戸川右岸部)

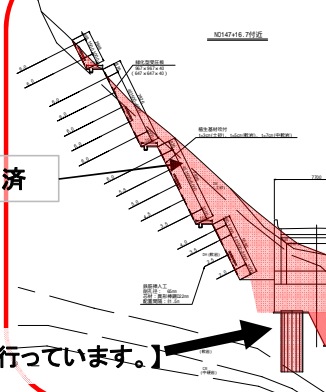

【深礎工の掘削を行っています。】

工程表

	11月	12月	1月
A2橋台深礎		■	■
A2橋台躯体工			■
A2P橋脚深礎		■	■
切土補強土工(A2)	■	■	■
切土補強土工(A2P)	■	■	■

受注者: 株式会社松浦組

現場担当者: 高田 博(現場代理人)

TEL: 080-8348-9135

現場事務所: 大津市上田上桐生町地先

TEL・FAX: 077-549-0322

完成済み

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年7月16日

工事名:大戸川ダム管内護岸補修工事

・2工区及び7工区の工事が完成しました。
工事中、ご通行の皆様にはご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

【2工区(桐生地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(コンクリート擁壁)が完成しました。


【7工区(大鳥居地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(大型ブロック積擁壁)が完成しました。

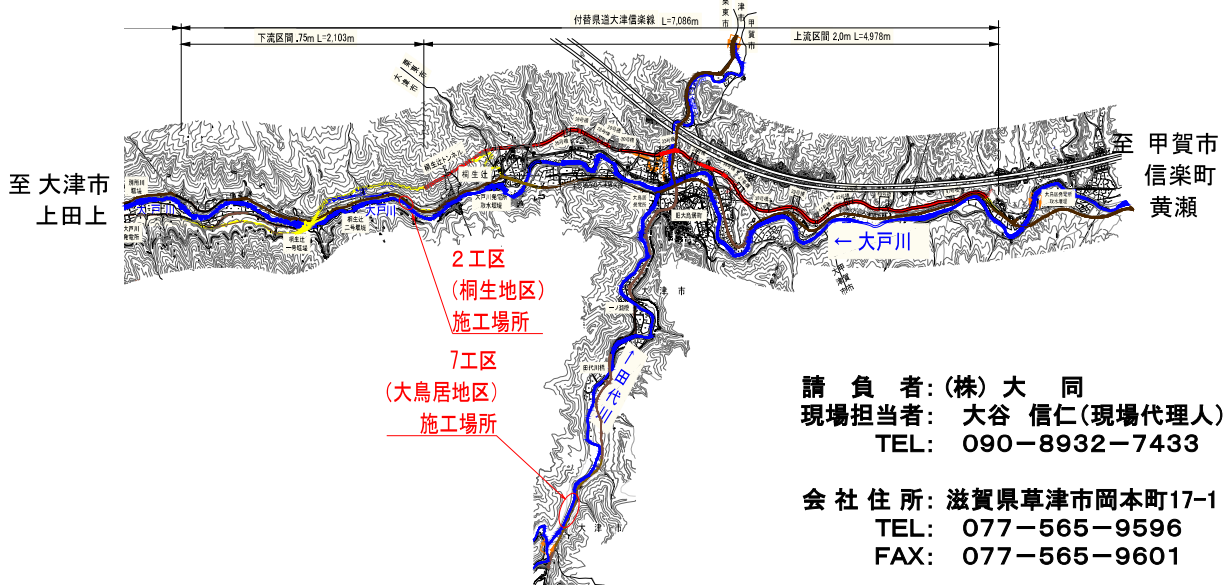


請負者: (株) 大同
現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)
TEL: 090-8932-7433

会社住所: 滋賀県草津市岡本町17-1
TEL: 077-565-9596
FAX: 077-565-9601

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

- 平成 27年 3月 30日を持ちまして、工事を完成することができました。

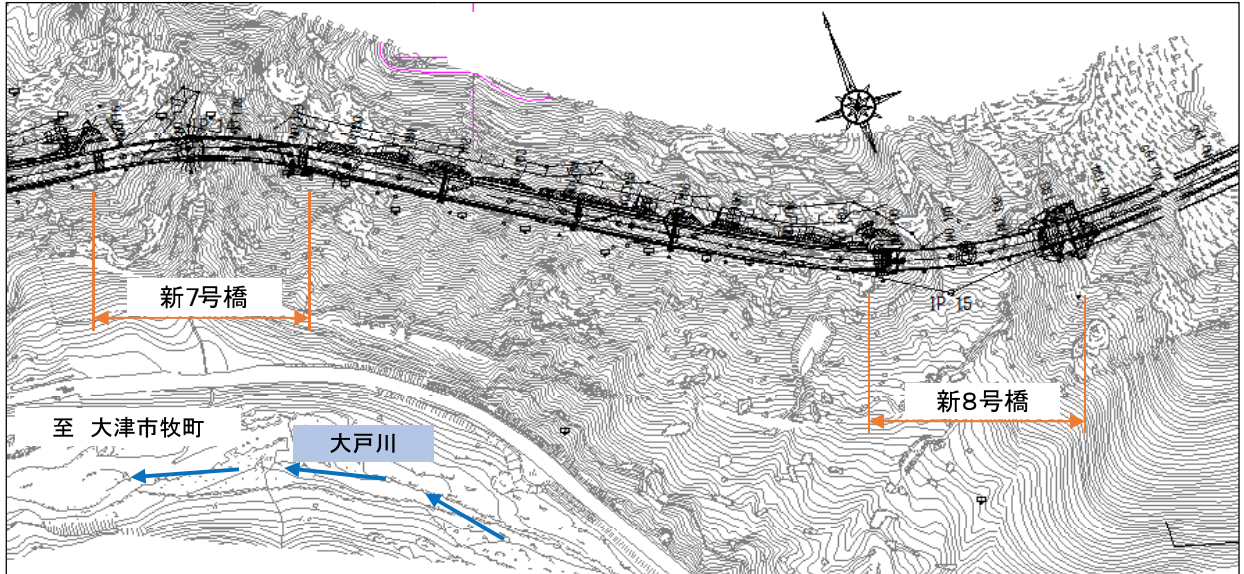

【新8号橋】 橋台が完成しました。



【新7号橋】 基礎施工作業台が完成しました。



請 負 者 名 株式会社 松浦組 住 所 大津市逢坂一丁目13-12
事業本部 TEL 077-524-6152

大津信楽線付替工事ニュース

完成済み


平成27年4月16日

工事名：大津信楽線落石対策工事

工期：平成26年10月23日～平成27年3月30日


工事概要：落石雪害防止工 ワイヤネット被覆工 97㎡、落石防止網工 ロープ伏 614㎡ ロープ掛 111m
落石防止柵工 542m、小割除去工 29m³、仮設工 落石防止柵工 88m モルタル工 1,657m

【施工位置図】

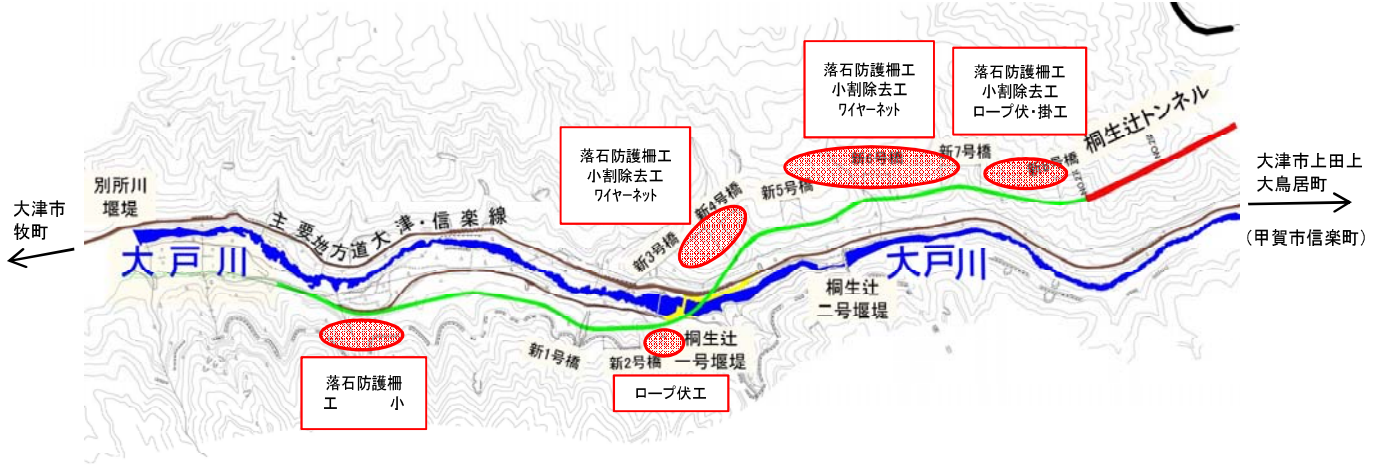

落石対策工 施工概要図

ロープ掛工 施工完了

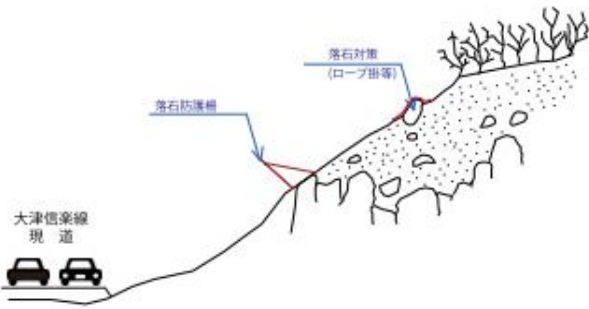

ワイヤネット被覆工 施工完了



落石防護柵工 施工完了



【工事説明】

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

上記写真は、当工事の落石対策の各工種（ロープ掛工・ワイヤネット被覆工・落石防護柵工）の施工完了状況写真です。

3月30日（月）を持ちまして、当工事は全て完了いたしました。

工事中は何かとご不便をお掛けいたしました。皆様のご理解・ご協力のもと、無事工事を完了できましたこと、お礼申し上げます。

施工者
会社住所
電話番号

イビデングリーンテック(株)関西支店
神戸市中央区脇浜町2-11-14
TEL 078-291-5585
