

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年2月16日

工事名: 大津信楽線左岸部道路整備工事

工事の進捗

- ・【5号補強土壁部】: 全線(延長170m)において、道路の上面整正を施工しています。
 - ・【高盛土部】: 道路の上面整正及び種子入りマットの施工をしています。
 - ・【護岸補修部】: 法崩れ復旧のためフソカゴを施工しています。
- 今後の予定
- ・3月25日工期につき、3月下旬に検査を受け工事完了となります。


奥村組

大津信楽道路工事事所
〒520-2161
滋賀県大津市上田上桐生町地先
TEL 077-549-2032
FAX 077-549-2052

高盛土部(種子入りマット)



5号補強土壁部(道路の上面整正)

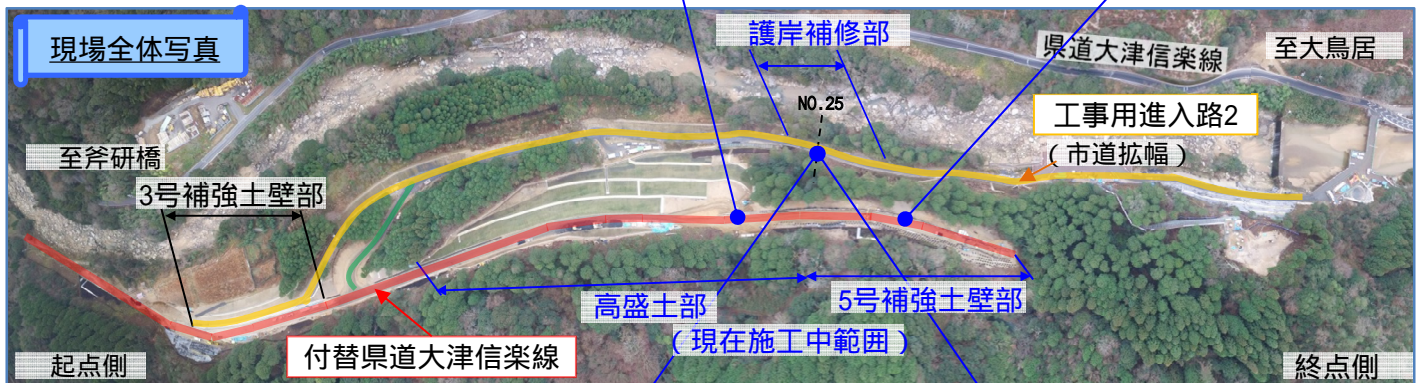

現場全体写真

護岸補修部

県道大津信楽線

至大鳥居

工事用進入路2
(市道拡幅)

3号補強土壁部

高盛土部


5号補強土壁部

付替県道大津信楽線
(現在施工中範囲)

起点側

終点側

横断面図

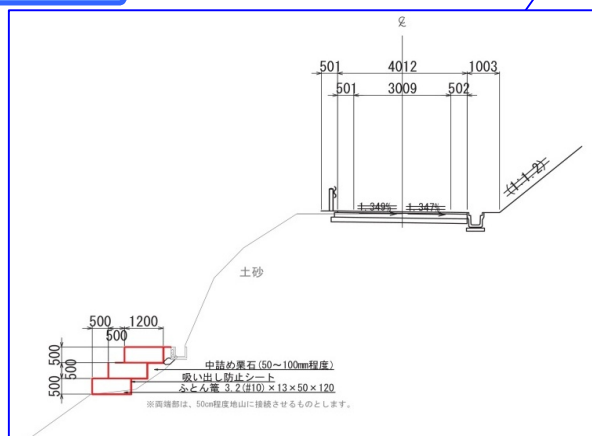

工事用進入路況写真(2月15日)
(No.25付近)
護岸補修(フソカゴ)を施工しています。



工程

作業内容	2月			3月		
	10	20	31	10	20	29
5号補強土壁工	[Progress bar from Feb 10 to Mar 29]					
工事用進入路2	[Progress bar from Mar 10 to Mar 29]					
高盛土部	[Progress bar from Feb 10 to Feb 20]					

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年2月16日

工事名：大津信楽線新3号橋工事


〈工事の進捗〉

- ・【P1橋脚】 深礎杭の施工をしています。
岩塊掘削の進捗を早めるため、発破を5日間に1回程度、1回あたり5分程度、1日1回(最大2回)の通行止めを行います。
- ・【P2橋脚】 背後の地山に対する土留め壁の施工をしています。


〈今後の予定〉

- ・【P1橋脚】 2月も引き続き深礎杭の施工を行います。
- ・【P2橋脚】 2月も引き続き土留め壁の施工を行います。

平面図

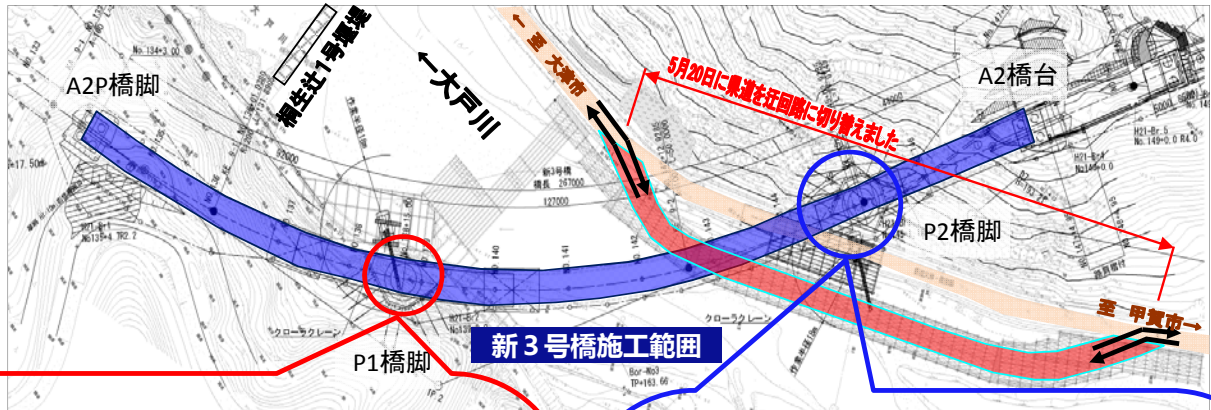

側面図

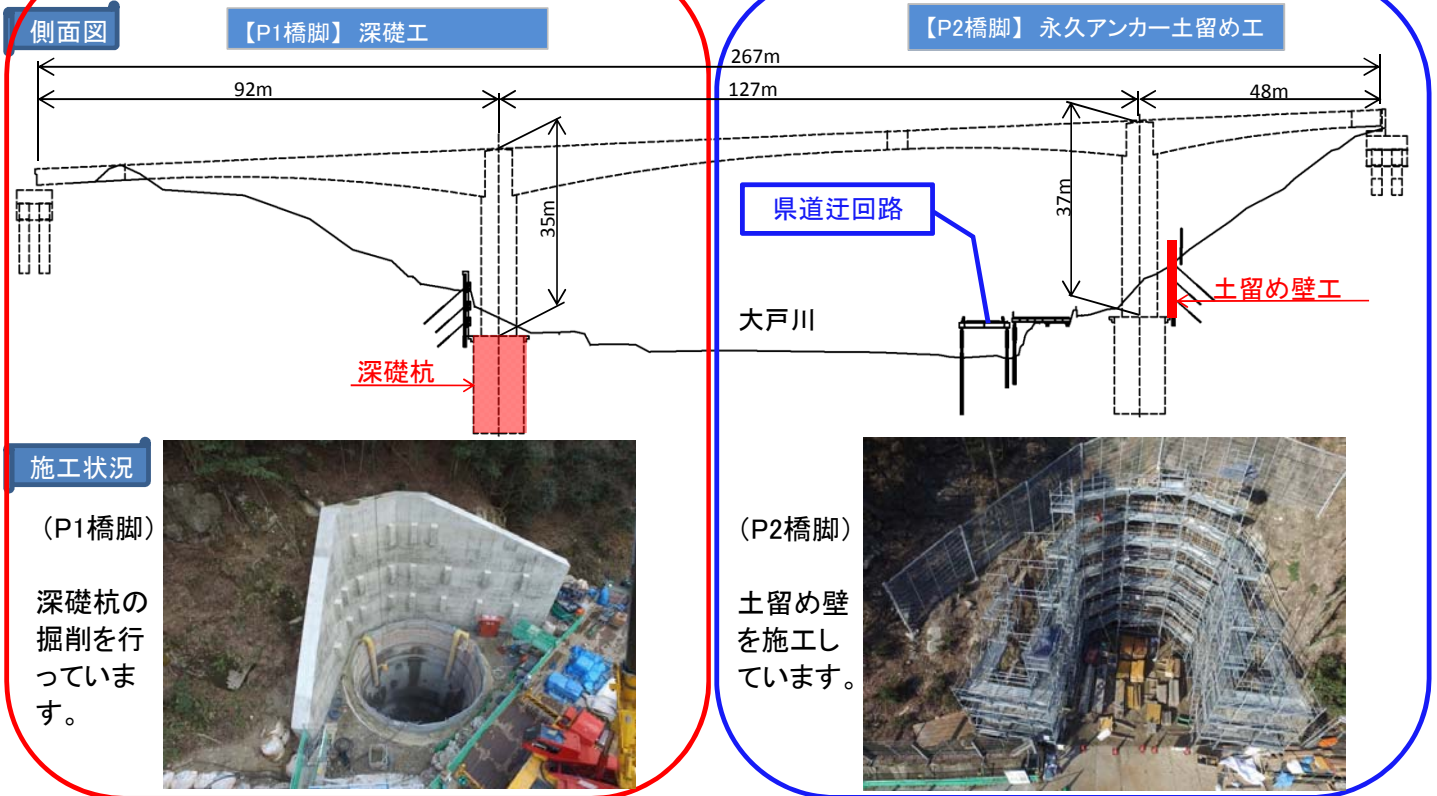

施工状況

(P1橋脚)

深礎杭の掘削を行っています。



(P2橋脚)

土留め壁を施工しています。



工程表

作業内容	2月			3月			4月			5月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
【P1橋脚】 深礎工	[Progress bars]											
RC橋脚工	[Progress bars]											
【P2橋脚】 土留め壁工	[Progress bars]											
深礎工	[Progress bars]											

KAWADA 川田建設(株)

大津信楽線新3号橋工事事務所

〒520-2161

滋賀県大津市上田上桐生町地先

TEL : 077-549-0103

FAX : 077-549-0109

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年2月16日

工事名:大津信楽線工事用仮橋整備工事


〈工事の目的〉

・新しい大津信楽線の工事箇所まで進入するための栈橋設置工事です。

〈今後の予定〉

掘削法面の種子吹付を行います。

位置図・平面図

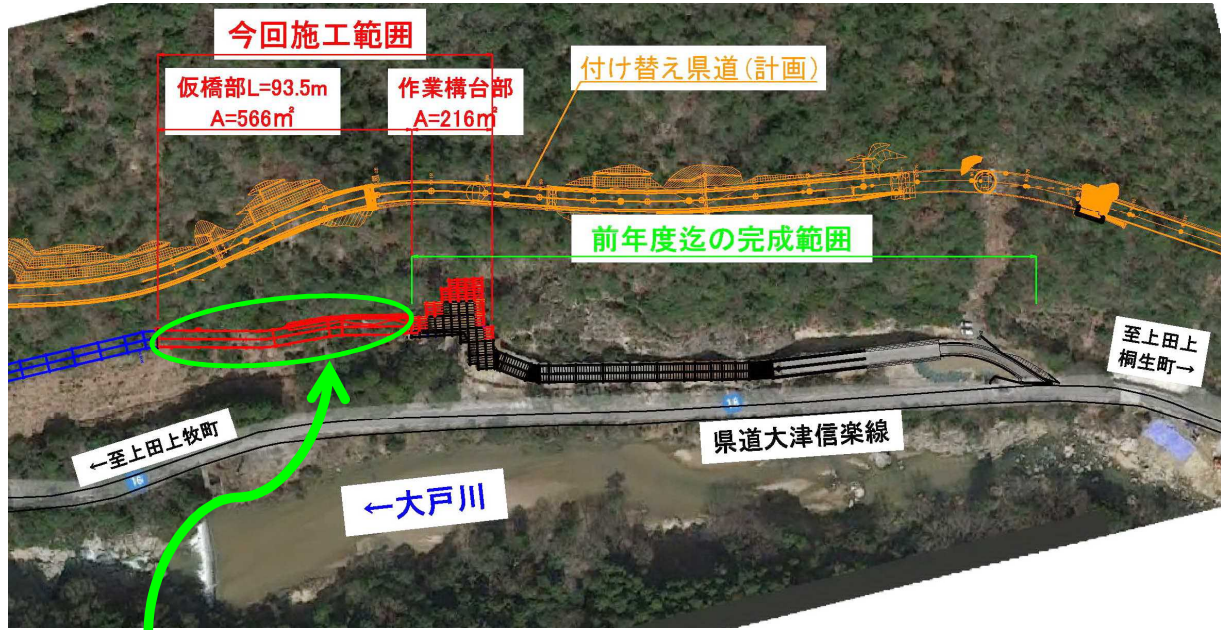

〈今月の作業状況〉

栈橋の施工が完了しました。



掘削法面に種子吹付を行います。(着色部)



工程表

作業内容	平成27年						平成28年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工			▶						
作業構台				▶					
仮橋部					▶				
法面工								▶	
後片付工									▶

請負者: 西村建設株式会社
現場担当者: 辻孝(現場代理人)
TEL / FAX: 077-549-1900

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年2月16日

工事名:大津信楽線新3号橋橋台設置工事

〈工事の進捗〉

【A2橋台側】:フーチングコンクリート打設完了し、橋台上部の作業用足場の設置を行っています。


【A2P橋脚側】:法面工及び山側深礎工の掘削完了しました。

〈今後の予定〉


【A2橋台側】:橋台上部の躯体工に着手します。

【A2P橋脚側】:引続き深礎工(谷側2本)の掘削を行います。


新3号橋 全体側面図

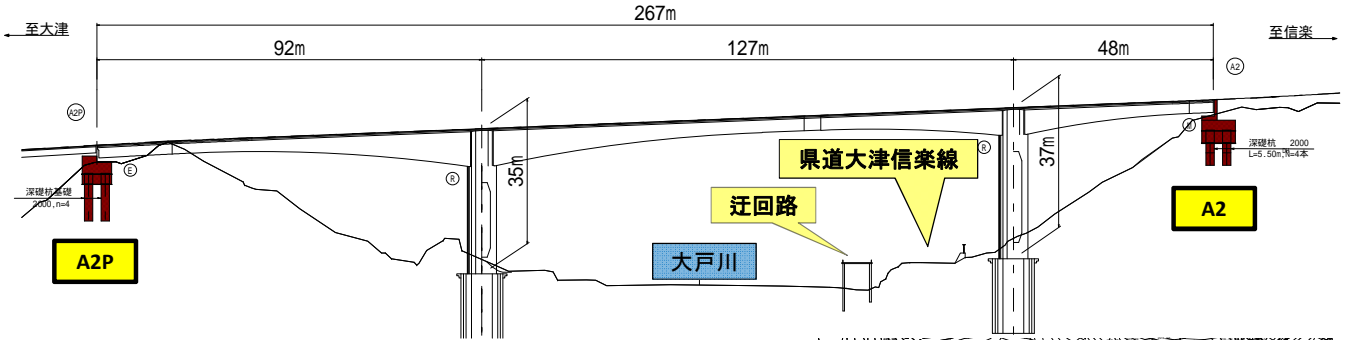

全体平面図

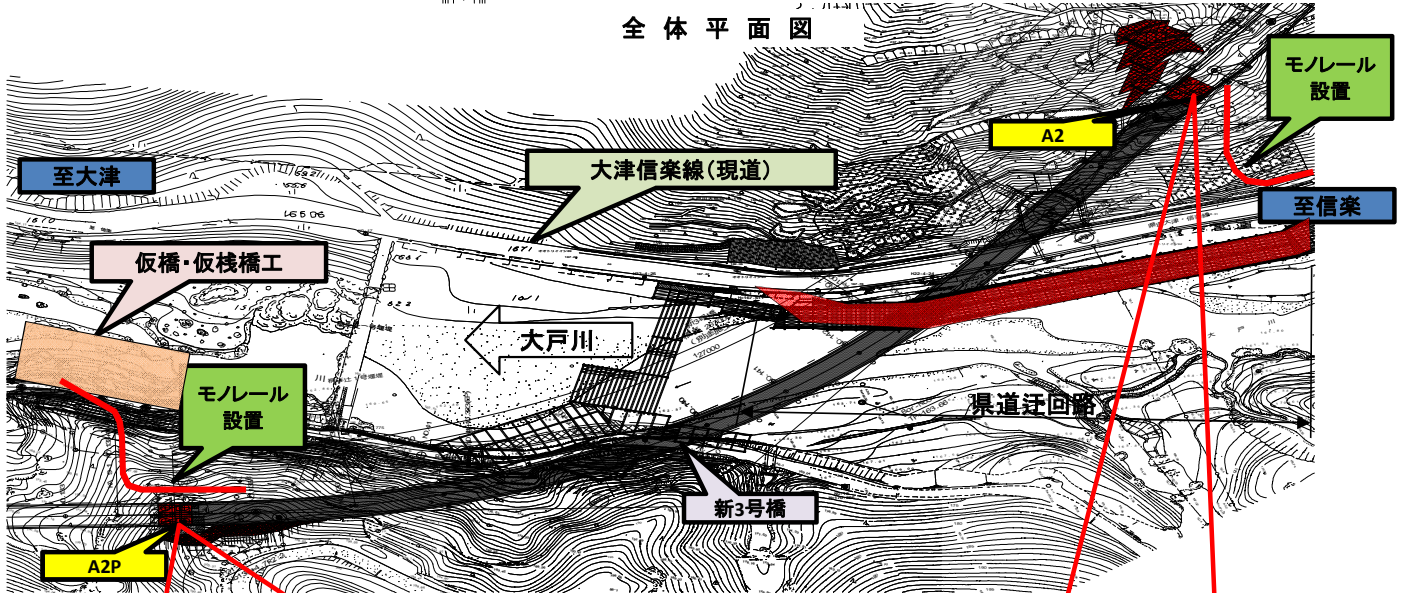


【A2P橋脚】(大戸川左岸部)

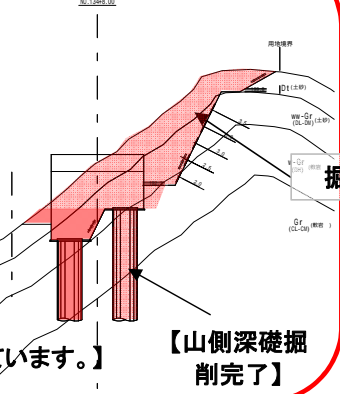

【深礎工の掘削を行っています。】

【山側深礎掘削完了】

【A2橋台】(大戸川右岸部)

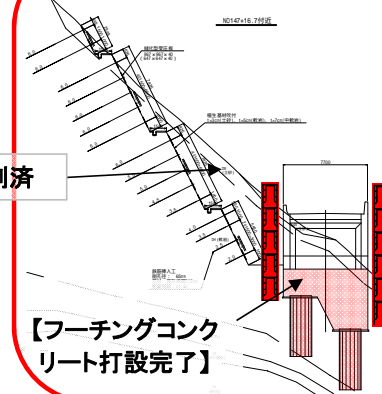

【フーチングコンクリート打設完了】



【橋台の作業用足場を設置しています。】

工程表

	1月	2月	3月
A2橋台躯体工	■	■	
A2橋台埋戻し、仮設撤去			■
A2P橋脚深礎	■	■	
後方付け			■

受注者:  株式会社 松浦組

現場担当者: 高田 博(現場代理人)

TEL: 080-8348-9135

現場事務所: 大津市上田上桐生町地先

TEL・FAX: 077-549-0322

完成済み

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年7月16日

工事名:大戸川ダム管内護岸補修工事

・2工区及び7工区の工事が完成しました。
工事中、ご通行の皆様にはご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

【2工区(桐生地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(コンクリート擁壁)が完成しました。


【7工区(大鳥居地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(大型ブロック積擁壁)が完成しました。

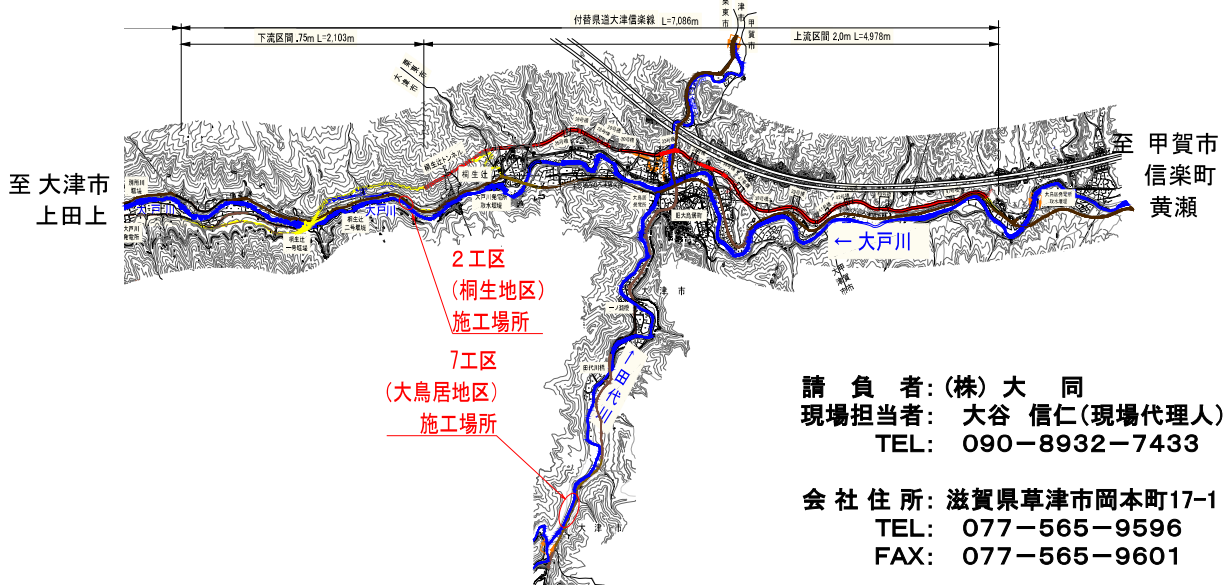


請負者: (株) 大同
現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)
TEL: 090-8932-7433

会社住所: 滋賀県草津市岡本町17-1
TEL: 077-565-9596
FAX: 077-565-9601

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

- 平成 27年 3月 30日を持ちまして、工事を完成することができました。

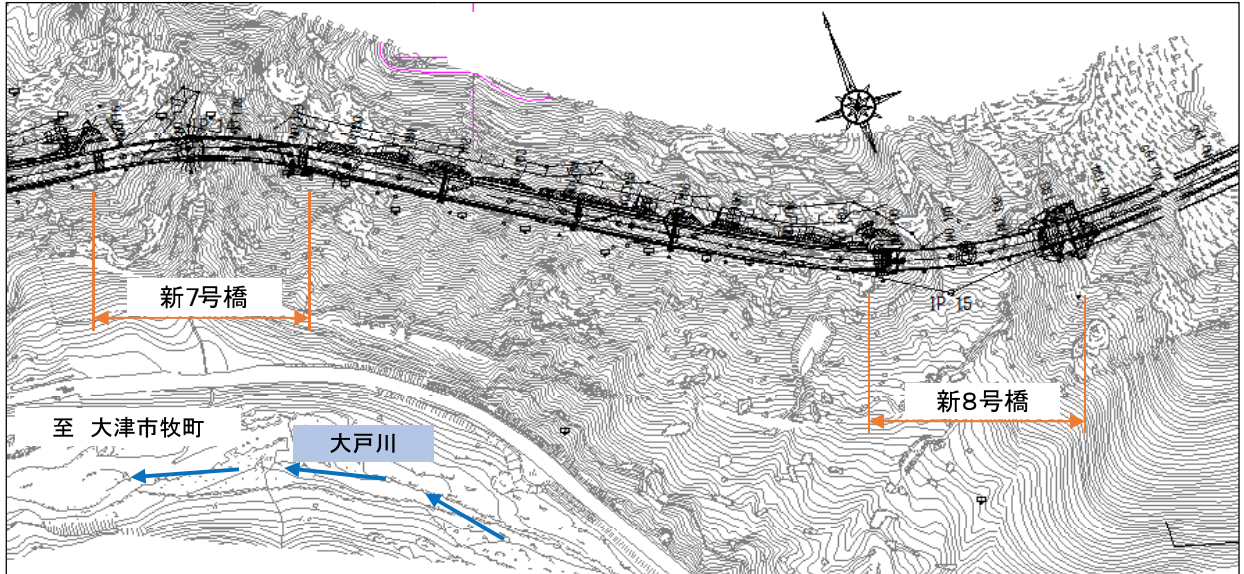

【新8号橋】 橋台が完成しました。



【新7号橋】 基礎施工作業台が完成しました。



請 負 者 名 株式会社 松浦組 住 所 大津市逢坂一丁目13-12
事業本部 TEL 077-524-6152

大津信楽線付替工事ニュース

完成済み


平成27年4月16日

工事名：大津信楽線落石対策工事

工期：平成26年10月23日～平成27年3月30日


**工事概要：落石雪害防止工 ワイヤネット被覆工 97㎡、落石防止網工 ロープ伏 614㎡ ロープ掛 111m
落石防止柵工 542m、小割除去工 29m³、仮設工 落石防止柵工 88m モルール工 1,657m**

【施工位置図】

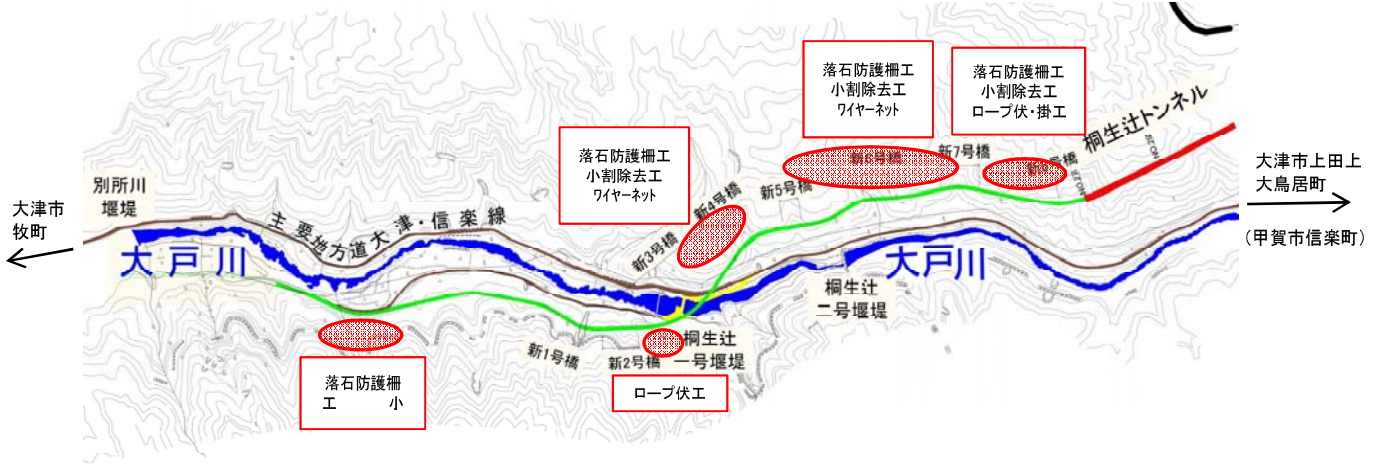

落石対策工 施工概要図

ロープ掛工 施工完了

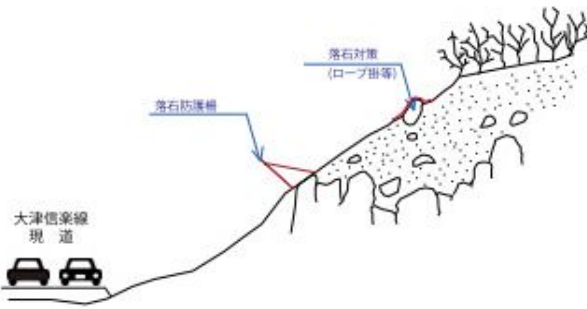

ワイヤネット被覆工 施工完了

落石防護柵工 施工完了



【工事説明】

当工事は大津信楽線付替工事に伴う落石対策工事です。

上記写真は、当工事の落石対策の各工種(ロープ掛工・ワイヤネット被覆工・落石防護柵工)の施工完了状況写真です。

3月30日(月)を持ちまして、当工事は全て完了いたしました。

工事中は何かとご不便をお掛けいたしました、皆様のご理解・ご協力のもと、無事工事を完了できましたこと、お礼申し上げます。

施工者
会社住所
電話番号

イビデングリーンテック(株)関西支店
神戸市中央区脇浜町2-11-14
TEL 078-291-5585
