

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成31年03月18日



ハッシュタグは  
QRコードをスクリーン  
読み取り大津信楽線  
工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新6号橋上部工工事

当初工期：平成30年1月26日～平成31年1月31日

変更工期：～平成31年3月29日

(付替県道新6号橋の橋梁を施工します。)



橋面上の作業が終了し、3月は足場解体、クレーン解体作業となります。  
工期末の3月29日に向け、無事故無災害で工事完了を目指します。



橋面状況(大津方面から信楽方面を望む)



伸縮装置設置完了

**KH** 株式会社 駒井ハルテック

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生地先

【電話】0775-49-2633

【FAX】0775-49-2635

※現場の進捗動画を会社のHPにて公開しております！！

<http://www.komaihaltec.co.jp/bridge/result/result2.html>

安全第一



# 大津信楽線付替工事ニュース

平成31年3月18日



パッカパ-は  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工  
事事務所HPへ



工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事  
当初工期：平成30年3月29日～平成31年3月28日  
変更工期：～平成31年5月31日



## 工事進捗

2月から梅谷右岸側の床付作業が始まりました。床付範囲内には巨大な転石が点在しており、大型ブレーカー及び人力によって100 t以上の転石を破砕しました。3月からは既に完成した左岸側基礎工の埋戻し作業が始まります。



梅谷右岸側アーチカルバート基礎工の床付開始



大型ブレーカー及び人力による転石の破砕状況



床付完了!!

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成31年3月18日




「ツカバ」は  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工  
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線工事用進入路設置その他工事

当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期：～平成31年3月29日

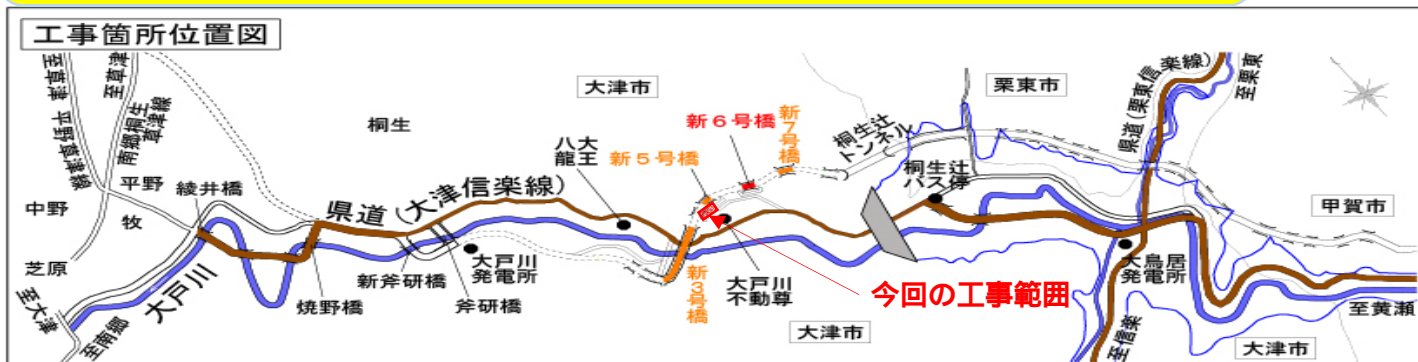

今回の工事について

新4号橋工事の施工の為、既設仮栈橋を延長します。

## 現在の施工状況




大戸川の対岸側からの全景写真です。工事の一番の難所であった谷を越えて作業を行っています。あともう少しで完成です！

## 現在の施工箇所

### 今後の予定

今月末をもって仮橋の設置工事の竣工予定です。最後まで無事故で作業を行います。引き続き工事へのご理解・ご協力をお願いします。

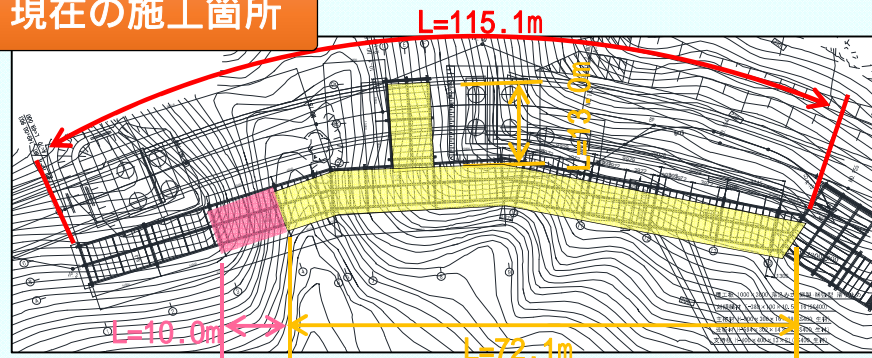

施工中箇所

施工完了箇所

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成31年3月18日




パソコンはQRコードを読み込み大戸川が工事事務所HPへ

工事名：工事用迂回路撤去工事

工期：平成30年11月6日～平成31年3月29日

3月

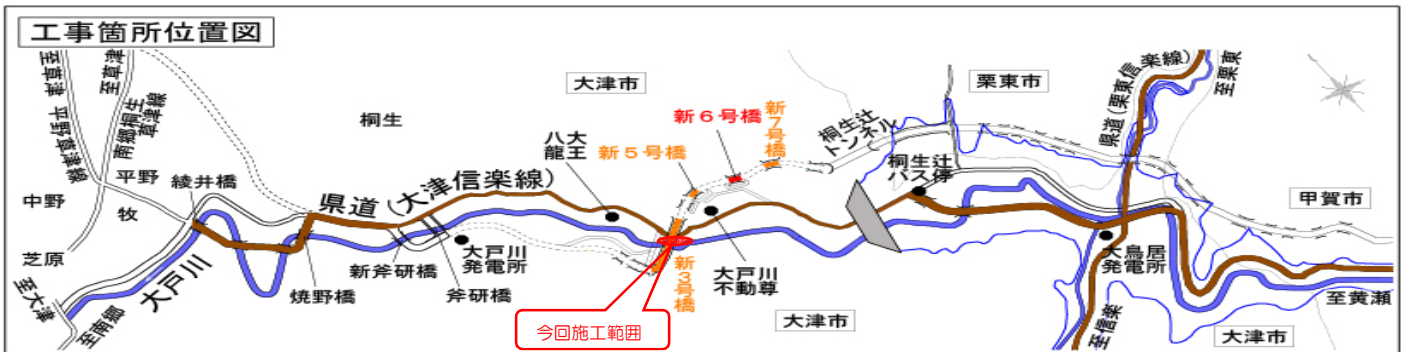

今回の工事について  
県道大津信楽線を復旧し、仮橋（迂回路）を撤去します。

舗装  
アスファルト舗装 (済)  
区画線 (済)

工事用車両出入口

凡例

- 舗装工事範囲(完了後に切替)
- 従前工事での迂回道路
- 完了済部分

道路改良  
工事用迂回路撤去 (済)

迂回路撤去 アスファルト舗装

## 工事進捗状況

2月末で仮橋撤去及び県道16号のガードレール復旧が完了しました。  
3月初旬に仮橋と県道が取付いていた法面部の張コンクリートを施工し工事はすべて完了となりました。現在は、3月27日の完成検査に向けて検査書類を作成しています。

## 今後の予定

無事に無事故・無災害で工事を完了できました。  
工事期間中みなさまのご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございました。

仮橋撤去完了！！



ガードレール復旧完了！！



張コンクリート打設完了！！



株式会社 金子工務店  
kaneko engineering firm

現場代理人：上田 公博  
監理技術者：中川 義之  
現場事務所：大津市上田上桐生辻地先  
事務所TEL：077-549-1427

# 大津信楽線付替工事ニュース

平成31年03月18日



バックナンバーは  
QRコードを読み込  
み大戸川ダム工事  
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事  
工期：平成30年12月28日～平成31年11月30日

3月



工事箇所写真



大津信楽線桐生地区道路改良その他工事の施工状況は工事範囲の立木調査をしております。

立木調査状況 →

### 【現在の進捗】

・工事施工範囲の立木調査をしています。

### 【今後の予定】

・工法検討に伴う工事一時中止期間  
です。現地で準備作業予定です。



そろそろ  
昆虫達も  
動き出す  
頃だね。  
虫刺され  
注意だよ。



## 株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先  
【電話】 077-549-3911  
【FAX】 077-549-3911

