


大津信楽線付替工事ニュース

令和元年7月18日



パケットはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年 2月28日
変更工期：～令和元年12月26日

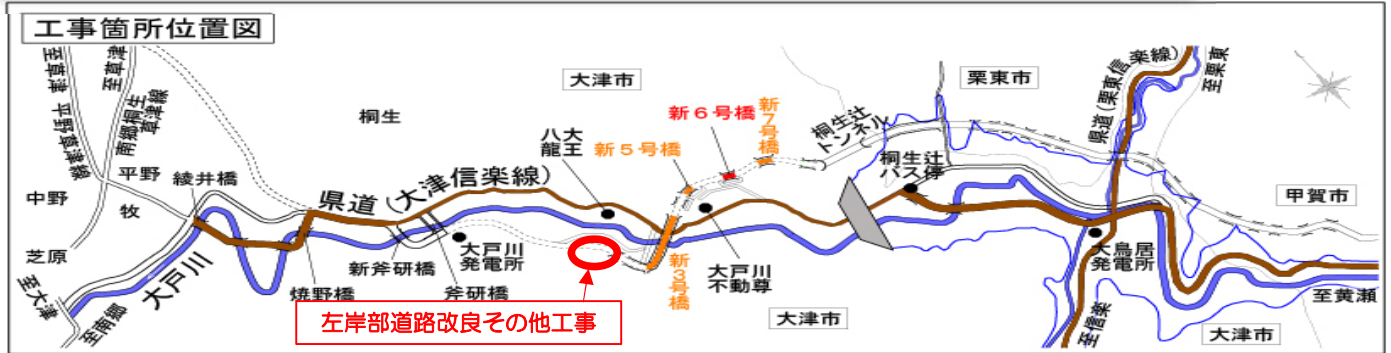

工事進捗

工事施工中に当工事で掘削した法面内の転石に滑動がみられたため、落石対策及び法面保護対策を行いました。今からはアーチカルバート基礎工の支持杭打設を開始します。



大津信楽線付替工事ニュース


令和元年07月18日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

7月

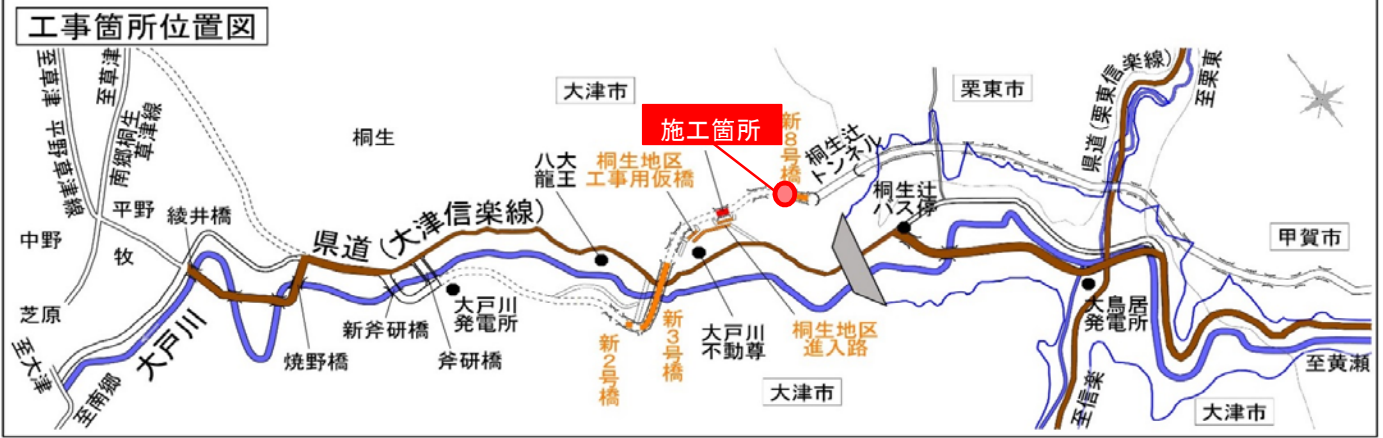

「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は、作業足場組替及び補強土壁工(2段目)を施工中です。
【現在の作業】・補強土壁工アンカー設置完了 【今後の予定】・補強土壁工(3段目)及び作業足場組替

補強土壁工・アンカー設置に伴う削孔状況



梅雨。
合羽着ての
作業は発汗
しやすいか
ら、熱中症
にも注意が
必要だよ。



株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-3911
【FAX】 077-549-3911



大津信楽線付替工事ニュース

令和元年7月18日



バックパ-はQRコードを読み込み大戸川が工事事務所HPへ


工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

新規

工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

7月

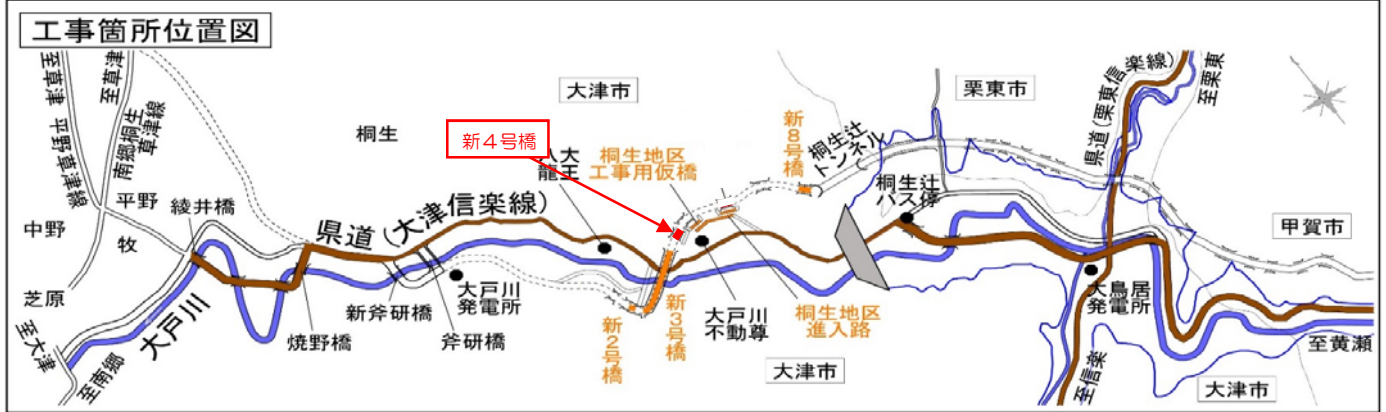

現場位置図



～ 現場代理人から一言

本工事の現場代理人の森本 順です。よろしくお願ひします。
今回の工事は、新3号橋施工箇所より上流にて付替県道 新4号橋を架けるための下部工（橋台）を2基施工します。

また、場所打擁壁（L型擁壁）も施工します。

安全第一で早期完工を目指し努力致しますので、何卒ご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

【現在の進捗】

- ・工事着工前の施工計画書の作成を行っています。

【今後の予定】

- ・7月中旬より現地調査を行います。
- ・本工事は8月下旬から橋台の掘削と土留を行います。

現場代理人の森本です。



請負者：西村建設(株)
現場代理人：森本 順
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0100

西村建設株式会社
NISHIMURA CONSTRUCTION CO., LTD.
