

# 大津信楽線付替工事ニュース

令和元年8月20日



パソコンはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事  
 当初工期：平成30年3月29日～平成31年 2月28日  
 変更工期：～令和 元年12月26日



現場代理人から一言

気温30℃以上の猛暑日が続きますが、暑さに負けず工事を進めていきます。

工事進捗

6月末からアーチカルバート基礎のH鋼支持杭の施工行っています。支持杭は合計24本、最大深さ17.0mまで支持杭を建て込みます。削孔内には地下水が走っており施工が難航しています。来月からはアーチカルバート基礎の躯体コンクリートの施工を進めていきます。



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和元年08月20日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事  
工期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

8月

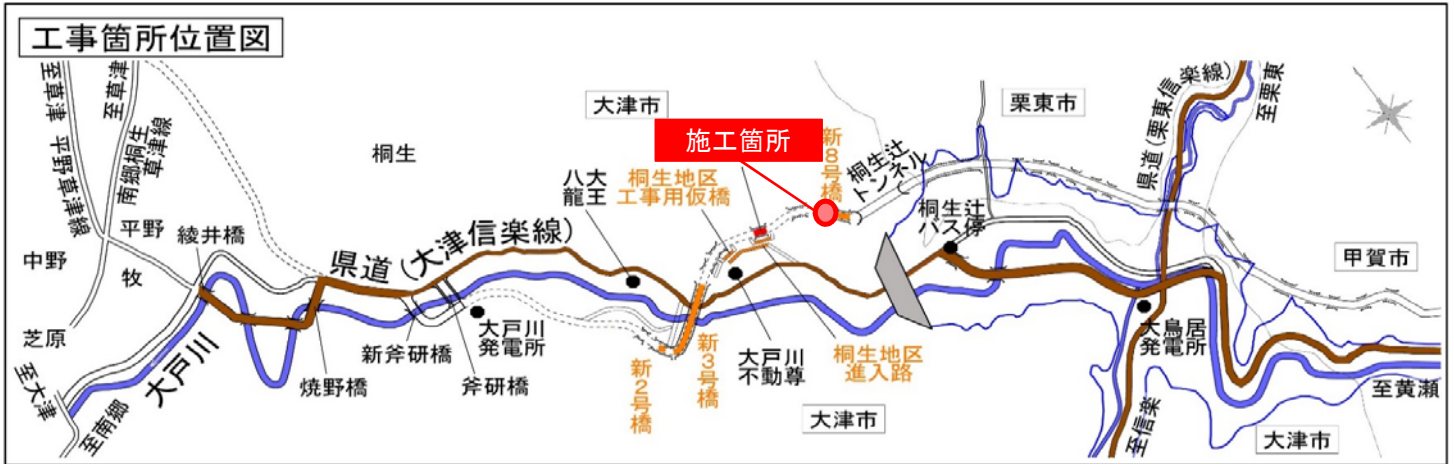

「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は、作業足場組替 及び 補強土壁工(4段目)を施工中です。  
【現在の作業】・補強土壁据付コンクリート設置完了 【今後の予定】・補強土壁工(4段目) 及び アンカー削孔・設置

作業足場設置形状・アンカー設置に伴う削孔状況



工程のとおり作業が進み、この暑い時期を乗り越え、無事故で工期内の完成を目指します。

現場代理人の声



株式会社 内田組

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先  
【電話】 077-549-3911  
【FAX】 077-549-3911



# 大津信楽線付替工事ニュース

令和元年8月20日




バックパ-はQRコードを讀込み大戸川が工事事務所HPへ

8月

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事  
工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

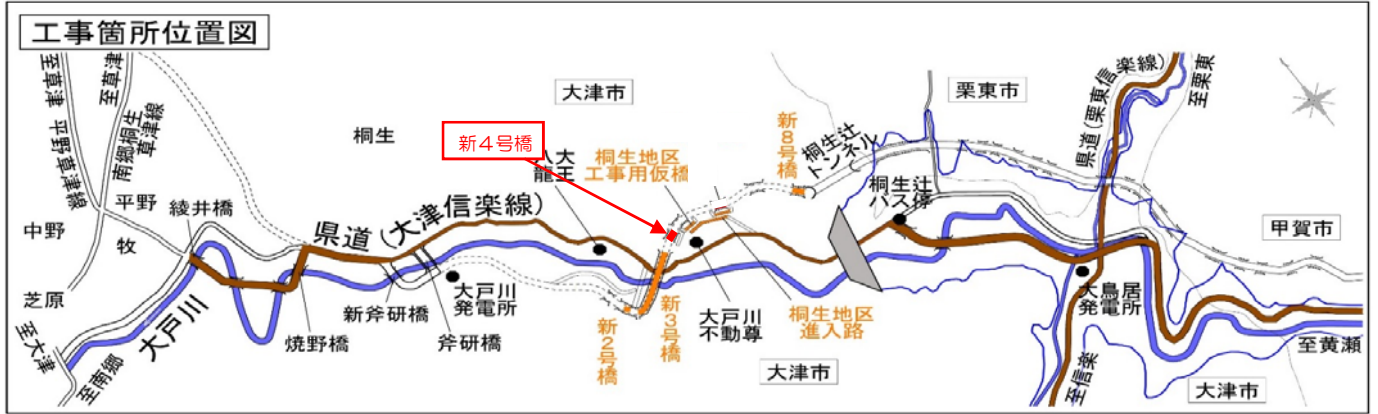

## 現場位置図



【工事の進捗】 施工箇所の伐採が終了しました。

【今後の予定】 8月下旬より橋台床掘を進めていきます。

## 作業状況

### 1. 伐採箇所の調査

伐採範囲内の立木の直径、高さを調査します。その際、貴重動植物の調査も行います。



### 2. 伐採作業

チェーンソーで対象木を切断し、クレーンにて桟橋上に仮置きし、バックホウにて運搬車に積み込みます。



### 3. 伐採完了

伐採は必要最小限の範囲を行いました。伐採の着工前と完了です。



## 現場代理人のコメント

今年も厳しい暑さとなっています。熱中症にならぬよう、安全に、確実に、元気に、熱く作業を進めてまいりますので、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。

請負者：西村建設株  
現場代理人：森本 順  
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先  
事務所TEL：077-549-0100

