

大津信楽線付替工事ニュース

令和 2年 1月18日



パソコンは
QRコードを読み
込み大戸川が工
事事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日
変更工期：～令和 2年3月20日



工事進捗

アーチカルバート周囲に補強土壁を設置して、地盤高さを上げていきます。
対岸側には120tクローラークレーンを使用して土砂を運搬しています。




現場代理人から一言

謹賀新年

当工事も残すところ3か月となりました。工事開始前と比べると景色が大きく変わっています。

年末年始作業も安全第一で頑張ります！！

現場代理人
森田 圭一



大津信楽線付替工事ニュース

令和 2年 1月18日




バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋下部その他工事

工期：令和元年6月25日～令和2年3月20日

【付替県道 新4号橋の橋台を2基と場所打擁壁（L型擁壁）を施工します。】

1月

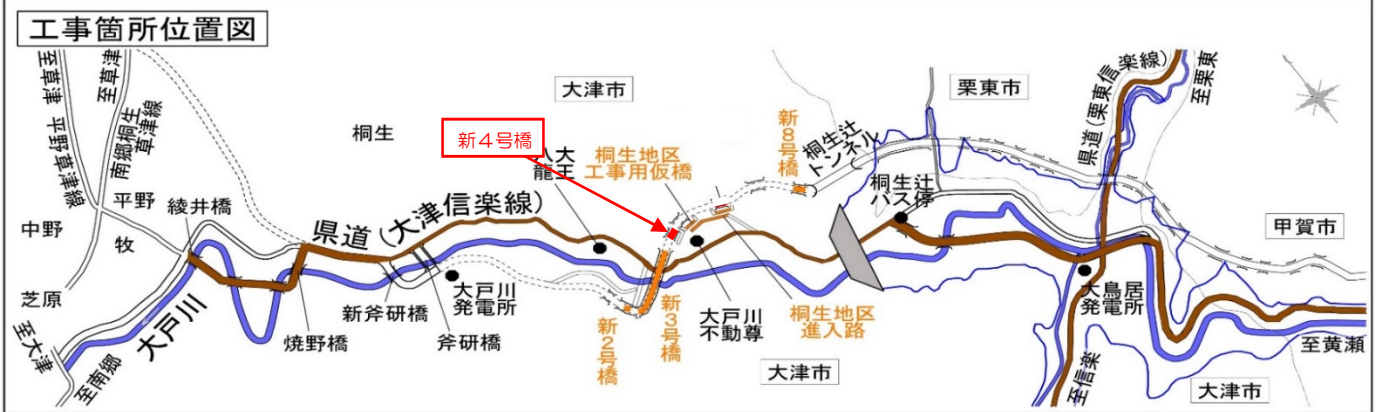

現場位置図



作業状況

A1橋台 躯体工 施工中

1ロットにて底版下部、2ロットにて底版上部のコンクリートを打設しました。順調に施工が進んでいます。

1ロット コンクリート打設



2ロット コンクリート打設



A2橋台 床掘・土留 施工中

先月に引き続き、床掘、土留を行い、深く掘り下げています。地中の転石が多く進捗に影響が出ています。

3段目 除去式アンカー



4段目 床掘状況



進捗状況

工種	種別	単位	数量	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
A1橋台	床掘	m ³	1,560	■	■	■					
	深礎工	基	4				■				
	橋台基礎工	m ²	52				■				
	橋台躯体工	m ³	314					■	■	■	
擁壁工	L型擁壁工	m ³	48								■
A2橋台	土留工	式	1	■	■	■	■	■	■	■	
	床掘	m ³	1,015	■	■	■	■	■	■	■	
	深礎工	基	4				■				
	橋台基礎工	m ²	59				■				
	橋台躯体工	m ³	454								■

■ 計画 ■ 実施

A1橋台は転石が発現せず、順調に進んでいる。
A2橋台は転石が多く発現し、土留や床掘の進捗が大きく遅れている

現場代理人のコメント

謹賀新年

転石（硬岩）の発現の有無により工程進捗が左右されていますが、負けずに精一杯頑張っていきます。引き続き、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。

請負者：西村建設株
現場代理人：森本 順
携帯電話：080-9302-8898

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-0100



大津信楽線付替工事ニュース

令和 2年1月18日




バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ



工事名：大津信楽線左岸下流部道路改良その他工事
工期：令和元年8月31日～令和2年3月10日

工事箇所位置図

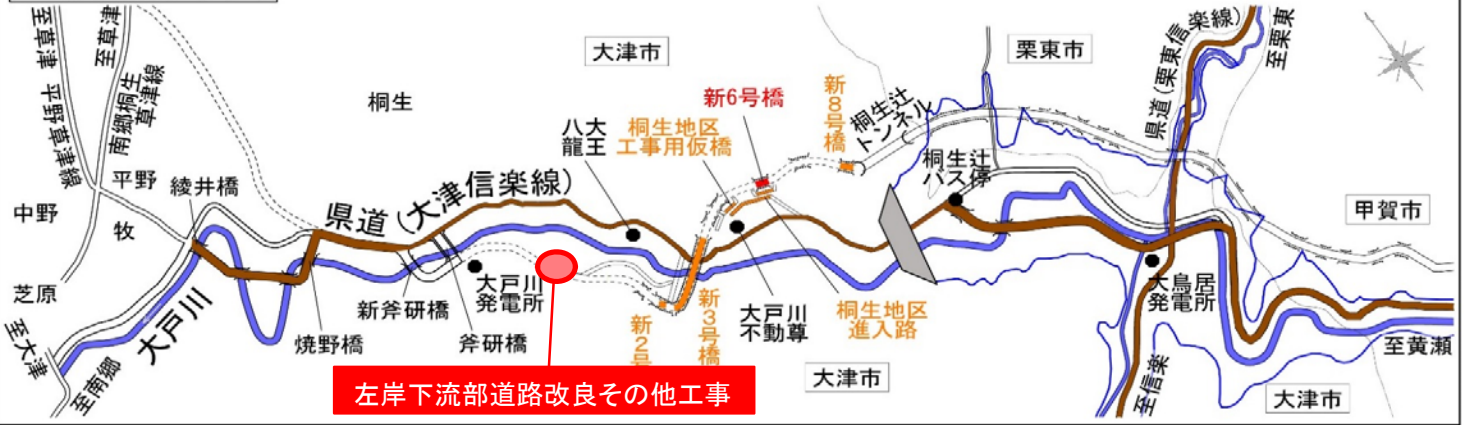

左岸下流部道路改良その他工事



【現在の作業】2号補強土壁—地盤改良完了。1号補強土壁—河川の仮締切完了。
【今後の予定】2号補強土壁—年始より床付け・基礎コンクリート打設・補強土壁設置を行います。
1号補強土壁—掘削・床付けを1月末まで行います。2月より基礎フーチングを施工します。

1号・2号補強土壁の施工状況

現場代理人のコメント

謹賀新年

転石で苦労しました2号補強土壁の地盤改良ですが、昨年12月27日に完了しました。今年から構造物の施工に取り掛かりますが、安全第一に早期完成をめざし頑張ります。

現場代理人
米田 剛



OhYAMA (株)大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上牧町地先
077-549-2587
077-549-2588

大津信楽線付替工事ニュース

令和 2年1月18日




バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工期：令和元年11月26日～令和2年10月31日

1月

工事箇所位置図

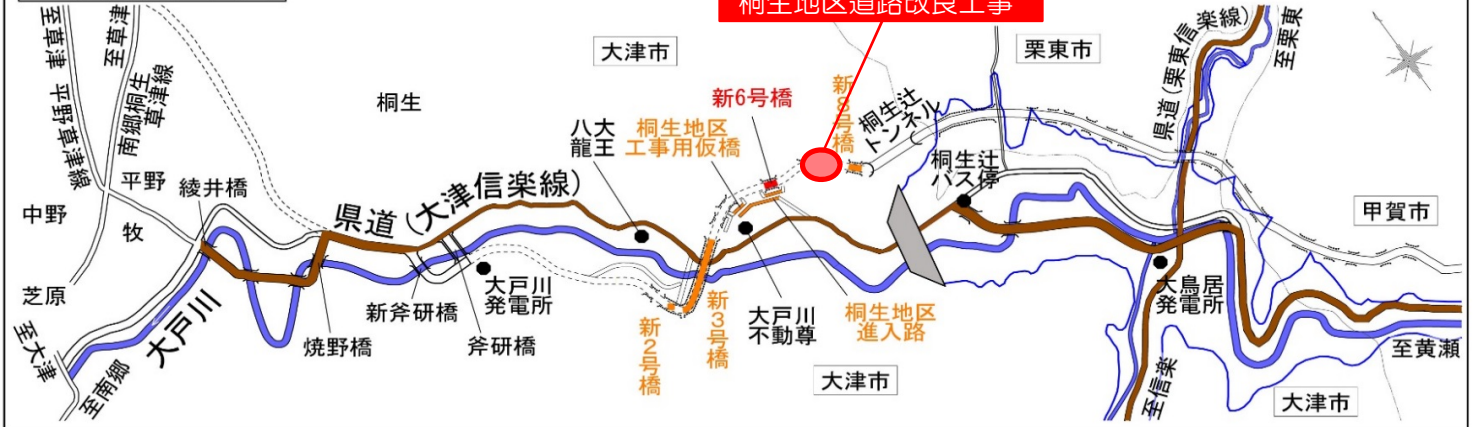

現在の状況(着工前)



現場代理人コメント

謹賀新年

1月より本工事に着手いたします。
地域の皆様方にはご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。
桐生地区道路改良工事におきましては、只今準備工(伐採工)を施工中でございます。準備工が完了次第本工事(11号補強土壁工)に取り掛かる予定となっております。



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-3200
077-549-3206
