

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年12月15日



バックナンバーは
QRコードを讀込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋・新5号橋間道路改良その他工事

当初工期：令和2年3月4日～令和3年2月28日

(道路の基礎となる擁壁を設置します。)

12月

工事箇所位置図

大津市



新4号・新5号橋間改良その他工事



新4号橋

新5号橋

補強土壁面材設置



補強土盛土施工状況



掘削状況



転石破碎状況




また、とても大きな転石がでてきており、転石処理に奮闘しています。

残すところ3ヶ月となりました。完成に向けて工事を進めてまいりたいと思います。

現場代理人コメント

朝は、身も凍るような寒さとなりました。
良い年を迎えられるよう
引き続き安全作業で頑張ります。

現場代理人
笠巻 慎也



八田建設株式会社

【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

【FAX】 077-549-0075

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年12月15日



バックナンバーはQRコードを讀込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新4号橋上部工工事
工期：令和2年2月18日～令和3年3月10日

12月

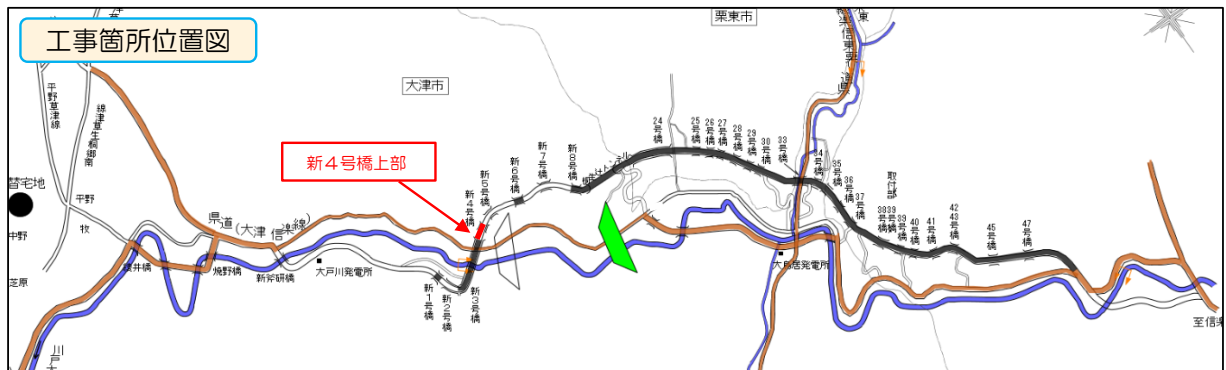

現場位置図



現場の進捗状況

箱桁製作工の外側型枠の組立がほぼ終わり、鉄筋の組立が始まります。作業ヤードが狭くなってくるので、整理整頓に努め、周囲に十分気を付けて施工を行います。



現場代理人のコメント

12月になり今年も残りわずかになりました。本格的な冬シーズンの到来に準備はお済みでしょうか？現場では、年明け1月のコンクリート打設（1回目）に向け、鉄筋・PC鋼材・型枠組立作業に粛々と取り組んでいます。安全第一で作業いたしますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。



請負者：昭和コンクリート工業(株)
現場代理人：渡邊泰全
携帯電話：080-4064-1368

現場事務所：大津市上田上桐生町地先
事務所TEL：077-549-2370

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線左岸下流道路改良工事
工期：令和2年7月7日～令和3年2月26日

12月

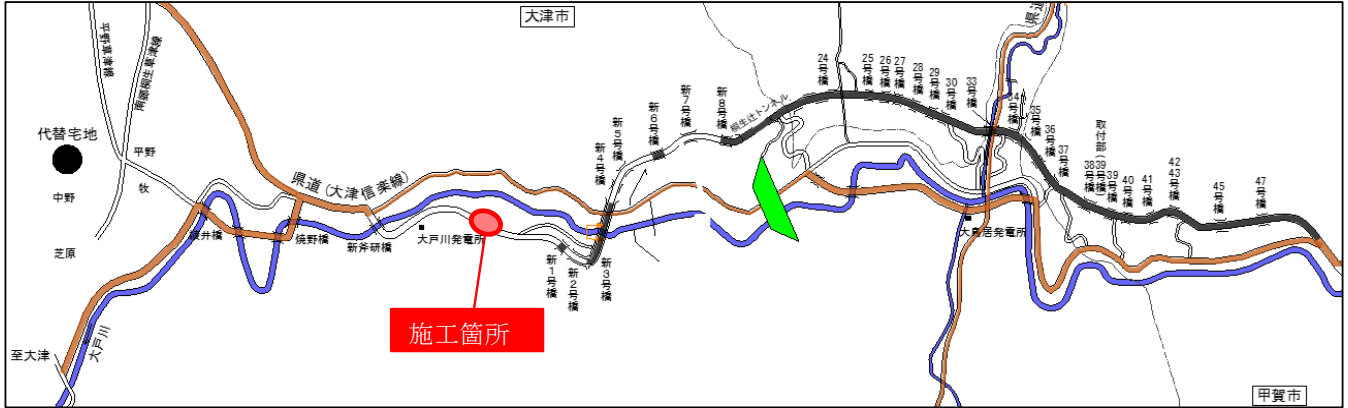

1号補強土壁のコンクリートパネル据付・盛土と、5号重力式擁壁工の施工をしています。

現場代理人のコメント



1号補強土壁 コンクリートパネル施工状況



5号重力式擁壁施工状況

1号補強土壁のコンクリートパネル据付・盛土作業、5号重力式擁壁の打設を行いました。
12月に入り、寒さが増してきました。コロナウイルスにも注意して安全作業で現場を進めてまいります。

現場代理人
山口 博孝



OnyAMA 株式会社 大山建設

【現場事務所】
【電話】
【FAX】

滋賀県大津市上田上牧町1131
077-549-0583
077-549-0583

大津信楽線付替工事ニュース



令和2年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良工事
工期：令和元年11月26日～令和2年12月31日

12月

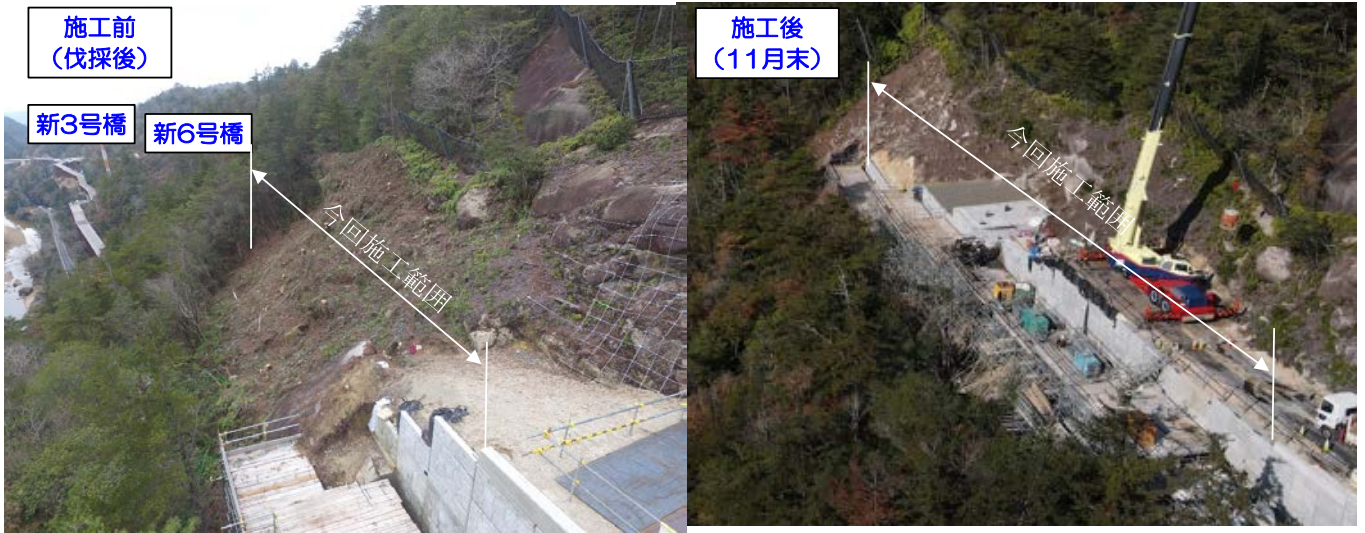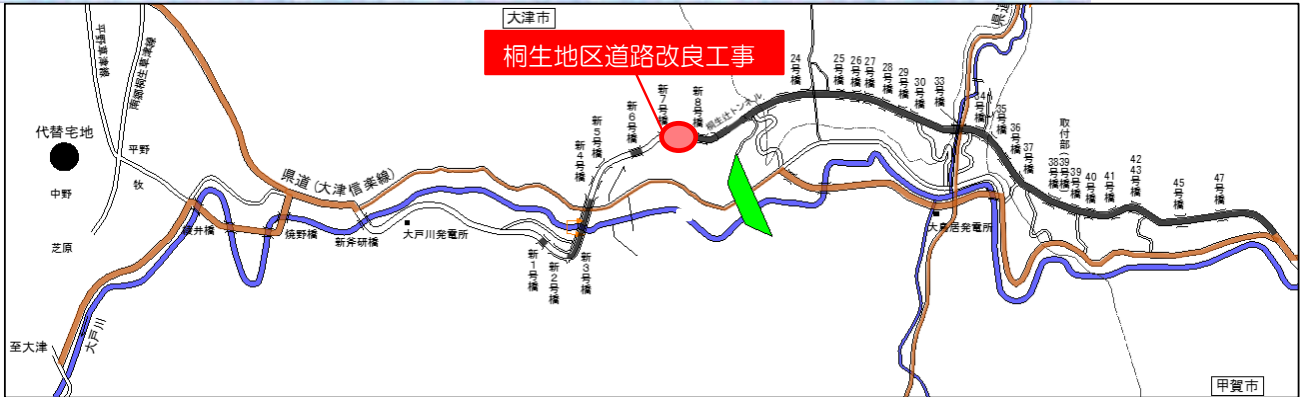

現在の状況

現場代理人コメント




現在の作業：パネル設置及び背面の盛土を順次施工中です。
今後の予定：12月末までに工事を完了出来るよう安全に注意し
施工して参ります。



現在、11号補強土壁工を順次施工しております。
パネルの施工及び盛土作業を行う為、現場への出入りが多くなります。工期が12月末であり、最後の仕上げを行い工事完了となります。1年と1か月の長い間、工事にご協力頂きありがとうございました。

現場代理人
伊藤 雅記



八田建設株式会社

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-3200
077-549-3206

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新5号橋・新6号橋間他道路改良その他工事
工期：令和元年10月17日～令和3年2月28日

12月

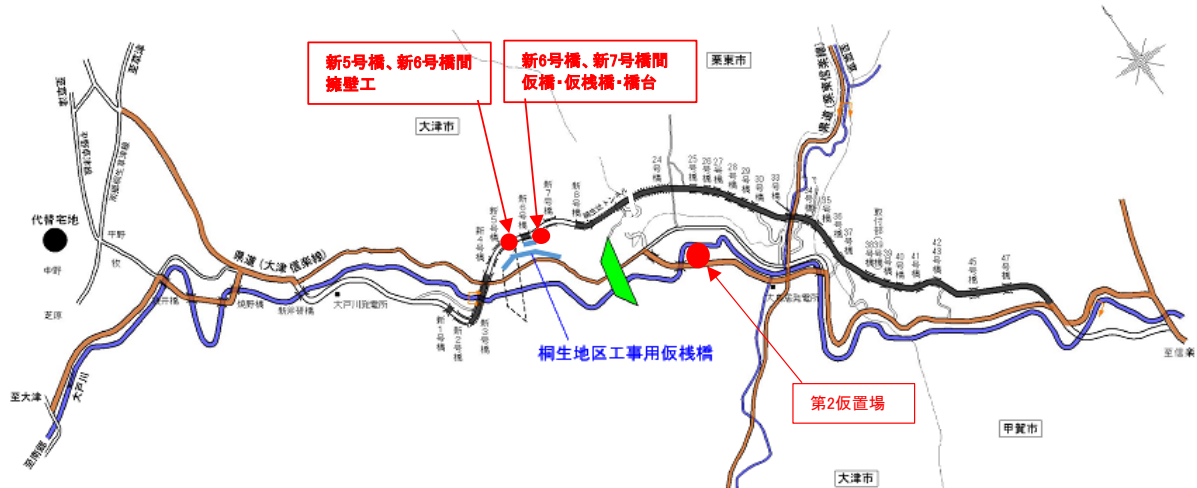

起点側、終点側からの現場状況をドローンで撮影しました。9号補強土壁工、新7号A1橋台は法面工の施工中です。

工事写真

9号補強土壁工は軽量盛土施工中です。

9号補強土壁工

令和2年10月末



9号補強土壁工の上空からの写真です。10月までは基礎コンクリートだけでしたが、11月に軽量盛土が始まり擁壁の形状が出来上がってきました。

令和2年11月末




監理技術者より一言



12月に入り急に朝晩が寒くなってきました。来年は雪の日も多くなりそうです。雪の降る前に擁壁工の主要部分の工事を終わらせようと頑張っています。まずは安全第一で作業員一同頑張ります。

松尾建設株式会社



【現場事務所】 滋賀県大津市上田上桐生町地先
【電話】 077-549-1070
【FAX】 077-549-1075
監理技術者 秋村 智詩

大津信楽線付替工事ニュース

令和2年12月15日





パクナンパーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新2号橋下部その他工事

工期：令和元年9月19日～令和3年2月1日

【付替県道 新2号橋の橋台を1基と、補強土壁を施工します。】

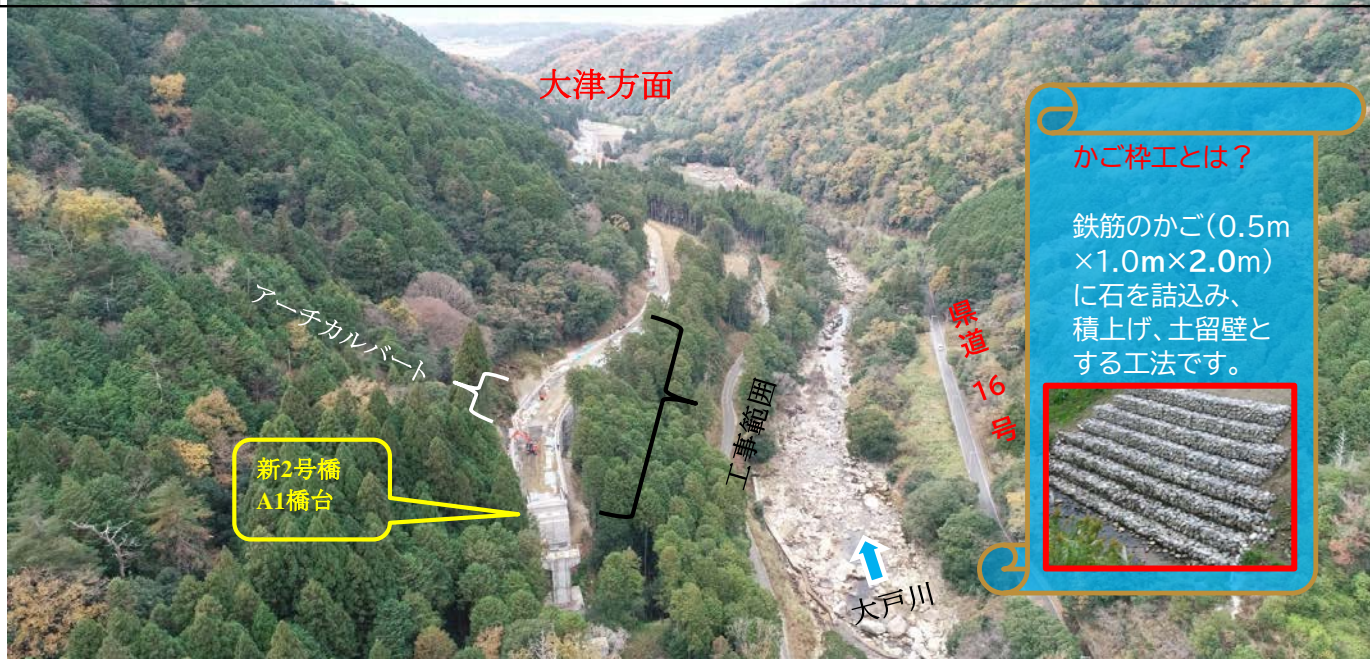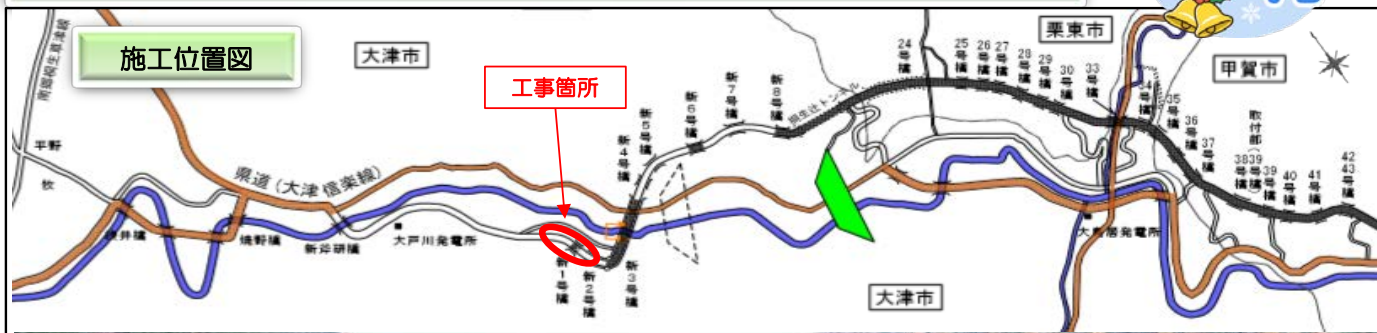

かご枠工とは？
鉄筋のかご(0.5m×1.0m×2.0m)に石を詰込み、積上げ、土留壁とする工法です。




工事進捗



3号・4号補強土壁が完成し新2号橋と道路がつながりました。

今後の予定

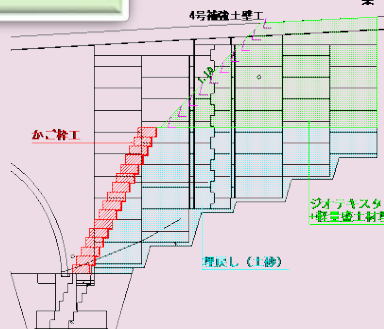


アーチカルバート坑口の法面処理工事が追加となり、工事期間が令和3年2月1日までにになりました。今月度は法面処理工事のかご枠工の施工が主となります。土砂・石材の搬入の為、県道16号を大型車両が通行します。安全運転で通行しますので皆様のご協力をお願いします。



安全第一

交通安全に注意して！



株式会社 内田組

【現場事務所】 大津市上田上桐生町地先

【電話】 077-549-3356

【FAX】 077-549-3356

大津信楽線付替工事ニュース


令和2年12月15日



バックナンバーは
QRコードを読込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大津信楽線新7号橋上部工工事
工期：令和2年1月16日～令和3年2月28日

12月

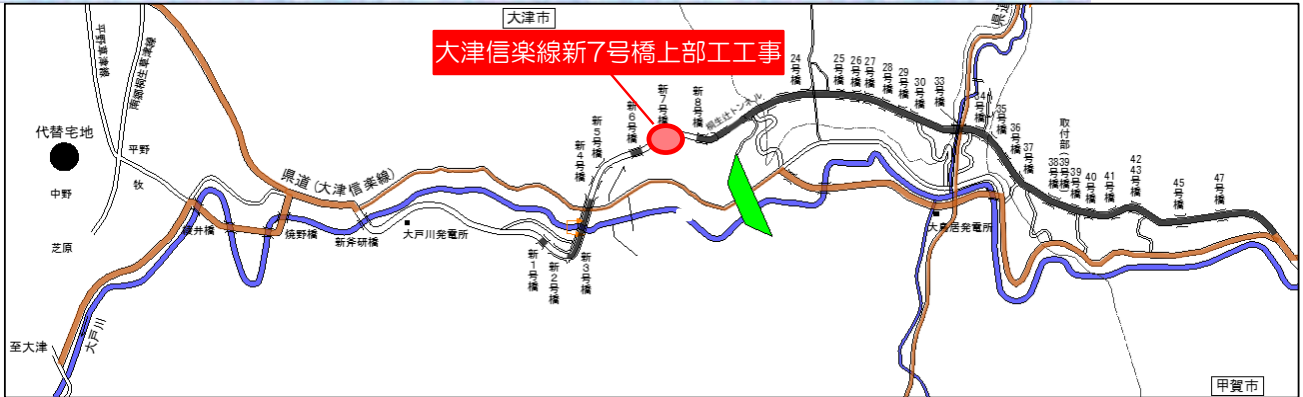

現在の状況

現場代理人コメント



現場では仮栈橋の施工も終了し
工場でトレーラーに桁を積み込み、陸
路で現場に搬入し、随時架設作業を
行っていきます。
今月中旬には架設も完了し、床版工
へと進んでいきます。
冷え込みが一段と進む中、コロナ、
インフルエンザ対策と健康管理に留
意し安全第一で進めています。

現場代理人 鶴田 政宏

現在の作業：橋げたの架設の施工を進めています。
今後の予定：架設完了後、高力ボルト本締め、塗装作業、床版工
の施工となります。

工場での出荷前



KH 株式会社 駒井ハルテック
KOMAIHALTEC Inc.

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-2546
077-549-2547
